第 十一 讲

利益相关方绩效域

11

深入理解项目相关方管理的核心目标与实现路径

从识别评估到关系维护，掌握相关方协同赋能方法论

利益相关方人绩效域

- 干系人绩效域涉及与干系人相关的活动和功能。
- 干系人:能影响项目、项目集或项目组合的决策、活动或成果的个人、群体或组织，以及会受或自认为会受它们的决策、活动或成果影响的个人、群体或组织。
- **在整个项目期间与于系人建立富有成效的工作关系。**
- **干系人对项目目标表示同意。**
- **作为项目受益人的于系人表示支持并感到满意，而对项目或其可交付物可能表示反对的干系人不会对项目成果产生负面影响。**

7.1.1 Stakeholder 翻译的PMP演变历史

TRANSLATION HISTORY


第五版以前	第六版	第七版	第八版
干系人	相关方	干系人	利益相关方

。。。。。。。。。


其实都是英文stakeholder的不用翻译用词，内涵从未改变即影响或者潜在影响项目的人或者被项目影响或者潜在影响的人


启动
识别利益
相关方
规划
规划利益
相关方争取
规划沟通管理
执行
管理利益
相关方争取
管理沟通
监控
监督利益
相关方争取
监督沟通
收尾

干系人绩效域

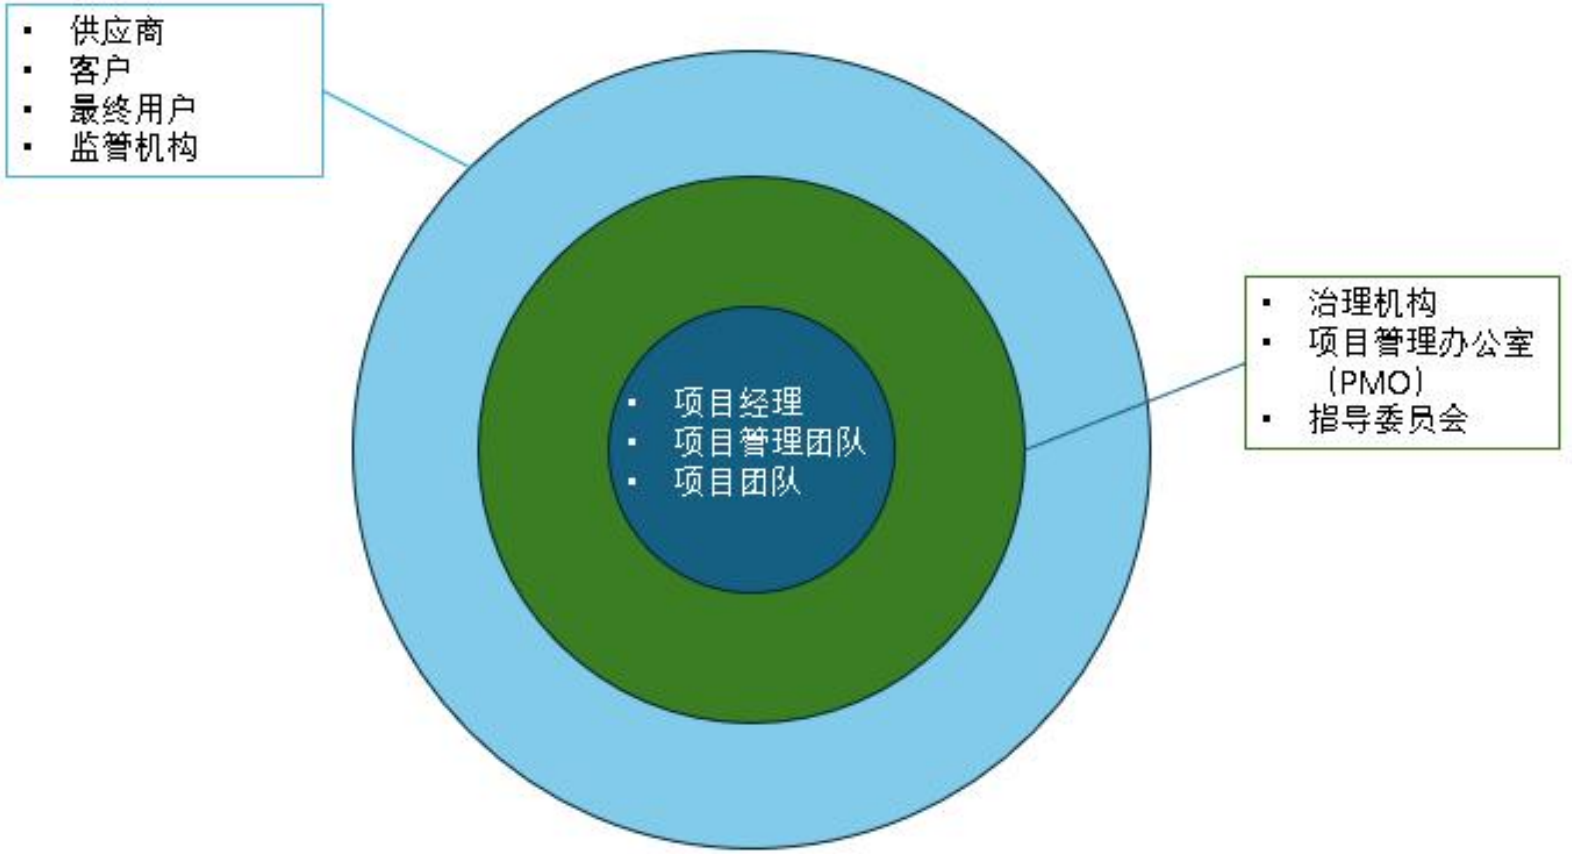

干系人参与

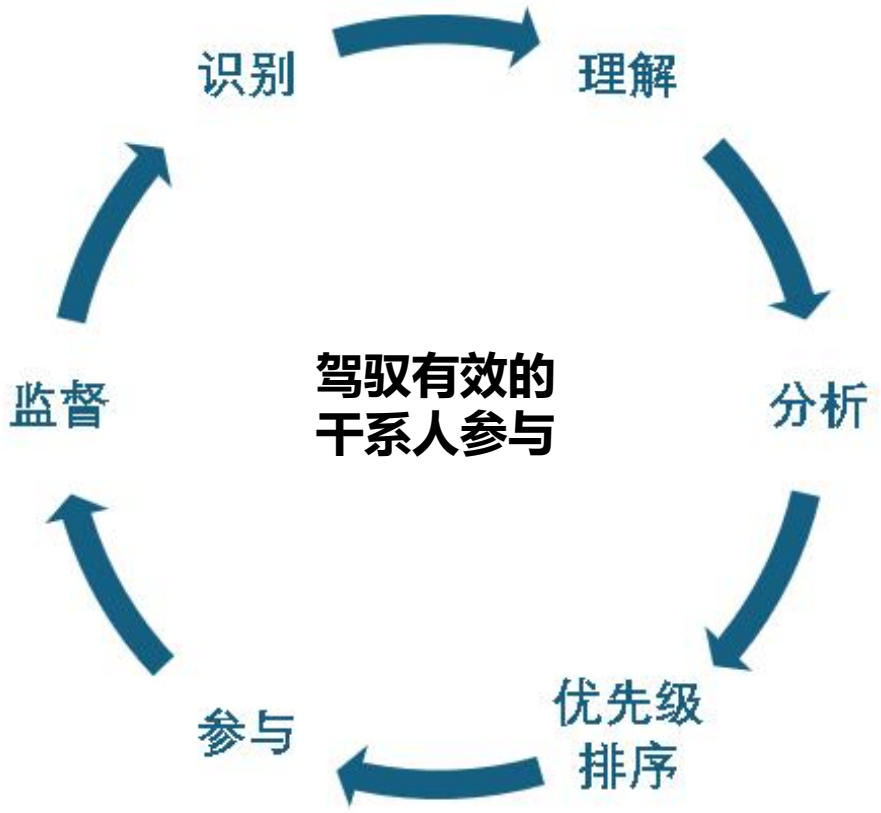

7.1.1.1 识别

在组建项目团队之前，可以进行高层级的干系人识别。详细的干系人识别会对初始工作渐进明细化，并且这是贯穿整个项目的一项活动。有些干系人很容易识别，如客户、发起人、项目团队、最终用户等，但其他干系人在与项目没有直接联系时可能难以识别。

7.1.1.1 识别利益相关方

识别利益相关方

输入

- 项目章程
- 业务文件
  - 业务论证
  - 收益管理计划
- 项目管理计划
  - 沟通管理计划
  - 利益相关方争取计划
- 项目文件
  - 变更日志
  - 问题日志
  - 需求文件
- 协议
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 专家判断
- 数据收集
  - 问卷调查
  - 头脑风暴
- 数据分析
  - 利益相关方分析
  - 文件分析
- 数据表现
  - 利益相关方映射/表现
- 会议
- 等

输出

- 利益相关方登记册
- 变更请求
- 项目管理计划更新
  - 需求管理计划
  - 沟通管理计划
  - 风险管理计划
  - 利益相关方争取计划
- 项目文件更新
  - 假设日志
  - 问题日志
  - 风险登记册
- 等

7.1.1.2 理解和分析

UNDERSTAND & ANALYZE

一旦识别了干系人，项目经理和项目团队就应努力了解干系人的感受、情绪、信念和价值观。

这些因素可能会导致项目成果面临更多威胁或机会。

它们也可能会迅速变化，因此，了解和分析干系人是一项持续进行的行动。

会考虑到干系人的几个方面，例如：

我们需要分析每个干系人对项目的立场和观点，这与了解项目干系人密切相关。

▶ 权力；▶ 作用；▶ 态度；▶ 信念；▶ 期望；▶ 影响程度；▶ 与项目的邻近性；▶ 在项目中的利益；▶ 与干系人和项目互动相关的其他方面。

优先级排序

在许多项目中，项目团队所涉及的干系人太多，这些干系人无法全部直接或有效地参与。

项目团队可以根据自己的分析完成对干系人的优先级进行初始排序。

作为干系人优先级排序参与的一种方法，项目团队通常会将聚焦于权力和利益最大的干系人。

随着在整个项目期间各种事件不断发生，项目团队可能需要根据新的干系人或干系人环境的不断变化而重新进行优先级排序。

规划利益相关方争取

规划利益相关方争取

输入

- 项目章程
- 项目管理计划
  - 资源管理计划
  - 沟通管理计划
  - 风险管理计划
- 项目文件
  - 假设日志
  - 变更日志
  - 问题日志
  - 项目进度计划
  - 风险登记册
  - 利益相关方登记册
- 协议
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 专家判断
- 数据收集
  - 标杆对照
- 数据分析
  - 假设条件和制约因素分析
  - 根本原因分析
- 制定决策
  - 优先级排序/排序
- 数据表现
  - 思维导图
  - 争取利益相关方参与评估矩阵
- 会议
- 等

输出

- 项目管理计划更新
  - 利益相关方争取计划
- 等

干系人参与需要与干系人协作以介绍项目，启发他们的需求，管理期望、解决问题、谈判、优先级排序、处理难题，并做出决策。争取干系人参与需要运用软技能，如积极倾听、人际关系技能和冲突管理，以及创建愿景和批判性思维等领导技能。每种沟通类型的示例。与干系人的沟通可以通过书面或口头方式进行，可以是正式的，也可以是非正式的。

类型	正式	非正式
口头	演示	对话
	项目审查会议	特别讨论
	情况介绍	
	产品演示	
	头脑风暴	
书面	进展报告	便条
	项目文件	电子邮件
	商业论证	即时消息/短信
		社交媒体

规划沟通

规划沟通管理

输入

- 项目章程
- 项目管理计划
  - 资源管理计划
  - 利益相关方争取计划
- 项目文件
  - 需求文件
  - 利益相关方登记册
- 事业环境因素
- 组织过程资产
- 等

工具与技术

- 专家判断
- 沟通需求分析
- 沟通技术
- 沟通模型
- 沟通方法
- 人际关系与团队技能
  - 沟通风格评估
  - 政治意识
  - 文化意识
- 数据表现
  - 争取利益相关方参与评估矩阵
- 会议
- 等

输出

- 项目管理计划更新
  - 沟通管理计划
  - 利益相关方争取计划
- 项目文件更新
  - 项目进度计划
  - 利益相关方登记册
- 等

沟通方法

互动沟通

在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通工件。

推式沟通

向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以采用的沟通工件包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿。

拉式沟通

适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。

干系人沟通模型

通过各种形式的沟通，快速反馈循环可提供有用信息，以便：

- 确认干系人获知该消息的程度。
- 确定干系人是否同意该消息。
- 识别接收方发现的具有细微差别或其他非预期的消息。
- 获得其他有用的洞察。

7.1.3.1

考试小技巧：如何区分沟通和干系人管理的边界

EXAM TIP

沟通管理与干系人管理的边界在5W，出了问题我们总是先检查沟通有没有做好然后检查干系人参与有没有做对.
做到了5W 干系人仍然不满意，那是干系人管理出问题。没有做到那是沟通管理有问题。

WHAT	HOW	WHEN	HOW OFTEN	WHO
沟通什么	何种方式沟通	什么时间点沟通	沟通频率如何	和谁沟通

7.1.3.1 管理利益相关方争取

EXAM TIP



考试小技巧：权力/利益方格



姓名	角色	项目中的利益描述	追求利益大小	对项目的影响大小	应对策略
			高	低	
			中	中	
			低	高	

权力利益方格用于简单干系人关系的项目，

大型复杂关系的项目使用干系人立方体或者凸显模型来表现。

考试小技巧：数据表现 - 干系人参与度评估矩阵

干系人参与度评估矩阵用于将干系人当前参与水平与期望参与水平进行比较。

干系人参与评估矩阵						
干系人	职 位	不知晓	抵制	中立	支持	领导
刘六	总经理	当前				期望
王五	分公司总经理		当前		期望	
李四	培训公司项目经理			当前	期望	

C 代表每个干系人的当前参与水平


D 是项目团队评估出来的、为确保项目成功所必不可少的参与水平（期望的）

应根据每个干系人的当前与期望参与水平的差距，开展必要的沟通，有效引导干系人参与项目。

弥合当前与期望参与水平的差距是监督干系人参与中的一项基本工作。

监督利益相关方争取

EXAM TIP

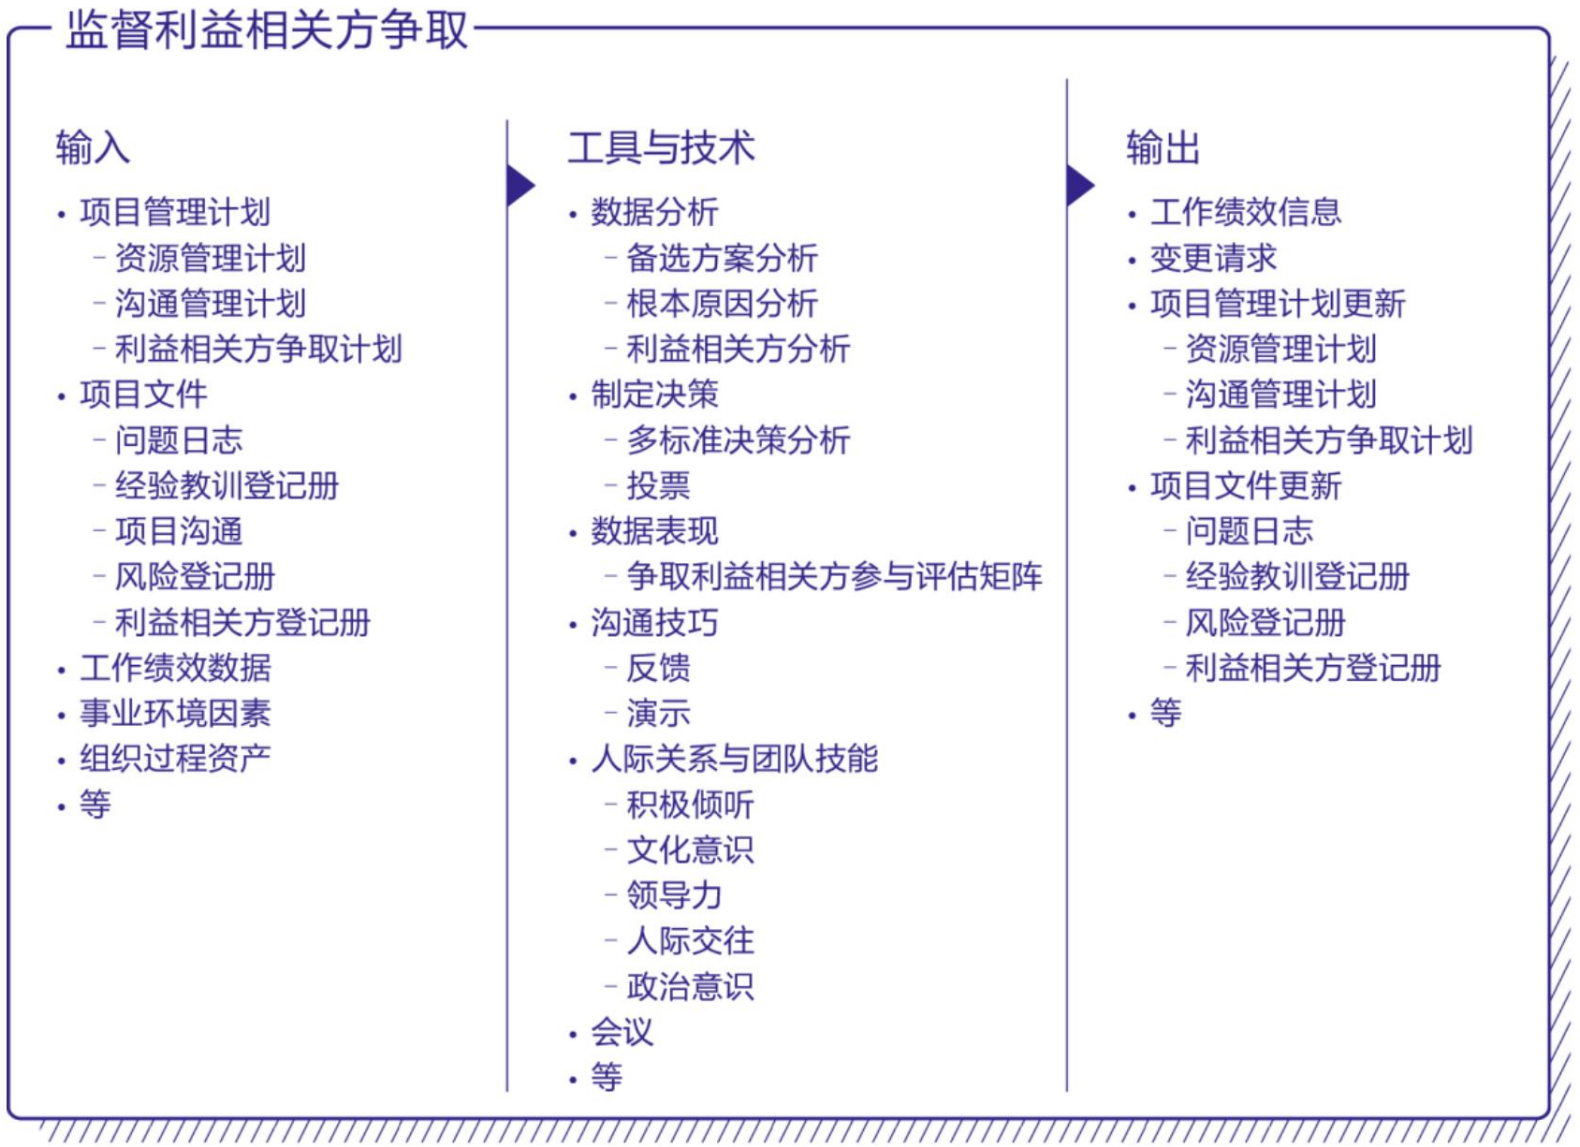

监督沟通

EXAM TIP



7.1.3.4 考试小技巧：干系人参与计划和沟通规划

EXAM TIP

干系人参与计划是项目管理计划的组成部分。它确定用于促进干系人有效参与决策和执行的策略和行动。

基于项目的需要和干系人的期望，干系人参与计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

干系人参与计划可包括（但不限于）调动个人或干系人参与的特定策略或方法。

仅在预测型中使用，敏捷不使用

- 沟通规划：
- 干系人的沟通需求；需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；上报步骤；发布信息的原因；
- 发布所需信息、确认已收到，或作出回应（若适用）的时限和频率；负责沟通相关信息的人员；负责授权保密信息发布的人员；
- 接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；
- 用于传递信息的方法或技术，如备忘录、电子邮件、新闻稿，或社交媒体；为沟通活动分配的资源，包括时间和预算；
- 随着项目进展，如项目不同阶段干系人社区的变化，而更新与优化沟通管理计划的方法；通用术语表；
- 项目信息流向图、工作流程（可能包含审批程序）、报告清单和会议计划等；
- 来自法律法规、技术、组织政策等的制约因素。

工作试用技巧技能 - 会议管理

会议管理是采取步骤确保会议有效并高效地达到预期目标。规划会议时应采取以下步骤：

准备并发布会议议程（其中包含会议主题，会议开展方式如：站会，座谈会，视频交流会等。会议开始结束时间，与会干系人范 围，会议若干主题的时间段安排以及相应的发言人或者讨论形式。

如果是大型会议还应包含行程安排和休息时间）；
确保会议在规定的时间开始和结束；如果是大型会议则应预留一定的冗余时间和备选主题以免发生意 外。大型会议应适当交叉安排讨论主题和演讲主题。会议最后一般安排最关键干系人发言或做总结陈词；

确保适当参与者受邀并出席；

切题；会议主持人或引导员采用适当方式控制进程，如是严格时间限制的，应事先告知每位发言或讨论人可用时间；

处理会议中的期望、问题和冲突；

记录所有行动以及所分配的行动责任人；

会议后及时分发会议纪要并确认

7.1.4 监督

MONITOR

- 在整个项目期间，随着新的干系人被识别，和一些其他干系人的退出，干系人将发生变化。
- 随着项目的进展，一些干系人的态度或权力可能会发生变化。
- 除了识别和分析新的干系人外，还要有机会评估当前的参与策略是否有效或是否需要调整。
- 因此，在整个项目期间对干系人参与的数量和有效性要进行监督。
- 干系人满意度通常可以通过与干系人的对话来确定，以衡量他们对项目可交付物和项目总体管理的满意状况。
- 也可以通过项目和迭代审查会、产品审查会、阶段关口和其他方法获得定期反馈。
- 如果有大量的干系人，还可以使用问卷调查来评估满意度。
- 必要时，甚至可以通过更新干系人参与方法来提高干系人满意度。
