第 二 讲

价值交付体系

02

深入理解项目管理的核心目标与实现路径

从价值定义到系统构建，掌握价值交付方法论

3.0 价值与价值交付系统

理解价值交付系统与价值的核心定义，是掌握组织价值创造逻辑的起点。

价值交付系统

VALUE DELIVERY SYSTEM

旨在建立、维持和/或使组织得到发展的一系列战略业务活动。项目组合、项目集、项目、产品和运营都可以成为组织价值交付系统的一部分。

项目组合　项目集　项目　产品　运营

价值

VALUE

某种事物的作用、重要性或实用性。不同的干系人以不同的方式看待价值。

- **客户视角**
  将价值定义为使用产品的特定特性或功能的能力。
- **组织视角**
  关注基于财务度量指标确定的商业价值，例如收益减去实现这些收益的成本。
- **社会视角**
  社会价值可以包括对群体、社区或环境的贡献。

- 系统 ——驱动——▶ 组织发展
- 价值 ——多元——▶ 干系人视角
- 度量 ——聚焦——▶ 商业与社会

3.1 项目的价值

VALUE

01 创造满足客户或最终用户需要的**新产品、服务或结果**

02 做出积极的**社会或环境贡献**

03 提高**效率、生产力、效果或响应能力**

04 推动必要的变革，以促进组织向**期望的未来状态**过渡

05 **维持**以前的项目集、项目或业务运营所带来的收益

3.2 价值交付系统

可以单独或共同使用多种组件（例如项目组合、项目集、项目、产品和运营）以创造价值。这些组件共同组成了一个符合组织战略的价值交付系统。

价值交付系统中的组件创建了用于产出成果的可交付物。成果是某一过程或项目的最终结果或后果。聚焦成果、选择和决策强调了项目的长期绩效。成果可带来收益，收益是组织实现的利益。收益继而可创造价值，而价值是具有作用、重要性或实用性的事物。

3.1.1 项目的价值

VALUE OVERVIEW

01

有形价值

TANGIBLE VALUE

项目的价值可以是有形的、可以用货币衡量的，比如：利润、市场占有率、股东权益等等。

02

无形价值

INTANGIBLE VALUE

项目的价值也可以是无形的、无法直接用货币度量的，比如：知名度、美誉度、市场形象等等。

03

价值交付新范式

VALUE DELIVERY

在PMBOK第七版设定中，项目的成功标准已经从实现项目目标进一步细化为向客户或者发起人交付实现约定好的价值。

小王，我来考考你！作为一个项目经理，你觉得最重要的使命是什么？

这不是PMBOK上都教过的嘛！为公司、为客户创造价值！

那价值又是谁定义的？

这不是公司和客户定义的嘛！

那你去拜访客户接手项目的时候，如果直接问客户啊，你想要什么样的项目价值让我们实现啊？客户会说东西越便宜越好，质量越高越好，给我赚的钱越多越好。而你去问公司高层，我们公司的项目价值时得到的回答则是，成本越低越好，交付越快越好，回款越多越好。

这咋办，矛盾不可调和啊！

对咯，所以你明白项目经理的使命是创造甲乙双方都能接受的价值诉求。

3.2 价值交付系统


价值交付系统是可以单独或共同使用多种组件（例如项目组合、项目集、项目、产品和运营）以创造价值。这些组件共同组成了一个符合组织战略的价值交付系统。

EEF Enterprise Environmental Factors
事业环境因素




第六版项目环境

Organizational Process Assets OPA
组织过程资产

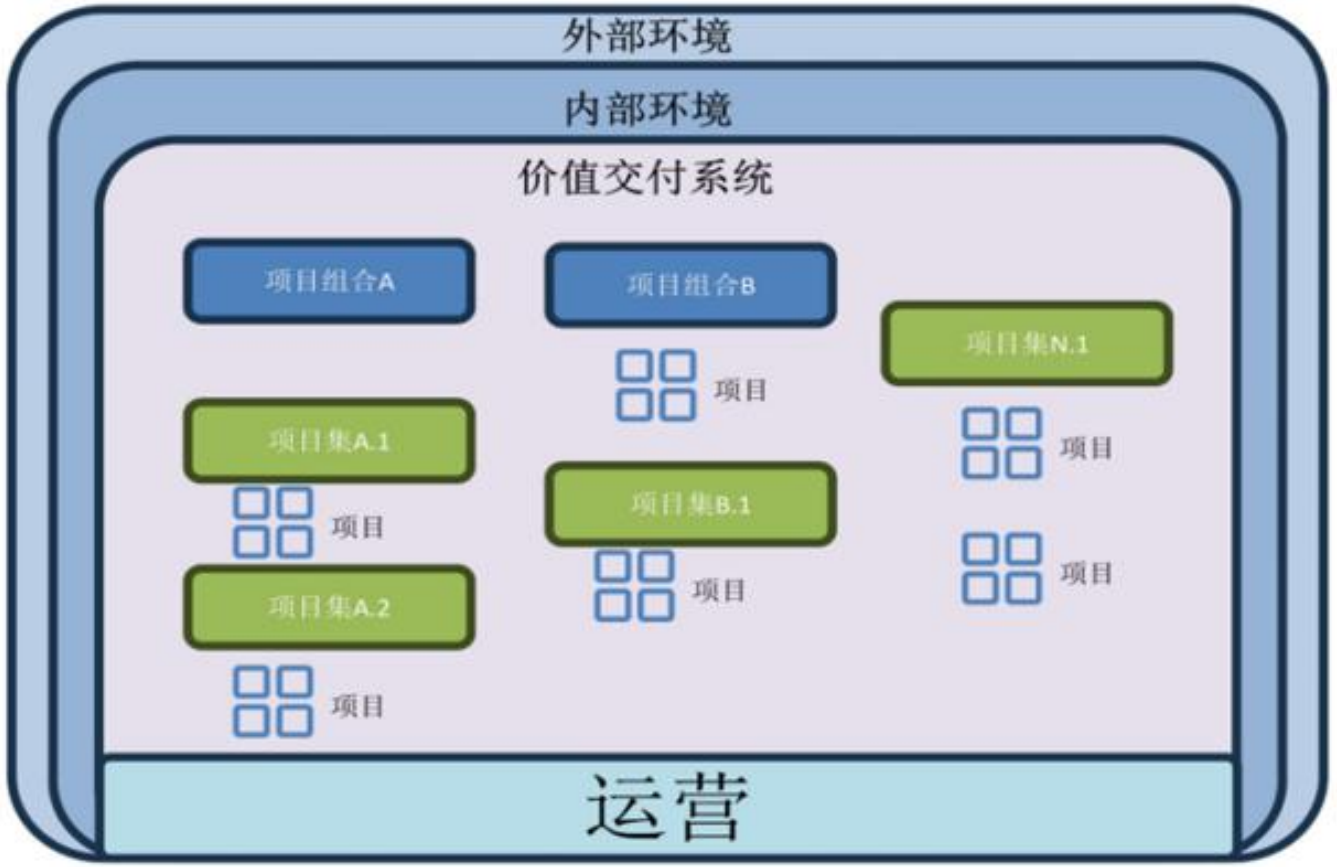

第七版 价值交付系统

2.4.1 第八版项目的事业环境因素和组织过程资产

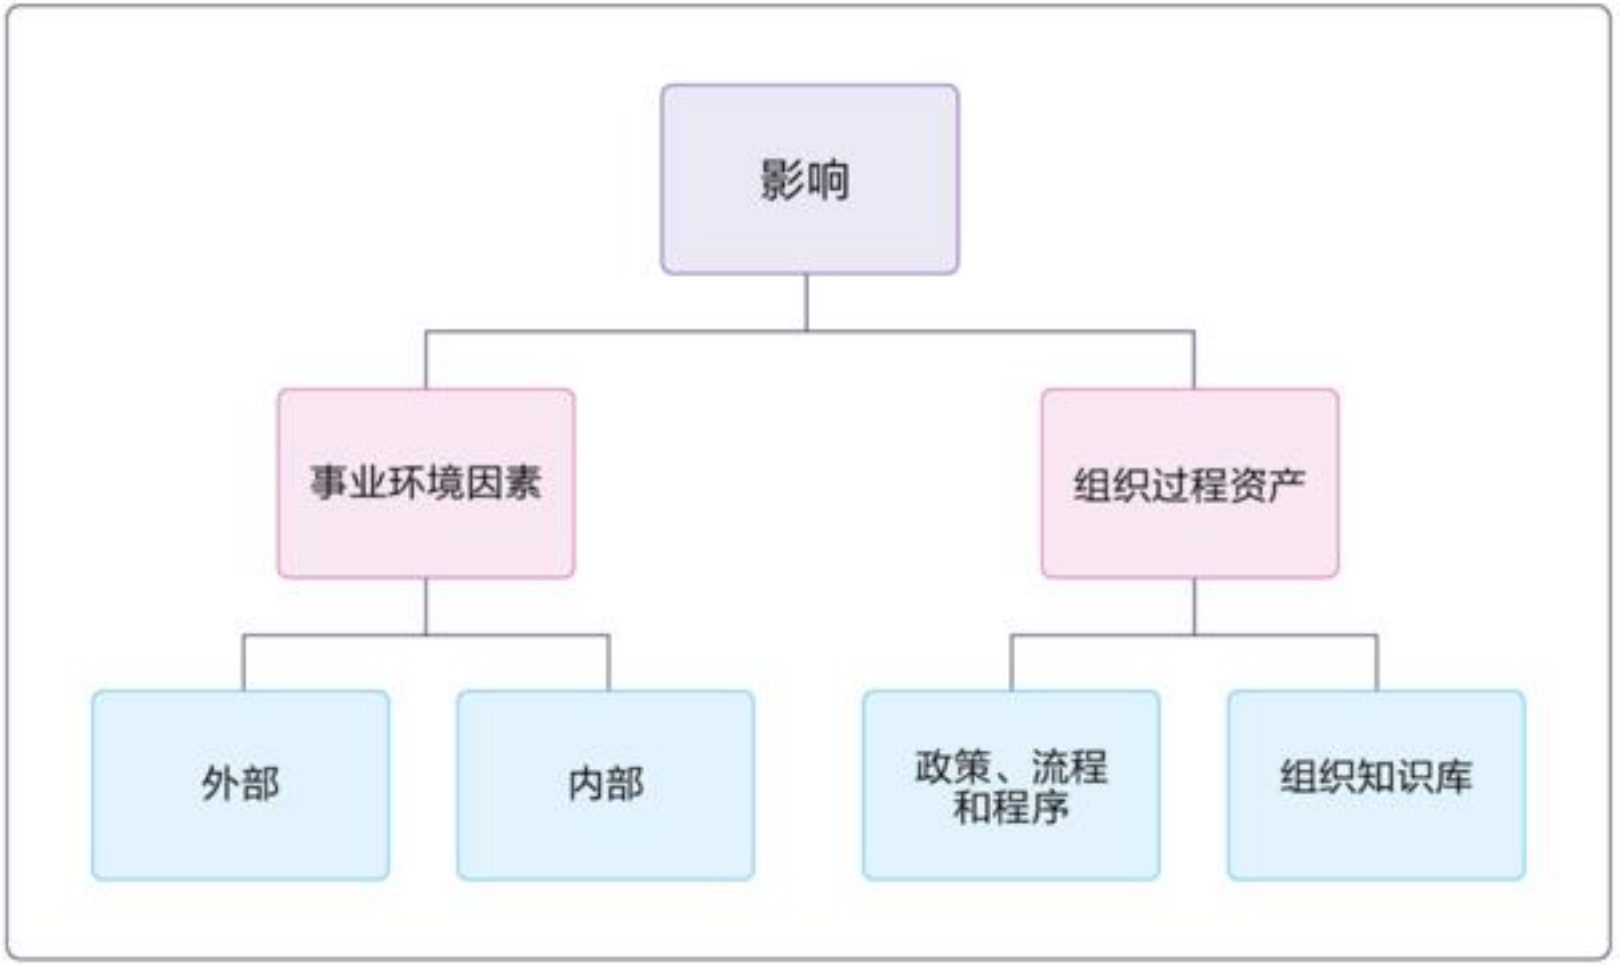

2.2.1 事业环境因素

01

事业环境因素是指项目团队无法直接控制，但会对项目产生影响、形成制约或起到指引作用的各种条件。

02

这些条件可以来自组织内部和/或外部。

03

事业环境因素被视为众多项目管理过程，尤其是大多数规划过程的输入。

04

这些因素可能增强或限制项目管理的可选方案，也可能对裁剪需要和项目成果产生积极或消极影响。

2.3 组织内部的事业环境因素

以下为组织内部的事业环境因素的示例：

01 **组织文化、结构和治理。**如愿景、使命、价值、信念、文化规范、领导风格、层级与权责关系、组织风格、道德规范和行为准则。

02 **设施和资源的地理分布。**如实体办公地点、公司总部、研发中心、客户服务中心，以及虚拟团队或混合团队。

03 **基础设施。**如现有设施、设备、组织通信渠道、信息技术硬件、可用性和承载能力。在线自动化系统的网络接口，以及工作授权系统。

04 **资源可用性。**如合同和采购制约因素、人员配置水平或团队能力，以及协作协议。

05 **员工能力。**如现有人力资源的专业知识、技能、胜任力和特定知识。

06 **组织的财务能力。**如外部融资选项，以及项目可能需要的额外财务资源。

2.3 组织外部的事业环境因素

以下为组织外部的事业环境因素的示例：

01 **市场状况。**如竞争对手、客户行为、市场份额、品牌认知度和商标。

02 **社会和文化影响及相关问题。**如政治环境、行为准则、道德规范和公众认知。

03 **法律限制。**如与安全、数据保护、商业行为、雇佣和采购相关的国家或地方法律法规。

04 **学术研究。**如行业研究、出版物、标杆对照结果、可为决策提供依据的实证数据，以及项目管理领域内具有启示意义的新兴趋势。

05 **政府或行业标准。**如监管机构的规定，以及与产品、生产、环境、安全、质量和工艺相关的标准。

06 **财务考量。**如汇率、利率、通货膨胀率、关税、税费和地理位置。

07 **自然和地理环境要素。**如工作条件、天气，以及地缘政治问题等制约因素。

08 **新兴技术和创新。**如人工智能、自动化、区块链、物联网等领域的进展。

09 **公共卫生和安全法规。**如政府实施的健康防护措施、旅行限制、检疫隔离措施、社交距离指引和公共安全法令。

4.1 组织过程资产

根据行业、组织和工作模式的不同，组织过程资产可能包括：执行组织特有的且实际使用的计划、流程、文档、模板和知识库。这些资产对项目的管理方式具有重要影响。组织过程资产可包括参与项目的任一或所有执行组织的任何工件、实践或知识，这些资产可用于执行或治理项目。

组织过程资产还包括组织从以往项目和既往工作中积累的经验教训和历史信息。组织过程资产是许多项目管理过程的输入，可包括已完成的进度计划、风险数据和挣值数据。由于组织过程资产属于组织内部资源，项目团队成员可在项目全过程中根据需要对其进行更新和补充。这些资产可分为两类：

01 政策、流程和程序

通常，这些资产不作为实现项目成果所需工作的一部分进行更新，并且一般由组织或项目外部其他职能部门建立（有关组织的更多信息，见附录）。这些资产只能遵循适用的组织政策进行更新。一些组织鼓励项目团队针对具体项目裁剪模板、生命周期和核对单。在此情况下，项目团队应根据项目的需要对这些资产进行裁剪。

02 组织知识库

这些资产会在项目执行过程中随项目信息的变化而持续得到更新。例如，财务绩效、经验教训、绩效测量指标、问题与缺陷等信息，均会在整个项目生命周期中持续得到更新。

2.3 政策、流程和程序

组织开展项目工作的政策、流程和程序包括但不限于以下内容：

01 为满足项目特定需要而对组织的标准流程、程序进行裁剪的指南和标准。

02 产品和项目的生命周期，以及方法和程序（如项目管理方法、估算度量指标、流程审计、改进目标、核对单，以及供组织内部使用的标准化流程定义）。

03 模板（如项目管理计划、项目文件、项目登记册、报告格式、合同模板、风险类别、风险描述模板、风险登记册模板、概率和影响定义、概率和影响矩阵，以及利益相关方登记册模板）。

04 预先批准的供应商清单、合同模板（如总价合同、成本补偿合同和工料合同），以及建议书评价准则。

05 旨在实现或超越项目价值主张的进展监督流程和程序，在有利的情况下可对项目基准进行重新优化。

06 变更控制程序。

07 跟踪矩阵。

08 问题与缺陷管理流程。

09 资源可用性控制和分配管理政策。

10 确定工作的优先级、批准工作和签发工作授权的流程。

11 标准化的指南、工作说明书、绩效测量程序和指南。

12 核实和确认流程。

13 服务水平协议(SLA)。

14 项目收尾指南或需求。

2.3 组织知识库

用于存储和检索信息的组织知识库包括但不限于以下内容：

01 配置管理知识库包含软件和硬件组件的版本信息，以及所有执行组织的标准、政策、程序和项目文件的基准。

02 财务数据库包含工时、实际成本、预算、项目超支等信息。

03 历史信息和经验教训知识库包含项目记录与文档、所有的项目收尾信息与文档、以往的项目选择决策结果及其绩效信息，以及风险活动的相关信息。

04 问题与缺陷管理数据库包含问题与缺陷的状态、控制信息、解决方案和行动项结果。

05 度量指标数据库用于收集并提供过程和产品的测量数据。

06 以往项目的项目档案包含范围、成本、进度、绩效测量基准、项目日历、项目进度网络图、风险登记册、风险报告、利益相关方登记册等信息。

老叉：再考考你，为啥我们在项目中明明有自己的资源却非要使用供应商来完成某些看似不复杂的工作而且成本更高、时间更长？

小王：供应商承担风险嘛！

老叉：是啥风险？

小王：社会分工越来越专业化，我们不可能是所有领域的专家，所以专业的事找专业的人干，来避免专业风险。

老叉：可是对方资质比我们低、实现成本比我们高，还经常不服管，但是我们还非要用它。

小王：这我就不明白

老叉

给你个关键词：信息差。很多时候，风险是来自于信息差。就好比我对公司流程滚瓜烂熟，去办个事情知道找谁、知道怎么操作，很快就能做完；而你去做，可能要花好几倍的精力和时间。虽然你名牌大学毕业，掌握的专业知识比我可能高，但是你不掌握关键活动的信息，你就是工作中的瞎子。这也是为啥在施工现场，比起大学刚毕业的施工员，我可能更相信打灰的农民工，这无关文化、知识、能力，就是信息差。而组织过程资产就是帮助我们填补信息差的好抓手。而供应商赚到的钱则是事业环境因素赋予的利润，供应商赚的往往是利用到了我们所不具备的信息。

3.2.4 信息流

当信息和反馈在所有组件之间以一致的方式共享时，价值交付系统最为有效，使系统与战略保持一致，并与环境保持协调。

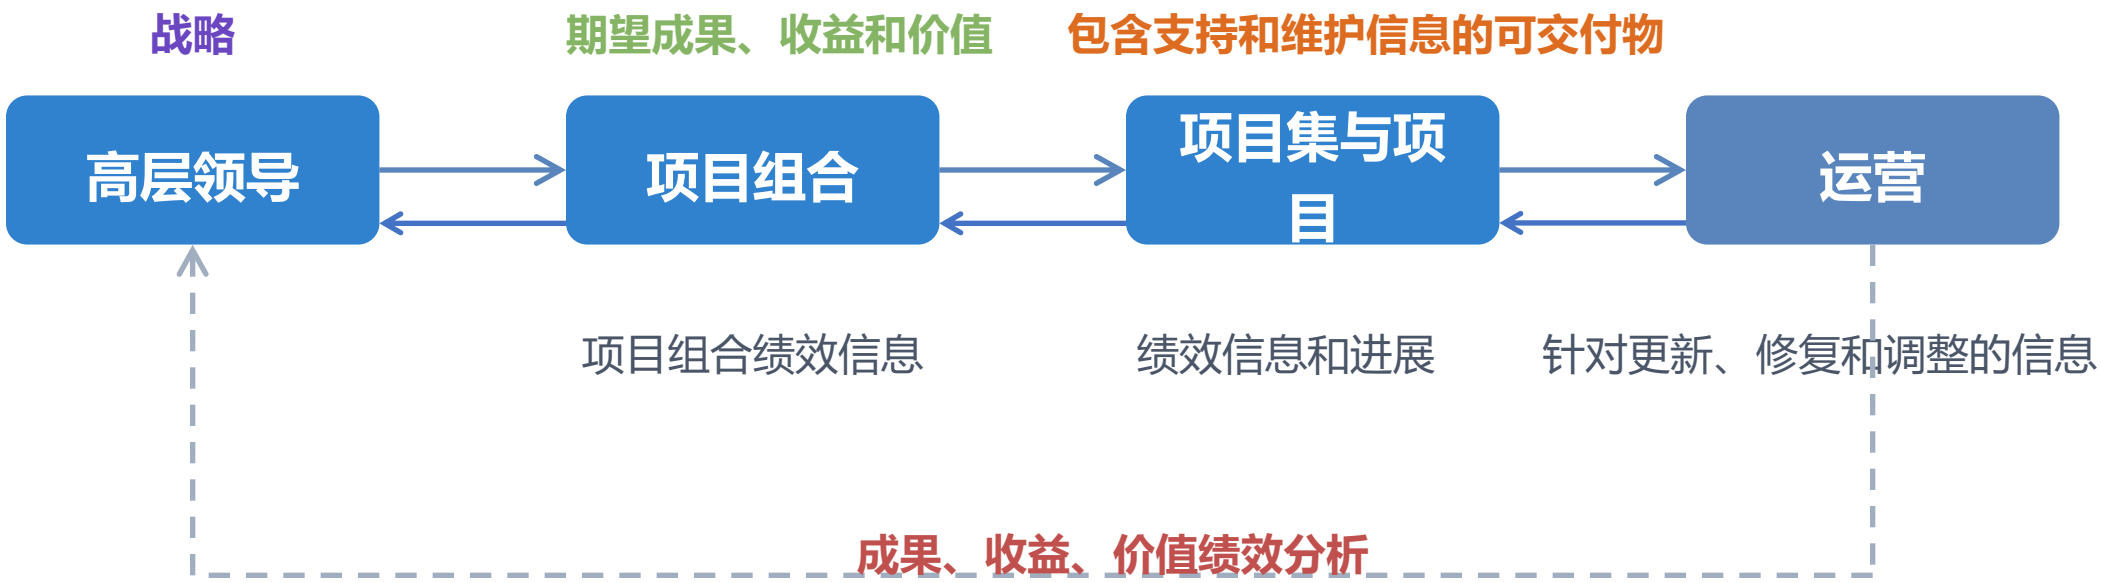


表 2-1 **组织结构对项目的影响**

组织结构类型	工作团队安排	项目经理的职权	项目经理的角色	资源可用性
有机型或简单型	灵活，人员协同工作	低	兼职角色，可能是正式岗位（如协调员），也可能不是	低
职能型（集中式）	按工作职能划分（如工程、制造）	低	兼职角色，可能是正式岗位（如协调员），也可能不是	低
多部门型	按以下任一维度划分：产品、生产过程、项目组合、项目集、地理区域、客户类型	低	兼职角色，可能是正式岗位（如协调员），也可能不是	低
矩阵型（强矩阵）	按工作职能划分，项目经理作为独立职能	**中等到高**	全职，为正式岗位	**中等到高**
矩阵型（弱矩阵）	按工作职能划分	低	兼职角色，作为其他工作的一部分完成，非正式岗位（如协调员）	低
矩阵型（平衡矩阵）	按工作职能划分	低到中等	兼职角色，作为一种职能嵌入职能，可能为非正式岗位（如协调员）	低到中等
项目导向型（复合型、混合型）	按项目划分	**高至几乎完全**	全职，为正式岗位	**高至几乎完全**
虚拟/网络型	网络结构，节点为与他人的接触点	低到中等	全职或兼职角色	低到中等
混合型	其他类型的混合	混合	混合	混合

治理系统的作用

治理系统与价值交付系统协同运作，可实现流畅的工作流程、管理问题并支持决策。治理系统提供了一个框架，其中包含指导活动的职能和流程。治理框架可以包括监督、控制、价值评估、各组件之间的整合以及决策能力等要素。

治理系统的整合结构

治理系统提供了一个整合结构，用于评估与环境和价值交付系统的任何组件相关的变更、问题和风险。这些组件包括项目组合目标、项目集收益和项目生成的可交付物。项目可以在一个项目集或项目组合内运作，也可以作为一个独立的活动进行。在一些组织中，项目管理办公室可能会为项目组合内的项目集和项目提供支持。项目治理包括定义用于批准变更和做出与项目相关的其他业务决策的职权。项目治理与项目集和/或组织治理保持一致。

3.3.1 组织治理结构



组织治理 governance（注重过程）

指组织各个层面的有组织的或有结构的安排，旨在确定和影响组织成员的行为。

项目组合、项目集和项目治理

项目治理是指用于指导项目管理活动的框架、功能和过程，从而创造独特的产品、服务或结果以满足组织、战略和运营目标。

提供项目决策框架、项目管理的流程、决策模板和工具；监督项目管理工作；控制进展和变更控制。

项目管理 management（注重结果）

是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求。

3.3.2 治理结构中的角色

01 PMO

项目管理办公室，负责为组织跟踪监督项目实现治理过程。

基本职能：

1. 维护和提供组织过程资产
2. 提供资源索引
3. 提供历史经验和资料
4. 提供各类项目管理所需的模板

分为：支持型、控制型、指令型（PMBOK第六版设定）

02 审计师

分为组织内部和外部审计（事务所等）。

负责对项目的整体或者单个领域（如采购、风险、质量等）进行结构化的审查。

03 治理委员会


对项目治理过程做出判断和决策的委员会。

- 基于专业技能和可用性开展工作的部门；

- 组织授予的工作职权；工作职责，开展组织根据技能和经验等属性合理分派的工作任务；具有纪律性的行为；统一指挥原则，统一领导原则；

- 组织的总体目标优先于个人目标；支付合理的薪酬；资源的优化使用；畅通的沟通渠道；在正确的时间让正确的人使用正确的材料做正确的事情；公正、平等地对待所有员工；明确工作岗位的安全职责；确保员工安全；允许任何员工参与计划和实施；保持员工士气。

计划　组织　指挥　协调　控制

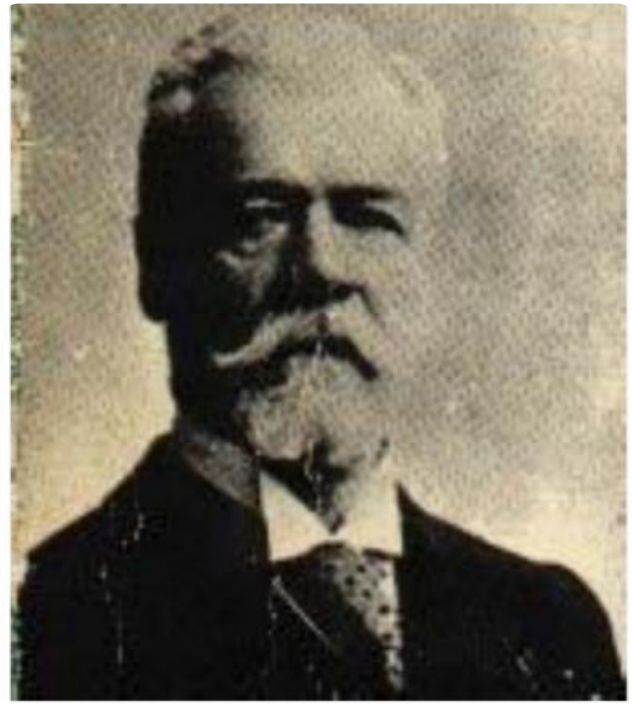

亨利·法约尔

现代经营管理之父、管理过程学派的开山鼻祖

项目管理团队成员应具备的能力

SOC 社会责任

该能力体现为项目管理团队应使其决策符合公共利益。

该能力包括但不限于以下方面：

- 将回馈行业和社会视为己任。
- 恪守道德标准，尊重文化和社会规范。
- 致力于自我发展和持续改进。

PS 影响力技能

该能力涵盖项目管理团队为成功执行项目所应具备的全部人际技能（如适应性和情商）。鉴于项目旨在为社会创造价值，该能力具有重要意义。

该能力包括但不限于以下方面：

- 运用批判性思维，审慎进行判断和决策。
- 实施团队激励方法。
- 运用谈判和冲突解决技能。

商业敏锐度・工作方式・结果导向

01 商业敏锐度

体现为战略思维的运用，以及项目管理团队在组织情境下的协同一致。理解战略执行与项目之间的联系，是确保交付给组织和社会的价值与整体组织战略保持一致的关键。

- 制定项目选择标准（成本、可行性、影响）。
- 运用行业知识。
- 进行战略思考、业务论证和财务分析。

02 工作方式

涵盖对标准、方法论和框架的理解与应用，项目管理团队可运用这些标准、方法论和框架来执行项目并为组织创造价值。

- 实施适当的项目管理方法（预测型、适应型、混合型）。
- 运用头脑风暴技术。
- 应用变更管理技术。

03 结果导向

体现为将构想和项目转化为实际行动并创造价值。完成任务的能力是一项核心能力，有助于确保实现预期价值。

- 应用问题解决技术（如根本原因分析）。
- 获得在组织政策范围内工作的权力和职权。

3.5.1 提供监督和协调

通常由 PM 或项目管理团队负责

监督与控制

具有此职能的人员通常通过精心安排项目工作，帮助项目团队实现项目目标。在项目团队内如何履行这一职能的具体情况可能因组织而异，但都可能包括领导规划、监督和控制活动。一些组织中，在项目前期，这一职能可能涉及一些评估和分析活动。此职能包括监督和开展工作以改善项目团队成员的健康、安全和整体福祉。

协调与支持

协调包括咨询管理层和业务单元领导的想法，以推进目标的实现、提高项目绩效或满足客户需要。它还可以包括协助进行商业分析、招标和合同谈判以及商业论证开发。

收益实现与裁剪

在项目可交付物最终确定后，但在项目正式结束之前，监督可以参与有关收益实现和维持的后继活动。此职能也可以为项目启动所在的项目组合和项目集提供支持。最后，需要裁剪此职能以适应组织。

3.5.2 提出目标和反馈

通常由 PM 和发起人 sponsor 负责，敏捷型中由团队负责

客户与最终用户

具有此职能的人员提供客户和最终用户的观点、见解和清晰指导。客户和最终用户并非总是同义词。

定义区分

客户是提出项目申请或提供项目资金的个人或群体。最终用户是将直接使用项目可交付物的个人或群体。

明确指导与持续反馈

项目需要客户和最终用户就项目需求、成果和期望作出明确指导。在适应型和混合型项目环境中，项目更需要获得持续反馈，因为项目团队正在探索和开发特定增量中的产品要素。在某些项目环境中，客户或最终用户会参与到项目团队，以便进行定期审查和反馈。对客户和最终用户意见和反馈的需要取决于项目性质以及所需的指导或指引。

3.5.3 引导和支持

通常由 PM 负责

团队引导

TEAM FACILITATION

引导和支持的职能可能与监督和协调密切相关，具体取决于项目性质。这项工作涉及鼓励项目团队成员参与、协作以及对工作输出的共同责任感。引导这一职能有助于项目团队就解决方案达成共识、解决冲突并做出决策。项目团队还需要通过引导这一职能来协调会议并以公正的方式推动实现项目目标。向个人和项目团队提供反馈，以帮助他们学习、适应和改进。

变革支持

CHANGE SUPPORT

项目团队还需要通过变革为员工提供支持，并帮助他们克服阻止成功的障碍。这可以包括评估绩效并采取适当的纠正措施。

3.5.4 开展工作并贡献洞察

通常由团队负责

知识技能贡献

KNOWLEDGE & SKILLS

这一群体的人员会提供生产产品和实现项目成果所需的知识、技能和经验，可以在项目持续期间或有限时间内以全职或兼职方式开展工作。项目团队可以集中办公或者以虚拟方式工作，具体取决于环境因素。

跨职能洞察

CROSS-FUNCTIONAL INSIGHTS

有些工作可能具有高度专业性，而其他工作则可以由具有多种技能的项目团队成员完成。从代表组织不同部门的跨职能项目团队成员获得洞察可以提供多种内部观点，与关键业务部门建立联盟，并鼓励项目团队成员成为其职能领域内的变革推动者。随着项目可交付物的实施或移交运营，这项工作可以扩展到支持职能（在项目开展期间或结束之后）。

3.5.5 运用专业知识

由团队及内外部专家 SME 等共同负责

专业知识贡献

EXPERTISE CONTRIBUTION

具有此职能的人员会提供与项目特定主题相关的知识、愿景和专业知识。他们会在整个组织内提供建议和支持，并为项目团队的学习过程和工作准确性做出贡献。这些人员可以是组织外部人员，也可以是内部项目团队成员。在整个项目期间或特定时间范围内都可能需要这些人员。

供应商支持

VENDOR SUPPORT

补充：供应商也可能会根据采购合同参与项目提供支持帮助，包括提供 SME 专家等等。

3.5.6 提供业务方向和洞察

预测型中由 PM 负责，敏捷型中由 PO 负责

方向指导与优先级确定

DIRECTION & PRIORITIZATION

具有此职能的人员会指导并澄清项目方向或产品成果。它涉及根据商业价值、依赖关系以及技术或运营风险来确定需求或待办事项的优先级。具有此职能的人员向项目团队提供反馈，并为要开发或交付的下一个增量或要素设定方向。此职能涉及与其他干系人、客户及其项目团队互动，以定义产品方向。其目标是使项目可交付物的价值最大化。

节奏与反馈机制

CADENCE & FEEDBACK

在适应型和混合型环境中，可以使用特定的节奏提供方向和洞察。在预测型环境中，可以设定指定的检查点来呈现项目进展并提供有关项目进展的反馈。在某些情况下，业务方向可以与资金提供职能和资源提供职能相互影响。

7 提供资源和方向

（发起人（sponsor）负责，PM执行落实）

具有此职能的人员会推动项目的开展，并与项目团队和更广泛的干系人群体沟通组织的愿景、目标和期望。他们是项目和项目团队的倡导者，可帮助项目活动得以推进所需的决策、资源和职权。这些人员充当高级管理层和项目团队之间的联络人，在使项目与商业目标保持一致方面发挥支持作用，消除障碍并解决项目团队决策权范围之外的问题。

具有此职能的人员为项目团队无法自行解决或管理的问题或风险（例如资金或其他资源短缺或无法满足的截止日期）提供上报路径。

8 维持治理

（PMO、治理委员会等负责）

履行治理职能的人员会批准并支持项目团队提出的建议，以及监督项目在实现预期成果方面的进展。

他们会维持项目团队与战略或商业目标之间的联系，而这些目标在项目过程中可能会发生变化。

我是谁

小王 老叉

那老叉我反过来问问你，项目经理到底管个啥

啥都不管！

啊~~~~！

越是大型复杂的项目越不是靠“管”出来的，因为个人的能力和精力是有限的，个人英雄主义是做不了大盘子的。出来混，要有自己的势力……额，串台了。我是说，优秀的PM要能创造一个走向成功的环境和能自持运行的秩序。

啥叫自持？没太明白

说简单点，就是你永远在给一台机器添加设定自动化规则，让机器自动跑出你想要的结果。当没达到预期的时候，干预干涉纠正，而非亲自操作机器一步一步地去执行，这样你会累死。就好比数控加工机床的效能，要远高于手提零部件。

那如何做到这一点？

建立秩序和赋能，就是给项目安排好大的框架和目标以及各方面的运行规则，但是却能授予团队以合适的权力，这样才能放过自己，成全大家。

哦……就是该放羊放羊、该摸鱼摸鱼、该干活干活是吧？

你果然天选打工人，但是记住，在项目管理的世界里，你得站在管理者的角度看待所有的事情，否则倒霉的是你自己哦。
