第 三 讲

# 项目管理原则

03

深入理解项目管理的底层逻辑与行为准则

从原则内涵到落地应用，建立项目管理的判断框架

# 3.6 项目管理四项价值观

VALUES

## 责任
Responsibility

我们有义务对自己所做的决策或未作决策、所采取的行为或未采取行为，以及相应的后果承担责任。

· 符合公共利益
· 只接胜任的任务
· 履行承诺
· 主动改错并提醒他人
· 保密
· 守法并举报违法

## 尊重
Respect

我们有义务对自己、他人和委托给我们的资源表现出高度的重视。

· 认知他人的行为规则
· 倾听并直接沟通冲突
· 诚信善意
· 不通过影响他人谋利

## 公正
Fairness

我们有义务客观而无偏见地做出决策和行动。我们的行为必须远离利益冲突、偏见和偏好。

· 决策公开透明
· 平等的信息获取
· 主动披露利益冲突
· 不歧视，不基于个人考虑决策

## 诚实
Honesty

我们有义务了解真相，并且在沟通和行为中以诚实的方式进行。

· 认真了解真相
· 保持诚实
· 及时准确地提供信息
· 营造讲真话的气氛
· 不进行并且不纵容欺骗

小王 老叉

我觉得PM是一个很牛X的职业，不用具体干活，可以对工程师喊来喊去的，内心感受肯定很不错吧？

你见过凌晨四点的猪八戒吗？

……

管理项目要在法律、道德、规矩、利益的多方争斗中做猪八戒，这种滋味可不好受啊。要想人前富贵，必定人后遭罪。

你是PM你怕谁？


常在河边走，哪有不湿鞋？对，要想做项目经理做得长久，就是得在河边走，但是不能湿鞋，那河边太潮咋办？我考考你。

嗯，穿胶鞋！或者让人背着你走！


你这小子有点意思哈。对，穿“胶鞋”就是严格遵守各种规范，把河水挡在鞋子外；背着走，就是当不是你该扛的时候，让该扛的人去扛呗。要记住，我们是管理者，但是也是打工仔，嘿嘿。

## 3.6 项目管理原则与通用管理原则

项目管理原则脱胎于通用管理原则，相互有重叠、有侧重，但是相互不抵触。

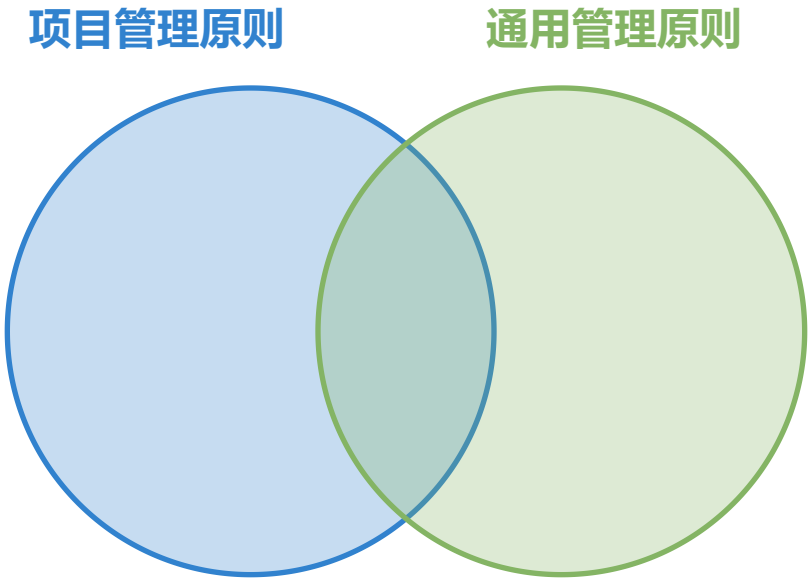


项目管理原则与通用管理原则的重叠

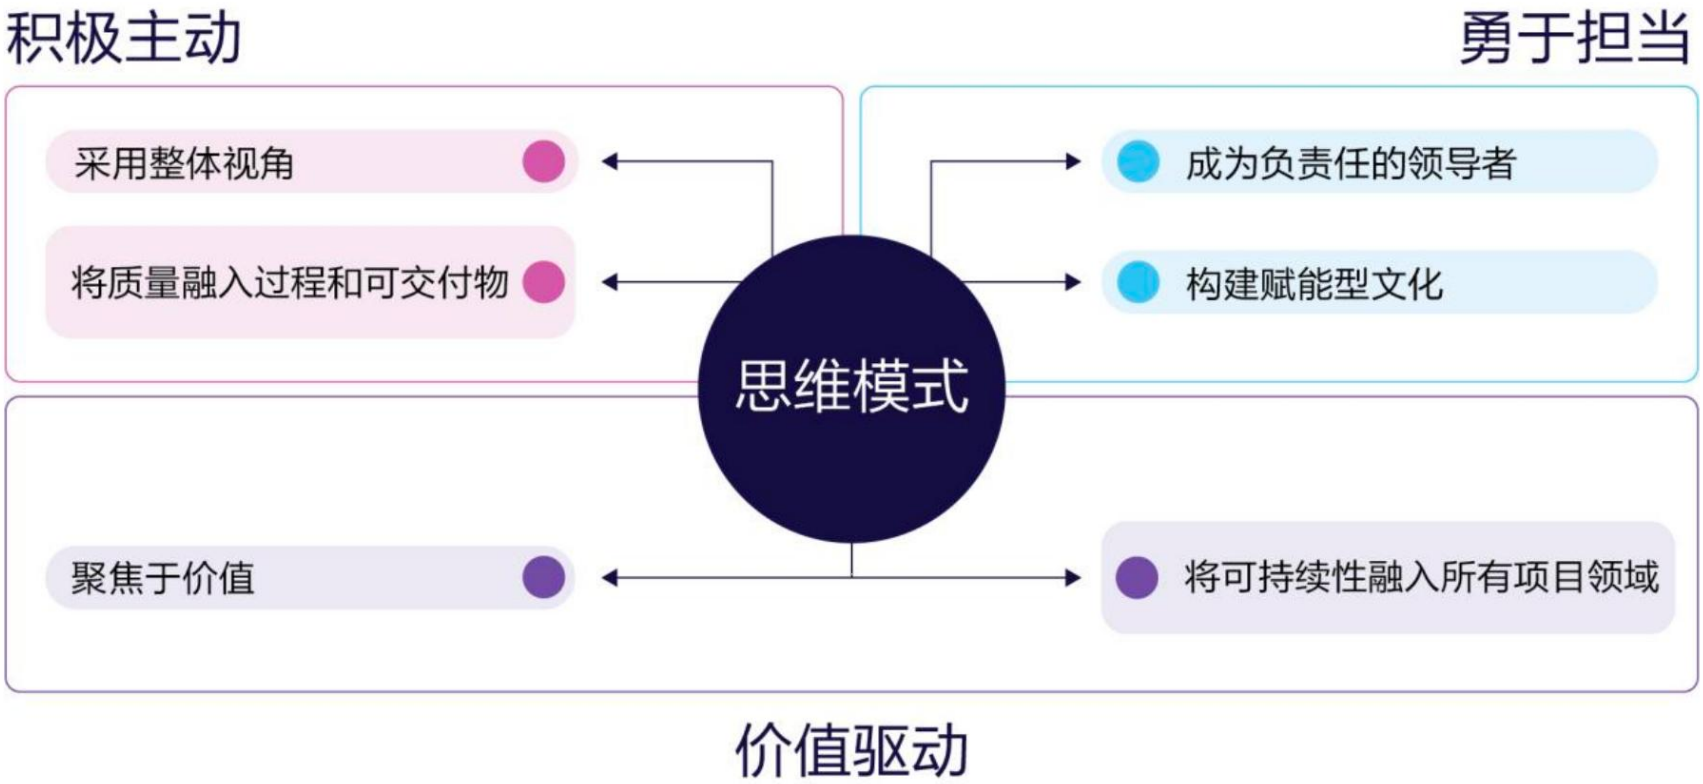
积极主动
勇于担当
采用整体视角
将质量融入过程和可交付物
成为负责任的领导者
构建赋能型文化
思维模式
聚焦于价值
将可持续性融入所有项目领域
价值驱动

# 3.6.1 成为负责任的领导者

### 诚信、正直和公正

这些是所有团队成员都应具备的价值观，在此价值观下，人们展现出指导其做出决策（尤其在艰难处境中）的道德准则。秉持诚信与公正的领导者所做的决策着眼于共同利益，有助于与利益相关方建立信任。

### 自我认知

有效的领导者能通过理解自身动机、价值观和优势，将情感、思想与行动有机结合。这种自我认知有助于专业人士建立关系以达成结果。

### 尊重、谦逊和开放

领导者应乐于接受反馈，为团队服务，支持其需求并尽可能清除障碍。这些价值观构成了服务型领导力理念的基础。

### 灵活性和适应性

领导者应具备根据情境和对象调整其领导力风格的能力。应根据项目需要调整领导力风格，同时坚守领导者的核心价值观。

### 共享领导力

领导力并非任何特定角色所独有。在项目的不同阶段，团队成员、利益相关方或专家皆可担任领导者。高绩效项目的特点是，多人共同运用领导力技能。领导力有别于职权，职权是组织授予个人的控制权，而领导力则表现为通过以身作则来激励和鼓舞他人。

# 3.6. 成为负责任的领导者



## 项目影响

作为领导者，项目经理以其自身言行影响项目中的所有专业人员。项目经理通过综合运用领导力、有效沟通、决策制定、情商、问题解决、争取利益相关方参与和战略思维，来对项目和团队施加影响。其领导力风格直接塑造团队的协作模式，激发团队的积极性，并左右整体绩效。情商使项目经理能够化解冲突和压力，而利益相关方的深度参与则有助于获得支持和认同。负责任的领导者专注于创造超出项目工作本身的价值。他们致力于促进身边其他领导者的成长，并在自身影响范围内产生积极影响。该原则对项目经理和所有利益相关方有着深远且多元的影响，具体体现在：

01
**提高团队绩效。**

02
**增强信任和士气。**

03
**优化决策制定。**

04
**增强利益相关方的信心。**

05
**增强应对挑战的韧性。**

老叉，你说怎么样的PM才能算做是一个负责的PM?

回答这个问题前你得先想清楚什么是负责、为谁负责。项目工作上，我们是为组织/公司负责，要保证身为乙方的利益，要赚到钱，要养活团队，要拓展市场建立口碑，要拿回……额，我们应该拿回的东西。但是作为项目负责人，我们又要对客户负责，比如你做完客户想要的产品，但是客户说竞争对手也做出了类似的产品，你得再提升下功能性能和指标，那你为了客户的利益和满意负责，要想个各方都能接受的办法出来。诸如此类太多了。

所以在一个项目刚准备启动的时候，你就要定位好这个项目的你作为PM该为哪些人群负责、能为哪些人群负责。人的能力是有极限的，所以我老叉……还是要做人的。

# 成为勤勉、尊重和关心他人的管家



在不同的环境中，管家式管理（stewardship）的含义和应用会略有不同。管家式管理一方面涉及被委托看管某项事物，另一方面侧重于以负责任的方式规划、使用和管理资源，还有一方面是维护价值观和道德。

## 管家的特征：

01

并不拥有所有权，但是具有管理职责和部分管理授权。

02

既负责管理具体事务，也负责管理干系人。

03

管家的管理是以责任心为基础的自我管理。

管家的管理分为对组织内（有一定的管理权限）和对组织外（没有管理权限）管理两部分责任。

# 采用整体视角



“采用整体视角”原则要求，在理解和管理项目时，应将所有组件及其相互依赖关系作为更大系统的一部分进行考量。这种视角与系统思维的理念相契合，后者强调项目内各要素之间的关联性。该原则提供了一个框架，用于在整体环境中审视各要素的相互联系，洞察动态图景而非静态“切片”。在项目管理中应用整体视角，可产生更加整合、更具协同性的实践方法，以实现项目目标。以整体视角管理项目，其主要特征包括：

## 与组织战略和目标保持一致

项目更有可能为组织的战略目标做出积极贡献。

## 整合式决策机制

在决策过程中需要考虑整个项目生态系统内的不同观点，确保输出能够带来更可持续且有效的成果。

## 高效的沟通体系

在所有利益相关方之间进行清晰且一致的沟通，确保每个人都了解情况并保持一致。

## 管理不确定性和复杂性

在不确定性高的项目中，整体视角有助于确保在规划和执行中纳入相应技术，以渐进方式识别不确定性来源，化解可能损害项目价值主张的威胁。同样，对复杂性高的项目，整体性方法着力理解并简化项目内错综复杂的相互依赖关系，从而揭示本质规律以实现化繁为简。

## 主动且务实的风险管理

通过从一开始就建立整体视角，项目管理团队能够更广泛、更清晰地理解项目的相互关联。因此，项目管理团队能够更好地获取信息并及时制定决策，从而高效地化解威胁并把握机遇。

老叉，你在刚才和张总的汇报中提出先搞我们创新药业务的AI化，再搞其他方向上的拓展。

因为张总他只看结果，但是你的操心从上到下各个方面啊。对于我们公司来说，创新药AI开发是最能看得到落地路径的，已经有其他公司的成功实践了，而且投入相对可控，并且项目成果对公司的回报也很大。而其他领域的AI落地则要艰难得多。所以从整体角度考虑，当然循序渐进更好。

明白了，那为啥张总强调要多头齐发？

从他的视角来看，搞的越声势浩大，越能受资本市场的追捧，以及获得董事会的支持，懂吗？

懂了。

# 聚焦于价值



项目管理的关注点从“如何完成项目”为目标，转为如何让项目实现预期或承诺客户和发起人的价值。当项目是项目集的组件时，项目对项目集成果的贡献可以表示为价值。

对项目是否符合商业目标以及预期收益和价值持续进行评估并作出调整。

价值是项目成功的最终指标。

价值可以在整个项目进行期间、项目结束时或项目完成后实现。

价值以及对价值具有促进作用的收益可以从定性和/或定量的角度来定义。

聚焦于成果可使项目团队能够支持创造价值的预期收益。

项目团队评估进展并进行适应性调整，从而使期望的价值最大化。

# 聚焦于价值



许多项目（尽管不是所有项目）都是基于商业论证而启动。也可能由于任何确定的交付需要，或者修改流程、产品或服务（如合同、工作说明书或其他文件）的需要而启动项目。在所有情况下，项目的目的就是提供预期成果，该成果通过有价值的解决方案满足需要。商业论证可以包含有关战略一致性、风险敞口评估、经济可行性研究、投资回报率、预期关键绩效测量、评估和替代方法的信息。商业论证可以从定性或定量的方面，或者同时从这两方面来说明项目成果的预期价值贡献。

**商业需要**

商业为项目提供理由，并解释为什么开展该项目。它源于初步的业务需求，这些需求反映在项目章程或其他授权文件中。商业需要提供了有关商业目的和目标的详细信息，它可能针对执行组织、客户组织、组织的合伙方或公共福利。明确说明商业需要有助于项目团队了解未来状态的商业驱动因素，并使项目团队能够识别机会或问题，从而提高项目成果的潜在价值。

**项目理由**

项目理由与商业需要相关。它解释了为什么商业需要值得投资，以及为什么在此时应该满足商业需要。项目理由会附有成本效益分析和假设条件。

**商业战略**

商业战略是开展项目的原因，所有需要都与实现价值的战略相关。

# 聚焦于价值



商业论证文件：由商业分析师BA或项目经理PM负责撰写的项目如何实现商业成功的论证文件，通常会提供商业理由和对项目预期商业价值的预测。

**格式灵活**

这种商业论证的格式会基于所选的开发方法和生命周期而异。

**常见示例**

包括具有详细估算投资回报的商业论证文件，或是描述问题、解决方案、收入流和成本结构等高层级要素的精益创业画布。

**作用与地位**

这些商业文件说明了项目成果如何与组织的商业目标保持一致。是项目章程的参考文件，也是项目高层次风险识别的来源。

# 3.6.3.3 聚焦于价值

在某些项目的背景下，可能存在不同形式的价值工程，这些价值工程可以将客户、执行组织或其他干系人的价值最大化。

**优化方式**

可以开源，也可以节流；可以早期确定后期更新，也可以先设定具体的价值定义，而与客户共同努力，确定哪些功能值得投资，哪些功能可能缺乏足够的价值，无需增加到输出之中，从而优化价值。

**价值评估**

项目的价值有长期或者短期考量，所以可靠的价值评估应考虑项目输出的全部背景和整个生命周期。

小王 老叉

老叉，你为啥一个PM除了盯着项目工期，还没事盯着外汇市场行情？

我可没有炒外汇啊，我们部分原材料不是要进口嘛，汇率会对项目利润产生明显影响。

那你为啥你项目现场打完灰，又免费给老乡铺路啊？

这不是灰打多了……啊，这不是因为和干系人搞好关系嘛，以后施工有打扰人家，也能多包容。

# 将质量融入到过程和可交付物中



质量是产品、服务或结果的一系列内在特征满足需求的程度。

01

质量的最高目标是客户满意。

02

项目质量要求达到干系人期望，并满足项目和产品需求。

03

质量聚焦于达到可交付物的验收标准。

04

项目质量要求确保项目过程尽可能适当而有效。

05

对产生可交付物的质量保持关注，这些可交付物要符合项目目标，并与相关干系人提出的需求保持一致。

# 将质量融入到过程和可交付物中



质量可能有几个不同的维度，包括但不限于：

## 绩效
可交付物的功能是否符合项目团队和其他干系人的预期？

## 一致性
可交付物是否适合使用，是否符合规格？

## 可靠性
可交付物在每次执行或生成时是否会产生一致的度量指标？

## 韧性
可交付物是否能够应对意外故障并快速恢复？

## 满意度
可交付物是否会获得最终用户的积极反馈？这包括可用性和用户体验。

## 统一性
和以相同方式生成的其他可交付物相比，可交付物是否具有相同性？

## 效率
可交付物是否能以最少的输入和人力投入产生最大的输出？

## 可持续性
可交付物是否会对经济、社会和环境参数产生积极影响？

## 质量的责任

| 传统质量观点 | 现代质量管理观点 |
| --- | --- |
| 质量是检查出来的 | 质量是规划出来的，而非检查出来的 |
| 质量就是指产品的质量 | 质量不只是产品，还包括过程 |
| 缺陷是不可避免的 | 事情一次做对成本最低——零缺陷 |
| 质量管理是质量部门人员的事情 | 质量管理，人人有责 |
| 对于质量事故，基层人员负主要责任 | 质量责任高层管理者承担85% |
| 质量越高越好 | 质量就是符合要求、适用、客户满意，需要考虑成本与收益 |
| 改进质量主要靠检查和返工 | 改进质量靠预防和评估 |

# 将质量融入到过程和可交付物中



密切关注项目过程和可交付物的质量会产生积极成果，包括：

- 项目可交付物符合验收标准所定义的目的
- 项目可交付物达到干系人期望和商业目标
- 项目可交付物缺陷最少或无缺陷
- 交付及时或有所加快
- 强化成本控制
- 提高产品交付质量
- 减少返工和报废
- 减少客户投诉
- 良好供应链整合
- 提高生产力
- 提高项目团队的士气和满意度
- 强健的服务交付
- 改进决策
- 持续改进过程

# 将可持续性融入所有项目领域



“将可持续性融入所有项目领域”原则旨在既满足当前需要，还不损害子孙后代满足其自身需要的能力。该原则可能涉及负责任地采用技术以开创更美好的未来，同时系统性地识别并减轻对组织、社区和环境的任何不利影响。

## 组织收益

这些收益包括员工满意度提高、绩效改善、人才留存率提高，以及招聘吸引力增强。附加收益还包括与股东和利益相关方关系的改善、风险应对和影响的优化、韧性和组织学习能力的增强，以及决策流程的优化。这种整体改进源于道德困境的化解、公司治理的加强、法律法规的遵守、诉讼成本的降低、品牌价值的提升和企业声誉的增强。

## 客户和利益相关方收益

这些收益包括：在整个项目生命周期中，通过积极倾听客户和利益相关方的意见、保持开放沟通所带来的满意度和创新能力提高。其他收益还包括：全球对可持续和创新产品需求的增长所带来的市场份额提升、声誉增强和新的市场机遇。

## 运营收益

这些收益包括内部流程创新、生产力提高（通过最小化运营浪费），以及可持续性设计。

## 财务收益

这些收益包括但不限于因降低物料和能源消耗而带来的直接成本节约、运营成本降低、废弃物减少、资本支出下降、股价攀升，以及更多来自金融投资者的持续投资。

# 将可持续性融入所有项目领域



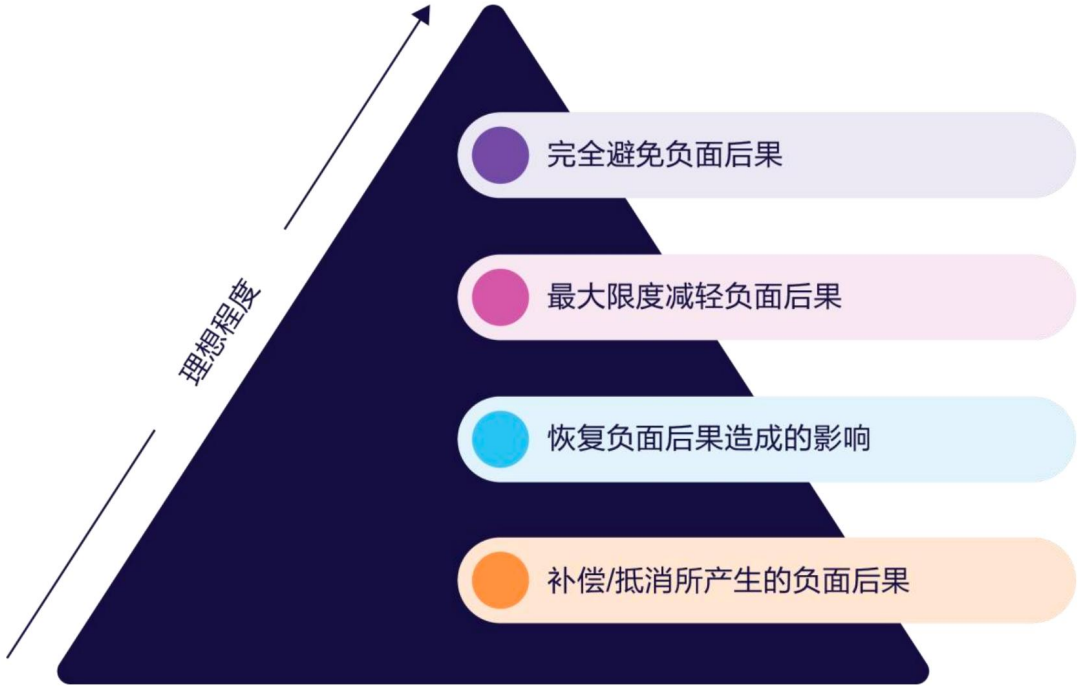



图 3-7　可持续性金字塔

# 将可持续性融入所有项目领域



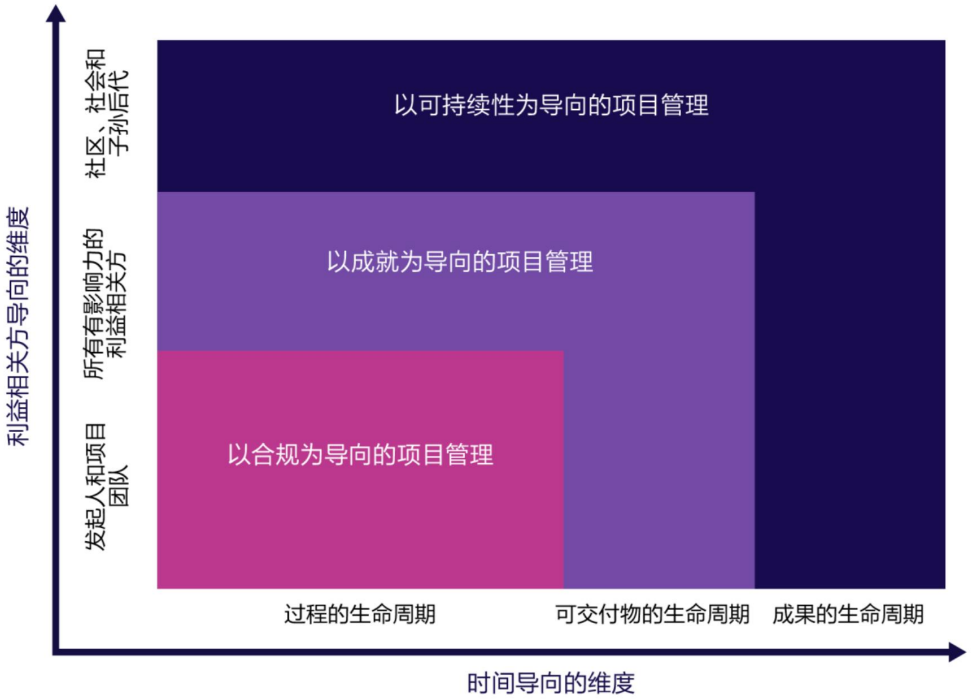



图 3-8　可持续性拓宽了项目管理的导向

# 构建赋能型文化



要培育赋能型项目文化，项目环境应有利于利益相关方与项目团队成员之间建立信任。

## 明确角色

明确个人角色、职责、团队协议和指导流程。

## 协同增效

这些要素使个人能够协同工作，通过互动产生协同效应，从而使利益相关方能够更高效、更有效地协作，推动项目成功。

# 展现领导力行为



领导力的六种类型（PMBOK第六版设定）：

**01 交易型**

关注目标和成就

**02 变革型**

注重创新和创造

**03 放任型**

充分信任团队

**04 服务型**

会换位思考，为团队创造内外部环境

**05 魅力型**

强大人格或形象魅力

**06 交互型**

集魅力、变革和交易为一身

# 拥抱适应性和韧性



适应性和韧性是任何开展项目的人员应具备的有益特征。

## 适应性

是指应对不断变化的情形的能力。

## 韧性

由两个具有互补性的特质组成：

- 吸收冲击的能力
- 从挫折或失败中快速恢复的能力

# 3.7.5.1 拥抱适应性和韧性

**项目现实**

不出意外的项目才是让人意外的。项目的进行总是伴随着各种意外发生，而不是每个意外都能有完美的解决方案去应对。所以“承受—恢复—强化”是每个良好管理的项目都应该有的过程。预期的成果而非可交付物能够促成解决方案，进而可利用比原始计划更好的结果。项目系统中的意外变更和情况也可能会带来机会。

**在项目环境中，支持适应性和韧性的能力包括:**

- 较短的反馈循环，以便快速适应;
- 持续学习和改进;
- 拥有宽泛技能组合的项目团队，同时还有在每个所需技能领域具有广博知识的个人;
- 定期检查和调整项目工作，以识别改进机会;
- 多样化的项目团队，以获得广泛的经验;
- 开放和透明的规划，让内部和外部干系人参与;
- 小规模的原型法和实验，以测试想法和尝试新方法;
- 充分运用新的思考方式和工作方式的能力;
- 平衡工作速度和需求稳定性的过程设计;
- 组织的开放式对话;
- 具有宽泛的技能组合、文化和经验的多样性项目团队，同时还有各个所需技能领域的主题专家;
- 对过去相同或类似工作中所获学习成果的理解力;
- 预测多种潜在情景，并为多种可能的情况做好准备的能力和意愿;
- 将决策推迟到最后责任时刻;
- 管理层支持;
- 平衡速度和稳定性的开放式设计。

# 为实现预期的未来状态而驱动变革



变革管理或使能（enablement）是一种综合的、周期性的和结构化的方法，可使个人、群体和组织从当前状态过渡到实现期望收益的未来状态。 结构化的变革方法可帮助个人、群体和组织从当前状态过渡到未来的期望状态。

**变革来源**

变革可能源于内部影响或外部来源。

**变革挑战**

促成变革可能具有挑战性，因为并非所有干系人都接受变革。在短时间内尝试进行过多变革，可能会导致变革疲劳和/或受到抵制。

**应对方式**

干系人参与和激励的方法有助于使变革顺利进行。

# 为实现预期的未来状态而驱动变革



01 组织中的变革可能源自内部。

02 变革可能由干系人实施并对其产生影响。

03 在组织中推动变革可能充满挑战。

04 项目团队成员和项目经理可与有关干系人共同合作，解决抵制、疲劳和变革吸收的问题，以提高客户或项目可交付物接收者成功采纳或接受变革的可能性。同样重要的是，使变革的速度适应干系人和环境接受变革的意愿、成本和能力。

05 项目带来的变革可以推动组织变革，但是组织的变革离不开文化的变革，然后是组织的组成形式和驱动形式的变革，这需要进行组织级变革管理，即OCM。

# 请问

QUIZ

1.项目管理中的复杂性主要体现在：

A 项目收到来自内部和外部干系人的影响

B 项目所面临的环境变化

C 项目生命周期当中需要使用多种管理和实践方法相结合

D 以上都是

# 请问

QUIZ

2.以下哪一种行为不是对项目的裁剪：

A 在项目进度中增加若干活动

B 修改干系人参与计划以增强干系人的支持

C 增加两个新功能进入项目范围基准

D 在项目下一阶段使用预测型的项目管理类型

# 请问

QUIZ

3.质量要体现的内容需要考虑以下哪一点，请选出错误答案：

A 质量无需考虑确保质量合格的成本，这是必要花费

B 质量管理涉及到项目中的每一个人，管理层承担主要责任

C 质量涉及从规划开始到交付的全过程，所以对整个过程做好质量规划设计

D 质量不能渐进明细，应该在规划中就明确要达到的质量目标并在之后的项目过程中予以实现

# 请问

QUIZ

4.以下哪种理念是最正确的?

A 项目管理注重严谨仔细，力求避免出错

B 项目经理负责管理好项目内的事情，项目外的事情由项目集、项目组合和治理委员会负责

C 交付可交付成果是项目的最终目的

D 项目中挫折、失败问题难以避免，但是可以依靠设计和管理来不断改进和完善。

# 请问

QUIZ

5.小王作为一名项目经理十分重视风险管理，他对每个识别到的项目风险都做了认真细致的规划和应对。请问小王的管理行为是否正确?

A 正确，风险管理的越细致，越能避免负面风险的发生

B 不正确，风险应该由风控部门统一进行管理

C 正确，风险管理要最终体现在风险应对措施上

D 不正确，不是每一个风险都需要规划和应对措施的

# 请问

QUIZ

6.在通过项目推动组织进行变革时，我们应该遵循如下哪个原则?

A 组织变革是高层的事情，项目应该聚焦于变革的技术实现而非理念的变革

B 文化理念的变革应优先于组织架构和工作方式的变革

C 项目运行方式的变革应优先于人员组成形式的变革

D 项目要依赖组织层面的推动来实现变革

# 请问



7.以下哪种行为不是基于关注价值的管理原则的：

A 更多的进行开发工作而仅做必要的规划工作

B 认为一件可交付物成果使用的技术先进性与功能性同样重要

C 重视客户和用户的使用反馈并将它体现在可交付物中，尽管这可能造成更高的使用成本

D 无论用户如何催促要求，我们始终都优先实现高价值的需求

# 请问

QUIZ

8.小王是一名勤勉的项目经理，他对项目做了详尽的计划安排，包括了团队每个人每天需要完成哪些工作，在哪些时间节点应该交付哪些成果，每个人的分工职责如何。然后他还会每天召开项目管理会议，详细了解每个人的工作进展、遇到的困难和需要的支持帮助，对于没有满足计划的事项他会亲自监督改进。尽管如此，团队仍然士气不高，抱怨小王管得太多了，工作绩效低下。小王应该怎么做?

A 寻求发起人的支持

B 改进工作方法，注重展现领导力和培育团队领导力文化

C 建立有效的奖惩制度，驱使团队能高效工作

D 调整团队成员，将那些抱怨的团队成员移到项目外

# 请问

QUIZ

9.在某建筑工程项目中，项目经理得知某团队成员为了能顺利施工，与当地居民保持了超越工作需求的关系，但是这似乎并没有影响项目，反而使得项目开展得十分顺利。项目经理应该怎么做?

A 开展一次项目审计，对项目可能存在的隐患进行排查

B 就该员工的不当行为向管理层进行举报

C 与该员工展开一次单独的沟通，了解具体情况

D 只要没有发生违规情况，就不用管

# 请问

QUIZ

10.项目经理发现客户对项目的满意度不高，调查后得知客户曾经与本组织合作得不愉快，故意为难项目。作为项目经理应该怎么做?

A 将该情况上报发起人，寻求帮助

B 将项目的干系人参与计划发给客户，寻求客户的理解和支持

C 将项目的效果实现计划与客户分享，用利益说服客户

D 与客户沟通开会，坦诚地交流想法，寻求客户的支持

# 请问

QUIZ

11.小张新被派到项目上，被分配了一些较为简单的工作，这导致了从事较难核心工作的小李的不满。他认为项目经理偏袒小张，分配不公。作为项目经理的你应该怎么做?

A 提高小李的绩效评分并给予奖励来安抚小李

B 制定责任分配矩阵RAM详细阐述两人的工作职责

C 将一部分小李的工作分配给其他人来平衡二人的工作量

D 和小李开会告诉他，这就是他的工作职责，必须服从项目经理的安排

# 请问

QUIZ

12.项目完成验收即将进入结束阶段，客户突然提出因为市场发生了变化，需要项目做一个重大的可交付物改变才能适应市场要求，而该改变将大大增加项目成本并交付难度。但是项目经理与客户沟通后得知客户无力承担这些代价，因为客户急需此项目成果来赢得市场改变困境。项目经理应该怎么做?

A 拒绝客户的请求，因为已经通过了验收

B 与客户探讨最优的代价与效果的平衡，然后就后续行动征询发起人的意见

C 满足客户的要求，因为为客户创造价值是我们的项目最高目标

D 理解客户的处境并表达同情，然后就可行的方案与客户进行商讨
