单选题 1/180、Case Study 1: Highway Infrastructure Overhaul

A project manager is overseeing a multi-million-dollar project to overhaul a municipality's highway infrastructure, including highways, bridges, and toll roads. The project is expected to take two years and involves multiple stakeholder groups, including engineers, inspectors, IT departments, construction crews, planning board members, government officials, insurance companies, suppliers, and union representatives. At the start of the project, the project manager conducted a stakeholder analysis to develop a RACI (responsible, accountable, consulted, informed) matrix and a power/interest grid. Using this information, the project manager created a stakeholder engagement strategy and documented stakeholder expectations and communication preferences. As project execution got underway, several challenges emerged. The highway laborers' union raised safety concerns about the conditions on the worksite, while local government officials expressed frustration over increased traffic affecting residents' daily commutes. At the same time, the IT department struggled to secure proprietary data while providing key stakeholders with the necessary access. By the time the project reached closure, reports showed key performance indicators (KPIs) indicating low stakeholder satisfaction. The dissatisfaction resulted from a three-week schedule setback caused by equipment breakdowns, followed by shipment delays of the replacement parts. This ultimately resulted in a budget overrun.

Question

What action should the project manager have taken to address stakeholder concerns and mitigate impacts on the project's timeline and budget? (Refer to the case study)

案例研究 1：高速公路基础设施大修

一位项目经理正在监督一个耗资数百万美元的项目，对某市政当局的高速公路基础设施进行大修，包括高速公路、桥梁和收费公路。项目预计耗时两年，涉及多个利益相关方群体，包括工程师、检查员、IT 部门、施工队伍、规划委员会成员、政府官员、保险公司、供应商和工会代表。项目开始时，项目经理进行了利益相关方分析，以制定 RACI（负责、问责、咨询、知情）矩阵和权力/利益方格。项目经理利用这些信息制定了利益相关方参与策略，并记录了利益相关方的期望和沟通偏好。

随着项目执行的推进，出现了几个挑战。公路劳工工会对施工现场的条件提出了安全担忧，而

当地政府官员对交通量增加影响居民日常通勤表示不满。与此同时，IT 部门在向关键利益相关方提供必要访问权限的同时，难以保护专有数据。
到项目进入收尾阶段时，报告显示关键绩效指标（KPI）表明利益相关方满意度较低。不满源于设备故障导致的三周进度延误，随后替换零件的发货也出现延迟。这最终导致了预算超支。
问题：
项目经理本应采取什么行动来解决利益相关方的担忧，并减轻对项目时间表和预算的影响？（参考案例研究）

A. Enhance risk management by scheduling regular team meetings and ensuring clear communication with stakeholders. 通过安排定期团队会议并确保与利益相关方清晰沟通，加强风险管理。

B. Review the work breakdown structure (WBS) to determine the impact of the changes and update the document accordingly. 审查工作分解结构（WBS），确定变更的影响，并相应更新文档。

C. Incorporate resilience into the project management approach to help anticipate, respond to, and recover from risks. 将韧性纳入项目管理方法，以帮助预测、应对和恢复风险。

D. Develop a collaborative problem-solving process to eliminate risk, ambiguity, and uncertainty from the project. 制定协作式问题解决流程，以消除项目中的风险、模糊性和不确定性。

答案：C

解析：项目很少完全按计划进行；需求变更、利益相关方影响或环境干扰等不可预见的因素都可能对其产生影响。项目情境中的韧性涉及适应性和有效应对计划外事件与不利条件的能力。纳入韧性使项目能够承受进度或预算偏差并快速恢复，有效解决利益相关方的担忧，同时最大限度地减少对时间表和成本的负面影响。 其余选项均错误： 安排定期团队会议和提供充分的沟通是有帮助的做法，但仅靠这些不足以改进风险管理，也无法预防或恢复预算和时间表超支。审查和修订 WBS 不足以预防或应对影响预算和时间表的风险。 在如此规模的项目中，不可能消除风险、模糊性和不确定性。

单选题 2/180、Case Study 1: Highway Infrastructure Overhaul

A project manager is overseeing a multi-million-dollar project to overhaul a municipality's highway infrastructure, including highways, bridges, and toll roads. The project is expected to take two years and involves multiple stakeholder groups, including engineers, inspectors, IT departments, construction crews, planning board members, government officials, insurance companies, suppliers, and union representatives. At the start of the project, the project manager conducted a stakeholder analysis to develop a RACI (responsible, accountable, consulted, informed) matrix and a power/interest grid. Using this information, the project manager created a stakeholder engagement strategy and documented stakeholder expectations and communication preferences. As project execution got underway, several challenges emerged. The highway laborers' union raised safety concerns about the conditions on the worksite, while local government officials expressed frustration over increased traffic affecting residents' daily commutes. At the same time, the IT department struggled to secure proprietary data while providing key stakeholders with the necessary access. By the time the project reached closure, reports showed key performance indicators (KPIs) indicating low stakeholder satisfaction. The dissatisfaction resulted from a three-week schedule setback caused by equipment breakdowns, followed by shipment delays of the replacement parts. This ultimately resulted in a budget overrun.

Question

What action should the project manager have taken to address stakeholder concerns and mitigate impacts on the project's timeline and budget? (Refer to the case study)

案例研究 1：高速公路基础设施大修

一位项目经理正在监督一个耗资数百万美元的项目，对某市政当局的高速公路基础设施进行大修，包括高速公路、桥梁和收费公路。项目预计耗时两年，涉及多个利益相关方群体，包括工程师、检查员、IT 部门、施工队伍、规划委员会成员、政府官员、保险公司、供应商和工会代表。项目开始时，项目经理进行了利益相关方分析，以制定 RACI（负责、问责、咨询、知情）矩阵和权力/利益方格。项目经理利用这些信息制定了利益相关方参与策略，并记录了利益相关方的期望和沟通偏好。

随着项目执行的推进，出现了几个挑战。公路劳工工会对施工现场的条件提出了安全担忧，而

当地政府官员对交通量增加影响居民日常通勤表示不满。与此同时，IT 部门在向关键利益相关方提供必要访问权限的同时，难以保护专有数据。
到项目进入收尾阶段时，报告显示关键绩效指标（KPI）表明利益相关方满意度较低。不满源于设备故障导致的三周进度延误，随后替换零件的发货也出现延迟。这最终导致了预算超支。
问题：
项目经理本应采取什么行动来解决利益相关方的担忧，并减轻对项目时间表和预算的影响？（参考案例研究）

A. Use predictive analytics to anticipate risks and suggest effective mitigation strategies based on historical data. 使用预测性分析，基于历史数据预测风险并提出有效的缓解策略。

B. Include training for the project's construction crews as part of the deliverables to enhance on-the-job safety. 将项目施工队伍的培训纳入可交付成果，以加强在岗安全。

C. Email the union representatives to request more information and clarification about their concerns. 给工会代表发送电子邮件，请求获得更多关于其担忧的信息和澄清。

D. Conduct information sessions to document the concerns and develop risk mitigation strategies. 召开信息通报会，记录这些担忧并制定风险缓解策略。

答案：D

解析：通过记录担忧，项目经理确保所有问题都得到正式确认并可以跟踪。基于记录的担忧制定缓解策略，展示了结构化、主动的风险管理方法，这是项目经理的一项关键职责。 其余选项均过于狭隘和被动，不足以作为有效的主动风险管理行动： 虽然使用预测性分析预测风险是一种有效的技术，但它只侧重于数据分析，而非直接、主动地与利益相关方或项目环境互动，以识别和应对风险。 将培训纳入项目可交付成果，并不能满足主动识别和记录具体安全担忧或制定针对性缓解策略的需要。 仅通过电子邮件请求澄清可能会延误行动、遗漏关键背景信息，也无法为项目经理提供主动与利益相关方互动并制定可执行安全措施的机会。

单选题 3/180、Case Study 1: Highway Infrastructure Overhaul
A project manager is overseeing a multi-million-dollar project to overhaul a

municipality's highway infrastructure, including highways, bridges, and toll roads. The project is expected to take two years and involves multiple stakeholder groups, including engineers, inspectors, IT departments, construction crews, planning board members, government officials, insurance companies, suppliers, and union representatives. At the start of the project, the project manager conducted a stakeholder analysis to develop a RACI (responsible, accountable, consulted, informed) matrix and a power/interest grid. Using this information, the project manager created a stakeholder engagement strategy and documented stakeholder expectations and communication preferences. As project execution got underway, several challenges emerged. The highway laborers' union raised safety concerns about the conditions on the worksite, while local government officials expressed frustration over increased traffic affecting residents' daily commutes. At the same time, the IT department struggled to secure proprietary data while providing key stakeholders with the necessary access. By the time the project reached closure, reports showed key performance indicators (KPIs) indicating low stakeholder satisfaction. The dissatisfaction resulted from a three-week schedule setback caused by equipment breakdowns, followed by shipment delays of the replacement parts. This ultimately resulted in a budget overrun.

Question

What action should the project manager have taken to address stakeholder concerns and mitigate impacts on the project's timeline and budget? (Refer to the case study)

案例研究 1：高速公路基础设施大修

一位项目经理正在监督一个耗资数百万美元的项目，对某市政当局的高速公路基础设施进行大修，包括高速公路、桥梁和收费公路。项目预计耗时两年，涉及多个利益相关方群体，包括工程师、检查员、IT 部门、施工队伍、规划委员会成员、政府官员、保险公司、供应商和工会代表。项目开始时，项目经理进行了利益相关方分析，以制定 RACI（负责、问责、咨询、知情）矩阵和权力/利益方格。项目经理利用这些信息制定了利益相关方参与策略，并记录了利益相关方的期望和沟通偏好。

随着项目执行的推进，出现了几个挑战。公路劳工工会对施工现场的条件提出了安全担忧，而当地政府官员对交通量增加影响居民日常通勤表示不满。与此同时，IT 部门在向关键利益相关方提供必要访问权限的同时，难以保护专有数据。

到项目进入收尾阶段时，报告显示关键绩效指标（KPI）表明利益相关方满意度较低。不满源于设备故障导致的三周进度延误，随后替换零件的发货也出现延迟。这最终导致了预算超支。
问题：
项目经理本应采取什么行动来解决利益相关方的担忧，并减轻对项目时间表和预算的影响？（参考案例研究）

A. Request that the IT manager provide a detailed report stating their concerns and log them in the risk register. 要求 IT 经理提供一份详细报告，说明他们的担忧，并将其记录在风险登记册中。

B. Proceed with project execution, document the situation in the risk register, and notify the stakeholders. 继续推进项目执行，在风险登记册中记录该情况，并通知利益相关方。

C. Assess the impact of a safety breach, reprioritize tasks accordingly, and present options to stakeholders. 评估安全漏洞的影响，相应重新确定任务优先级，并向利益相关方呈现选项。

D. Implement an escalated risk response strategy because the issue falls outside the project's original scope. 实施升级的风险应对策略，因为该问题超出了项目的原始范围。

答案：C

解析：当发生安全漏洞时，项目的目标、资源和利益相关方可能立即受到影响。对影响进行彻底评估，可确保影响得到理解并被适当优先处理。这有助于识别薄弱环节并设计有效的解决方案。重新确定任务优先级至关重要，因为漏洞往往需要立即采取纠正措施，而这些措施可能与先前计划好的优先级不一致。向利益相关方呈现选项，可确保透明度和包容性决策。这种方法在维持项目进度计划并让利益相关方保持知情的同时，主动管理了风险。 其余选项效果较差：虽然要求 IT 部门经理提供详细信息并更新风险登记册可以获取信息，但这种方法过于被动，没有涉及主动分析影响或采取行动解决担忧。 在未积极应对 IT 部门数据安全担忧的情况下继续执行，可能增加项目风险，并可能导致延误或安全问题。 在未先评估影响、重新确定任务优先级或向利益相关方呈现选项的情况下升级风险，为时过早。即使该问题看似超出项目范围，项目经理仍有责任分析其对项目的潜在影响，并提出可行的应对措施。

单选题 4/180、Case Study 1: Highway Infrastructure Overhaul

A project manager is overseeing a multi-million-dollar project to overhaul a municipality's highway infrastructure, including highways, bridges, and toll roads. The project is expected to take two years and involves multiple stakeholder groups, including engineers, inspectors, IT departments, construction crews, planning board members, government officials, insurance companies, suppliers, and union representatives. At the start of the project, the project manager conducted a stakeholder analysis to develop a RACI (responsible, accountable, consulted, informed) matrix and a power/interest grid. Using this information, the project manager created a stakeholder engagement strategy and documented stakeholder expectations and communication preferences. As project execution got underway, several challenges emerged. The highway laborers' union raised safety concerns about the conditions on the worksite, while local government officials expressed frustration over increased traffic affecting residents' daily commutes. At the same time, the IT department struggled to secure proprietary data while providing key stakeholders with the necessary access. By the time the project reached closure, reports showed key performance indicators (KPIs) indicating low stakeholder satisfaction. The dissatisfaction resulted from a three-week schedule setback caused by equipment breakdowns, followed by shipment delays of the replacement parts. This ultimately resulted in a budget overrun.

Question

What action should the project manager have taken to address stakeholder concerns and mitigate impacts on the project's timeline and budget? (Refer to the case study)

案例研究 1：高速公路基础设施大修

一位项目经理正在监督一个耗资数百万美元的项目，对某市政当局的高速公路基础设施进行大修，包括高速公路、桥梁和收费公路。项目预计耗时两年，涉及多个利益相关方群体，包括工程师、检查员、IT 部门、施工队伍、规划委员会成员、政府官员、保险公司、供应商和工会代表。项目开始时，项目经理进行了利益相关方分析，以制定 RACI（负责、问责、咨询、知情）矩阵和权力/利益方格。项目经理利用这些信息制定了利益相关方参与策略，并记录了利益相关方的期望和沟通偏好。

随着项目执行的推进，出现了几个挑战。公路劳工工会对施工现场的条件提出了安全担忧，而

当地政府官员对交通量增加影响居民日常通勤表示不满。与此同时，IT 部门在向关键利益相关方提供必要访问权限的同时，难以保护专有数据。
到项目进入收尾阶段时，报告显示关键绩效指标（KPI）表明利益相关方满意度较低。不满源于设备故障导致的三周进度延误，随后替换零件的发货也出现延迟。这最终导致了预算超支。
问题：
项目经理本应采取什么行动来解决利益相关方的担忧，并减轻对项目时间表和预算的影响？（参考案例研究）

A. Use audits and checklists to translate the project management plan into executable activities for quality assurance. 使用审计和核对单，将项目管理计划转化为可执行的活动，用于质量保证。

B. Adjust the project scope baseline to provide stakeholders with a clearer view of the actual results. 调整项目范围基准，让利益相关方更清楚地了解实际结果。

C. Establish a performance measurement baseline that includes flexibility in both the schedule and the cost baselines. 建立绩效测量基准，在进度基准和成本基准中都包含灵活性。

D. Define clear boundaries within the contractual agreements of third-party suppliers and contractors. 在第三方供应商和承包商的合同协议中明确界定边界。

答案：A

解析：审计和核对单弥合了规划与执行之间的差距，确保活动和可交付成果达到预期标准，并增强利益相关方的信任和满意度。实施此类措施，通过符合项目目标和更广泛组织标准的一致行动，展示了对质量的承诺。通过执行审计，项目团队可以确认流程符合质量管理计划中规定的既定政策、程序和标准。核对单可确保具体标准和行动在各种实施活动中得到一致应用。这有助于利益相关方看到他们的需求和更广泛的项目愿景得到适当实现。 其余选项均错误： 调整项目范围基准是在变更发生后处理变更，而非主动管理利益相关方期望。 建立灵活的绩效测量基准处理的是规划和跟踪，而非直接对齐利益相关方期望或管理风险。 设定合同边界侧重于供应商和承包商的义务，而非对齐利益相关方期望或项目愿景。

单选题 5/180、Case Study 2: Software Company Acquisition

A global software company is acquiring a publicly traded software development company with offices nationwide. The acquisition will enable the parent company to deliver greater value to its enterprise customers. Key stakeholders include the project sponsor, executives from both companies, IT and HR managers, and customers. The project manager has been tasked with developing an integration strategy, which includes assembling an integration team, aligning product roadmaps, and managing the integration of HR systems. The project sponsor estimates that the project will take nine months to complete. The two companies have distinct corporate cultures and operating models, making integration a considerable challenge. In addition, the project manager must ensure a seamless transition for customers. The project manager will collaborate with the IT manager to ensure that the various disparate network infrastructures and subsystems are compatible and successfully merged with minimal downtime for customers. Shared applications must be consolidated to reduce cost and enable the parent company to assume ownership. Team members from both companies must learn to operate the shared and consolidated applications.

Question

A foreign government has expressed interest in owning a share of the newly merged company. What should the project manager do in response to this development? (Refer to the case study)

案例研究 2：软件公司收购

一家全球软件公司正在收购一家在全国设有办事处的上市软件开发公司。此次收购将使母公司能够为其企业客户提供更大的价值。关键利益相关方包括项目发起人、两家公司的高管、IT 和人力资源经理，以及客户。项目经理受命制定整合策略，包括组建整合团队、对齐产品路线图，以及管理人力资源系统的整合。项目发起人估计项目将需要九个月完成。两家公司拥有截然不同的企业文化和运营模式，使整合成为一项相当大的挑战。此外，项目经理必须确保客户的无缝过渡。项目经理将与 IT 经理合作，确保各种不同的网络基础设施和子系统兼容，并成功合并，将客户的停机时间降至最低。共享应用程序必须整合以降低成本，并使母公司能够承担所有权。两家公司的团队成员都必须学习操作共享和整合后的应用程序。

问题：

一个外国政府表示有兴趣持有新合并公司的一部分股份。项目经理应如何回应这一进展？（参考案例研究）

A. Encourage team members to ask questions of the engineers who have been with their companies the longest. 鼓励团队成员向在其各自公司任职时间最长的工程师提问。

B. Foster open communication among the teams and promote team-building activities and mentoring relationships. 促进团队之间的开放沟通，并推动团队建设活动和导师关系。

C. Conduct virtual surveys to encourage team members to share their expertise and experiences anonymously. 进行虚拟调查，鼓励团队成员匿名分享他们的专业知识和经验。

D. Schedule formal face-to-face meetings with both teams to provide a dedicated space for information sharing. 安排与两个团队的正式面对面会议，为信息共享提供专门空间。

答案：B

解析：开放的沟通可确保关键信息和专业知识在团队之间有效共享。软件和 IT 专业人员通常拥有专业的技术知识，如果不刻意努力，其他团队成员可能无法获得这些知识。导师关系为转移技能、工具和方法论提供了结构化机会，有助于减少知识孤岛。 其余答案效果较差： 只关注在自己公司任职时间最长的工程师，可能无意中排除其他团队或有相关专业知识的新工程师的有价值知识。 进行虚拟调查不是确保知识转移的有效方式。该选项无法建立个人沟通和知识共享所必需的信任环境。 安排正式的面对面会议可能令人望而生畏，且无法确保个人沟通。面对面会议也可能无法适用于所有团队。

单选题 6/180、Case Study 2: Software Company Acquisition
A global software company is acquiring a publicly traded software development company with offices nationwide. The acquisition will enable the parent company to deliver greater value to its enterprise customers. Key stakeholders include the project sponsor, executives from both companies, IT and HR managers, and customers. The project manager has been tasked with developing an integration strategy, which

includes assembling an integration team, aligning product roadmaps, and managing the integration of HR systems. The project sponsor estimates that the project will take nine months to complete. The two companies have distinct corporate cultures and operating models, making integration a considerable challenge. In addition, the project manager must ensure a seamless transition for customers. The project manager will collaborate with the IT manager to ensure that the various disparate network infrastructures and subsystems are compatible and successfully merged with minimal downtime for customers. Shared applications must be consolidated to reduce cost and enable the parent company to assume ownership. Team members from both companies must learn to operate the shared and consolidated applications.
Question
A foreign government has expressed interest in owning a share of the newly merged company. What should the project manager do in response to this development? (Refer to the case study)
案例研究 2：软件公司收购
一家全球软件公司正在收购一家在全国设有办事处的上市软件开发公司。此次收购将使母公司能够为其企业客户提供更大的价值。关键利益相关方包括项目发起人、两家公司的高管、IT 和人力资源经理，以及客户。项目经理受命制定整合策略，包括组建整合团队、对齐产品路线图，以及管理人力资源系统的整合。项目发起人估计项目将需要九个月完成。两家公司拥有截然不同的企业文化和运营模式，使整合成为一项相当大的挑战。此外，项目经理必须确保客户的无缝过渡。项目经理将与 IT 经理合作，确保各种不同的网络基础设施和子系统兼容，并成功合并，将客户的停机时间降至最低。共享应用程序必须整合以降低成本，并使母公司能够承担所有权。两家公司的团队成员都必须学习操作共享和整合后的应用程序。
问题：
一个外国政府表示有兴趣持有新合并公司的一部分股份。项目经理应如何回应这一进展？（参考案例研究）

A. Offer team-building exercises, such as role-play, to demonstrate the other company's organizational culture. 提供团队建设活动，如角色扮演，以展示另一家公司的组织文化。

B. Develop a program to implement change gradually, assisting team members in slowly adapting to the other organization’s culture. 制定一个逐步实施变革的计划，帮助团队成员慢慢适应另一家组织的文化。

C. Encourage team members to use dedicated communication platforms for real-time collaboration and information sharing. 鼓励团队成员使用专用沟通平台进行实时协作和信息共享。

D. Consider the unique characteristics of each team’s culture and tailor communication to maximize engagement. 考虑每个团队文化的独特特征，并量身定制沟通以最大化参与度。

答案：D

解析：考虑每个团队独特的文化特征至关重要。组织和团队文化影响人们在团队环境中如何沟通、解读信息以及互动。通过调整沟通风格以适应该团队的需求和偏好，项目经理可以建立更紧密的联系、减少误解，并促进积极参与。 其余选项均错误： 提供团队建设和角色扮演活动，对某些团队成员来说可能很尴尬，对其他成员来说可能被视为冒犯。 实施渐进式变革并不能保证团队成员理解、接受或有效融入新文化。 鼓励团队成员使用专用沟通平台进行实时协作和信息共享，并不能降低对变革的抵触。

单选题 7/180、Case Study 2: Software Company Acquisition

A global software company is acquiring a publicly traded software development company with offices nationwide. The acquisition will enable the parent company to deliver greater value to its enterprise customers. Key stakeholders include the project sponsor, executives from both companies, IT and HR managers, and customers. The project manager has been tasked with developing an integration strategy, which includes assembling an integration team, aligning product roadmaps, and managing the integration of HR systems. The project sponsor estimates that the project will take nine months to complete. The two companies have distinct corporate cultures and operating models, making integration a considerable challenge. In addition, the project manager must ensure a seamless transition for customers. The project

manager will collaborate with the IT manager to ensure that the various disparate network infrastructures and subsystems are compatible and successfully merged with minimal downtime for customers. Shared applications must be consolidated to reduce cost and enable the parent company to assume ownership. Team members from both companies must learn to operate the shared and consolidated applications.
Question
A foreign government has expressed interest in owning a share of the newly merged company. What should the project manager do in response to this development?
(Refer to the case study)
案例研究 2：软件公司收购
一家全球软件公司正在收购一家在全国设有办事处的上市软件开发公司。此次收购将使母公司能够为其企业客户提供更大的价值。关键利益相关方包括项目发起人、两家公司的高管、IT 和人力资源经理，以及客户。项目经理受命制定整合策略，包括组建整合团队、对齐产品路线图，以及管理人力资源系统的整合。项目发起人估计项目将需要九个月完成。两家公司拥有截然不同的企业文化和运营模式，使整合成为一项相当大的挑战。此外，项目经理必须确保客户的无缝过渡。项目经理将与 IT 经理合作，确保各种不同的网络基础设施和子系统兼容，并成功合并，将客户的停机时间降至最低。共享应用程序必须整合以降低成本，并使母公司能够承担所有权。两家公司的团队成员都必须学习操作共享和整合后的应用程序。
问题：
一个外国政府表示有兴趣持有新合并公司的一部分股份。项目经理应如何回应这一进展？（参考案例研究）

A. Monitor the project's strategic plan and update the goals and objectives to be achieved as the merger progresses. 监控项目的战略计划，并随着合并的推进更新要达成的目标和目的。

B. Include a document at the start of the project that establishes a link between the project and the company's business objectives. 在项目开始时纳入一份文件，建立项目与公司业务目标之间的联系。

C. Review all aspects of project activities and how their execution is outlined in each company's integration project plans. 审查项目活动的所有方面，以及每家公司整合项目计划中对其执行的说明。

D. Ensure that all stakeholder concerns are understood and that they are guided through the changes resulting from the merger. 确保所有利益相关方的担忧都得到理解，并引导他们度过合并带来的变革。

答案：D

解析：引导利益相关方度过项目的变革，有助于保持对最终结果价值的关注。与合并相关的变革通常会重新定义战略优先级、运营流程和组织结构。利益相关方可能以不同的方式看待这些变革，其理解、支持或反对程度也各不相同。解决他们的担忧有助于确保一致性和对组织新方向的共同承诺。 其余选项均错误： 监控项目的战略计划是个好主意，但随合并推进更新要达成的目标和目的，意味着偏离合并的初衷。 建立项目与公司业务目标之间联系的文件，是正式授权项目启动过程的一部分。它并不能确保预期项目成果与公司价值观保持一致。 审查每家公司整合项目计划，并不能确保预期项目成果与公司价值观保持一致。

单选题 8/180、Case Study 2: Software Company Acquisition

A global software company is acquiring a publicly traded software development company with offices nationwide. The acquisition will enable the parent company to deliver greater value to its enterprise customers. Key stakeholders include the project sponsor, executives from both companies, IT and HR managers, and customers. The project manager has been tasked with developing an integration strategy, which includes assembling an integration team, aligning product roadmaps, and managing the integration of HR systems. The project sponsor estimates that the project will take nine months to complete. The two companies have distinct corporate cultures and operating models, making integration a considerable challenge. In addition, the project manager must ensure a seamless transition for customers. The project manager will collaborate with the IT manager to ensure that the various disparate network infrastructures and subsystems are compatible and successfully merged with minimal downtime for customers. Shared applications must be consolidated to

reduce cost and enable the parent company to assume ownership. Team members from both companies must learn to operate the shared and consolidated applications.
Question
A foreign government has expressed interest in owning a share of the newly merged company. What should the project manager do in response to this development?
(Refer to the case study)
案例研究 2：软件公司收购
一家全球软件公司正在收购一家在全国设有办事处的上市软件开发公司。此次收购将使母公司能够为其企业客户提供更大的价值。关键利益相关方包括项目发起人、两家公司的高管、IT 和人力资源经理，以及客户。项目经理受命制定整合策略，包括组建整合团队、对齐产品路线图，以及管理人力资源系统的整合。项目发起人估计项目将需要九个月完成。两家公司拥有截然不同的企业文化和运营模式，使整合成为一项相当大的挑战。此外，项目经理必须确保客户的无缝过渡。项目经理将与 IT 经理合作，确保各种不同的网络基础设施和子系统兼容，并成功合并，将客户的停机时间降至最低。共享应用程序必须整合以降低成本，并使母公司能够承担所有权。两家公司的团队成员都必须学习操作共享和整合后的应用程序。
问题：
一个外国政府表示有兴趣持有新合并公司的一部分股份。项目经理应如何回应这一进展？（参考案例研究）

A. Assess the impact on the project scope that may result from external investment. 评估外部投资可能对项目范围产生的影响。

B. Collaborate with the IT manager to implement necessary measures for network and data security. 与 IT 经理合作，实施必要的网络和数据安全措施。


C. Meet with key stakeholders to determine internal and external investment policies. 与关键利益相关方会面，确定内外部投资政策。

D. Revise the project’s business case to ensure alignment with changes in the organization's objectives. 修订项目的业务论证，以确保与组织目标的变化保持一致。

答案：A

解析：外国投资可能带有与原始项目假设不同的特定目标、合规要求或战略优先级，从而导致目标、可交付成果或时间表的重大变化。通过分析外国投资的影响，项目经理可以识别使项目与组织目标保持一致所需的潜在变更、风险或调整。 其余选项均错误： 数据和网络安全应在合并期间及之后建立并实施。它们不应成为由外国投资引起的新问题。 与利益相关方会面讨论内外部投资政策，假设组织存在此类政策，而且这不是项目经理应采取的措施。 投资决策不应影响项目的业务论证。

单选题 9/180、The project manager has been using story points to monitor progress. A burndown chart was created to present to stakeholders, highlighting the project's performance over the past year. What month did the team complete fewer story points than expected? (Refer to the chart)
项目经理一直在使用故事点监控进度。为向利益相关方展示项目在过去一年的绩效，创建了一张燃尽图。团队在哪个月完成的故事点少于预期？（参考图表）

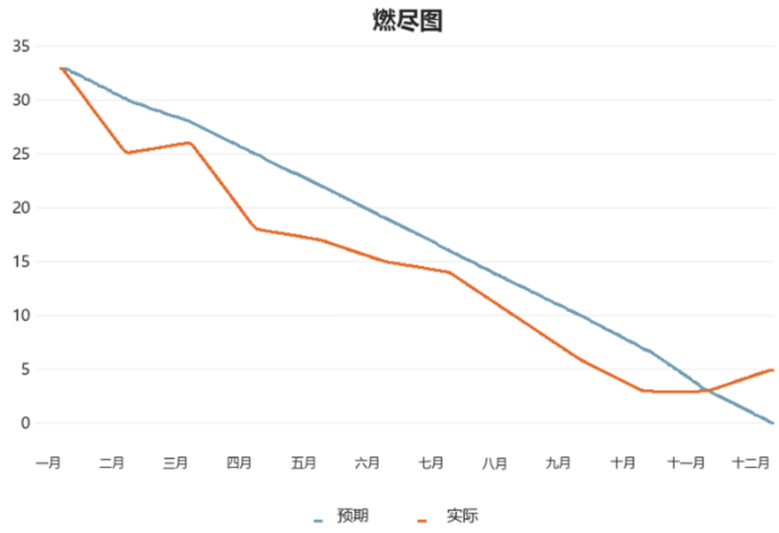

A. January 一月

B. March 三月

C. November 十一月

D. December 十二月

答案：D

解析：燃尽图是一种直观展示随时间推移剩余工作量的图形。团队通常在敏捷项目中，尤其是在冲刺期间使用它，以查看他们是否能按承诺完成工作。 横轴表示时间，例如冲刺中的天数。纵轴表示剩余工作，可以用故事点、任务或小时来衡量。图表以计划的总工作量开始。随着团队完成工作，剩余量应下降，形成下降趋势。燃尽图通常包含一条理想线和一条实际线。理想线表示从开始到结束稳定的完成速度。实际线显示实际发生的情况。如果实际线保持在理想线上方，团队可能落后于进度。如果下降到其下方，团队可能超前于进度。 在十二月，实际线高于预期线，这意味着剩余的故事点多于计划。这表明团队完成的故事点少于计划，落后于进度。 其余选项均错误： 在一月，实际线和预期线几乎相同，表明团队按计划进行，没有显著偏差。 在三月，实际线低于预期线，意味着团队剩余的故事点少于计划。这表明他们超前于进度，而非落后。 在十一月，实际线和预期线非常接近，但十二月显示了更显著的偏差。

单选题 10/180、A commercial office building project has a total budget of 8,000,000andatimelineof24months.Atthe1−yearmark,theprojectmanagerconductsaperformancereviewandfindsthatmoremoneythanexpectedhasbeenspent.(AllmonetaryfiguresareinUSdollars.)Thedatarevealsthefollowing:Theprojectwasexpectedtocomplete4,000,000 worth of work by now. The budget spent so far is 3,800,000.Thevalueoftheworkactuallycompletedis3,200,000. What is the cost variance (CV)?

一个商业办公楼项目的总预算为 ，工期为个月。在年节点，项目经理进行绩效审查，发现花费的金额超出了预期。（所有货币金额均以美元计。）数据显示如下：项目预计到此时应完成价值 8,000,000，工期为 24 个月。在 1 年节点，项目经理进行绩效审查，发现花费的金额超出了预期。（所有货币金额均以美元计。）数据显示如下：项目预计到此时应完成价值 4,000,000 的工作。

到目前为止已花费的预算为 。实际完成工作的价值为 3,800,000。实际完成工作的价值为 3,200,000。

成本偏差（CV）是多少?

A. − 600 , 000 − 600,000

B. 600 , 000 600,000

C. − 800 , 000 − 800,000

D. 800 , 000 800,000

答案：A

解析：CV 为−，这意味着项目花费比已完成工作的价值多出 600 , 000 ， 这 意 味 着 项 目 花 费 比 已 完 成 工 作 的 价 值 多 出 600,000。这表明项目超出预算。 成本偏差（CV）通过将已完成工作的价值与实际成本进行比较来衡量预算绩效。 CV 的公式为： CV = EV − AC 挣值（EV）是实际完成工作的价值。 EV = 实际成本（）是到目前为止已花费的预算。 3 , 200 , 000 实 际 成 本 （ ） 是 到 目 前 为 止 已 花 费 的 预 算 。 = 3 , 800 , 000 3 , 200 , 000 − 3 , 800 , 000 = − $600,000 其余选项均错误： 根据公式 CV = EV − AC，其他所有选项均不正确，因为它们与实际计算结果不符。

单选题 11/180、A project manager is forming a new project team and learns that key team members and external reviewers are already committed to other projects. Because these resources are controlled by various managers and stakeholders, the project manager needs a structured approach to gain their support and commitment for the new project. What should the project manager do?
一位项目经理正在组建新的项目团队，并得知关键团队成员和外部评审人员已经投入到其他项目中。由于这些资源由不同的经理和利益相关方控制，项目经理需要一种结构化方法，为新项目获得他们的支持和承诺。项目经理应当怎么做?

A. Schedule a meeting to discuss potential conflicts with upper management and request a resolution plan. 安排一次会议，与高层管理层讨论潜在冲突，并请求制定解决方案。

B. Develop a detailed stakeholder engagement plan that outlines how relevant stakeholders will be engaged. 制定详细的争取利益相关方参与计划，概述相关利益相关方将如何被参与。

C. Inform stakeholders about the overtime policy, and warn project managers to expect temporary resource constraints. 告知利益相关方加班政策，并警告项目经理们预期会出现临时资源约束。

D. Recognize the potential competition for resources and identify tasks that could be deferred for later development. 认识到资源的潜在竞争，并识别可以推迟到后期开发的任务。

答案：B

解析：当资源由不同的经理和利益相关方控制时，项目经理应使用结构化的利益相关方参与方法来建立支持、解决担忧并确保承诺。详细的争取利益相关方参与计划应概述每位利益相关方所需的参与程度，并明确其参与的性质。商定的计划通过将项目需求与利益相关方期望对齐，减少了潜在资源约束带来的不确定性。 其余选项错误，因为它们更具反应性或片面性： 向高层管理层升级可能是后续步骤，但不应作为第一个结构化步骤。在缺乏明确需求的情况下，管理层无法做出明智的决策，而这些需求应在计划中说明。 加班警告无法解决承诺问题。试图通过警告团队成员预期加班来最小化影响，并不能管理或缓解资源约束。在没有缓解策略的情况下仅告知利益相关方或发出警告，很可能无效，并可能加剧项目之间的紧张关系。 推迟任务是一种进度调整，而非获得利益相关方支持的方法。为应对有限资源可用性而进行的任何缩减，都应通过对争取利益相关方参与计划的正式调整来进行。

单选题 12/180、A team planned to complete 50 story points in an iteration but only reached 30. What is the schedule performance index (SPI)?
一个团队计划在一个迭代中完成 50 个故事点，但只完成了 30 个。进度绩效指数（SPI）是多少?

A. 0.6

B. 1.4

C. 0.8

D. 1.2

答案：A

解析：计算 SPI 时，我们使用以下公式： SPI = 挣值（EV）/ 计划价值（PV） 在本例中： EV：30 个故事点（实际完成的工作） PV：50 个故事点（计划的工作） 总之，SPI 为 0.6 表明团队以计划效率的 60%在执行，意味着他们落后于进度。 其余选项均因计算错误而不正确。

单选题 13/180、A global project pays suppliers in three currencies. Exchange rate volatility was identified as a known risk, and contingency reserves were set aside for it. A temporary shift increases projected costs by 10%, but the impact remains within the approved contingency reserve. Hedging is not permitted. What should the project manager do?
一个全球项目以三种货币向供应商付款。汇率波动被识别为已知风险，并为此预留了应急储备。一次暂时性的波动使预计成本增加了 10%，但影响仍在已批准的应急储备范围内。不允许进行套期保值。项目经理应当怎么做?

A. Implement financial risk response strategies such as hedging in coordination with finance experts. 与财务专家协调，实施套期保值等财务风险应对策略。

B. Work with suppliers to notify them that supplier payments will be delayed until exchange rates stabilize. 与供应商沟通，通知他们在汇率稳定之前将延迟支付供应商款项。

C. Explain to suppliers that their invoices will be paid in U.S. dollars until exchange rates return to normal. 向供应商解释，在汇率恢复正常之前，他们的发票将以美元支付。

D. Use the approved contingency reserve to address the cost impact from the identified exchange rate risk. 使用已批准的应急储备来应对已识别的汇率风险造成的成本影响。

答案：D

解析：该场景描述的是规划期间已经识别的已知风险。汇率波动事先得到了确认，并且专门为此预留了应急储备。应急储备旨在应对已识别风险发生时的影响。由于暂时性的成本增加仍在已批准的应急储备范围内，项目经理应实施计划好的财务应对措施，即使用该储备。这是最合适且最规范的做法，因为它遵循风险管理计划，保持在授权范围内，并且不需要未经授权地更

改采购条款或供应商关系。 其余选项均错误： 问题明确说明不允许进行套期保值。尽管在某些组织中，套期保值可以是对汇率风险的合法应对措施，但在本例中不可用。 延迟付款不是对所描述风险的适当应对。项目已有批准的储备来吸收影响，因此没有理由扰乱付款义务，延迟付款还可能造成新的风险，包括合同纠纷、供应商不满、索赔、进度延误和声誉损害。 如果供应商合同规定以特定货币付款，项目经理不能仅仅为了方便项目就决定以另一种货币付款。这类行为很可能违反合同协议，并引发法律、商业和关系问题。它还试图在未经协商或批准的情况下将汇率风险从买方转嫁给供应商，这不是恰当的合同管理。

单选题 14/180、A project manager is overseeing the construction of a new data center and is responsible for determining the optimal development methodology. The project manager needs to evaluate the project’ s circumstances and choose the appropriate development approach. What should the project manager do to achieve this goal?
一位项目经理正在监督新数据中心的建设，并负责确定最优的开发方法论。项目经理需要评估项目的情况，并选择适当的开发方法。项目经理应如何实现这一目标?

A. Implement structured processes and oversight mechanisms to minimize uncertainty and ensure the project aligns with organizational policies. 实施结构化流程和监督机制，以最小化不确定性，并确保项目符合组织政策。

B. Apply the development approach determined by the project management office to align the project to the organization’ s business priorities. 应用项目管理办公室确定的开发方法，使项目与组织的业务优先级保持一致。

C. Execute a review of similar projects to identify whether a predictive, hybrid, or adaptive approach has been most effective. 对类似项目进行审查，以确定预测型、混合型或适应型方法中哪种最为有效。

D. Use a suitability filter to assess the project’ s characteristics and determine the best fit among predictive, hybrid, or adaptive approaches. 使用适用性过滤器评估项目的特征，并确定预测型、混合型或适应型方法中的最佳匹配。

答案：D

解析：适用性过滤器是一种有用的决策工具，可帮助项目团队评估其独特的情况。适用性过滤器将项目评估与其他数据和决策工具相结合，以确保为每个项目选择适当的方法。 其余选项效果较差： 与组织政策保持一致是选择开发方法论的重要组成部分，但僵化地应用结构和流程可能不适合项目的情境，也无法进行必要的裁剪。 如果组织设有项目管理办公室（PMO），它会与项目团队合作，使项目与组织的业务优先级保持一致，并审查和批准开发方法。然而，并非每个组织都有 PMO，而且项目经理及其团队最终最了解其特定项目的情境。 审查具有类似情境的过去或正在进行的项目，可以在确定开发方法论时提供有价值的信息，但没有两个项目是完全相同的，考虑当前项目独有的所有信息以确定最优方法非常重要。

单选题 15/180、An architecture firm wants to increase its productivity. The firm has a major project in progress. The Chief Operating Officer (COO) suggests implementing a new time management software. However, the project sponsor is concerned that although the software might improve productivity, it might not support the project’s primary objective of delivering an exceptional customer experience. What should the project manager do?
一家建筑事务所希望提高生产力。该事务所有一个重大项目正在进行中。首席运营官（COO）建议实施新的时间管理软件。然而，项目发起人担心，尽管该软件可能会提高生产力，但可能无法支持项目交付卓越客户体验的首要目标。项目经理应当怎么做?

A. Propose a software option that best supports the organization’s need to increase productivity. 提出最能支持组织提高生产力需求的软件选项。

B. Demonstrate the effectiveness of time management training to reach a similar outcome at a lower cost. 证明时间管理培训以更低成本达到类似效果的有效性。

C. Examine the intended outcome with stakeholders and prioritize solutions that support higher-value outcomes. 与利益相关方一起审视预期成果，并优先考虑支持更高价值成果的解决方案。

D. Reject the suggestion and schedule a stakeholder meeting to determine whether they have other ideas. 拒绝该建议，并安排利益相关方会议，确定他们是否有其他想法。

答案：C

解析：项目经理应与利益相关方合作，明确项目的预期成果，并确定哪些行动或可交付成果最能支持整体战略目标，包括增强客户体验的首要目标。关注优先事项和预期成果，有助于引导行动实现项目的所有目标（包括卓越的客户体验），而非仅仅关注生产力。尽管软件解决方案可能实现预期的生产力成果，但实施以生产力为核心的调整可能不符合项目的目的。利益相关方必须保持一致，致力于交付推动预期成果的输出，而不是只关注单一层面。 其余选项效果较差： 软件可能不是最佳解决方案，因为生产力可能受到许多因素的影响。 提出最能支持生产力的时间管理软件，可以帮助团队找到最有效的产品，但它可能忽视其他可行的选项和权衡取舍。虽然软件似乎是最佳选择，但在做出决定之前，应仔细考虑所有因素，包括其对用户体验的影响。提高生产力很重要，但必须与提供卓越客户体验的目标相平衡。 时间管理培训可能不会带来更高的生产力，并可能分散其他领域的时间和注意力。如果培训未能实现预期的生产力提升或对客户体验产生负面影响，那么降低成本就是无效的。 让利益相关方参与并寻求额外意见或想法通常是有帮助的，但项目经理不应在未经评估和审查的情况下拒绝提议的解决方案。这可能会延误解决方案的实施，或忽视可行的解决方案。

单选题 16/180、A project team is completing a software release project, with another release scheduled for the following year. The project manager needs to ensure the team retains the knowledge gained during this project and makes it available as a reference for the next project. The team has documented procedures and created manuals, but they recognize that these do not capture all the tacit knowledge developed during the project. The project manager needs to ensure that as much of the team’s collective knowledge as possible is transferred. What action should the project manager adopt in this scenario?
一个项目团队正在完成一个软件发布项目，另一个发布计划在次年进行。项目经理需要确保团队保留在此项目期间获得的知识，并将其作为下一个项目的参考。团队已经记录了程序并创建了手册，但他们认识到这些并没有捕捉到项目期间形成的所有隐性知识。项目经理需要确保尽可能多的团队集体知识得到转移。项目经理在这种情况下应采取什么行动?

A. Ensure the manuals and documented procedures are stored in an accessible database for use on the next project. 确保手册和文档化的程序存储在可访问的数据库中，供下一个项目使用。

B. Conduct brainstorming sessions and retrospectives to identify information that should be collected during the project. 进行头脑风暴会议和回顾会，以识别在项目期间应收集的信息。

C. Use project management software to help ensure real-time tracking of milestones across the project's phases. 使用项目管理软件，帮助确保跨项目阶段的里程碑实时跟踪。

D. Define a final delivery point for transferring the software release and its documentation over to the implementation team. 确定将软件发布及其文档移交给实施团队的最终交付点。

答案：B

解析：通过对话、头脑风暴以及回顾会或经验教训会议，创造重复的知识转移机会，有助于识别从团队集体经验中获得的隐性知识，并使其更加显性化。 其余选项效果较差： 尽管手册和文档化的程序应可供下一个项目使用，但它们无法捕捉团队在从事此项目期间获得的所有集体背景知识。 使用管理软件跟踪跨项目阶段的里程碑有助于保留历史记录，但它不能确保捕捉到其他历史信息。 确定将项目移交给实施团队的交付点是结束项目的必要步骤，但它无法控制知识被传递的多少。

单选题 17/180、A healthcare technology firm is implementing a patient-portal upgrade across three regional clinics. The project manager notices that the configuration workstream has a detailed plan, but training and data-migration activities are still vague. The sponsor is pressing for a firm go-live date, and the clinics are already advertising the new portal to patients. What should the project manager do?
一家医疗技术公司正在三个区域诊所实施患者门户升级。项目经理注意到配置工作线有详细的计划，但培训和数数据迁移活动仍然模糊。发起人正在施压要求确定一个明确的上线日期，而诊所已经在向患者宣传新门户。项目经理应当怎么做?

A. Commit to a go-live date based on the configuration workstream plan. 基于配置工作线的计划承诺一个上线日期。

B. Ask the sponsor to postpone all communications until the portal is fully built. 请发起人推迟所有沟通，直至门户完全构建完成。

C. Develop an integrated plan that sequences configuration, migration, and training. 制定整合计划，对配置、迁移和培训进行排序。

D. Delegate the remaining planning work to the functional managers. 将剩余的规划工作委派给职能经理。

答案：C

解析：主要问题是碎片化规划。将所有工作线整合到一个单一的、排序的计划中，可使交付保持一致，并支持现实的上线承诺。项目经理应构建或完善一个整合计划，显示配置、数据迁移和培训如何相互依赖，然后从该计划中得出可信的上线日期。这也为与发起人和诊所达成一致提供了基础，因为他们已经在与患者沟通。 其余选项均错误： 基于单一工作线确定日期，忽视了关键依赖关系，并增加了失败的风险。 沟通已经在进行，仅仅试图停止所有沟通并不能解决根本问题，并可能损害与诊所和患者的可信度。 职能经理应参与规划，但项目经理仍负责将所有工作线整合为一个连贯的端到端计划。

单选题 18/180、A local government office is undertaking a new municipal construction project. With numerous stakeholders involved, clear communication of the project’ s objectives is vital. To begin, the project manager needs to clearly outline and communicate how the project’ s objectives will be executed, managed, and controlled. What should the project manager do?
一个地方政府部门正在开展新的市政建设项目。由于涉及众多利益相关方，清晰沟通项目目标至关重要。首先，项目经理需要清晰概述并传达项目的目标将如何被执行、管理和控制。项目经理应当怎么做?

A. Organize a plan sourcing strategy to determine the scope of work for executing external scoping decisions. 组织采购计划策略，以确定执行外部范围决策的工作范围。

B. Execute a scope management plan to document how the project scope will be defined, validated, and controlled. 执行范围管理计划，以记录项目范围将如何被定义、确认和控制。

C. Develop a project schedule to present linked project activities with their planned dates, duration, and resources. 制定项目进度计划，以呈现具有计划日期、持续时间和资源的关联项目活动。

D. Implement a project management plan to integrate and consolidate all subsidiary plan components. 实施项目管理计划，以整合并汇总所有子计划组件。

答案：D

解析：项目管理计划是一份总括性文档，整合并汇总所有子组件，如范围管理计划、进度管理计划、成本管理计划等。通过实施项目管理计划，项目经理确保了集中式信息来源，传达项目的目标将如何被执行、管理和控制。这种综合方法使项目的多个方面和利益相关方保持一致，满足了问题中概述的对清晰度和协调性的需求。 其余选项均错误： 采购策略侧重于与采购和外部资源相关的决策。虽然它是必要的，但仅靠它不足以清晰概述并传达项目的目标将如何被执行、管理和控制。 范围管理计划为范围提供指导方针，但它不能满足跨多个项目领域进行综合整合和保持清晰度的需求。创建并执行该计划只是更大的项目管理计划的一个子组件。制定项目进度计划对于项目管理至关重要，但它侧重于进度安排的具体细节，而非在利益相关方之间整合和传达总体项目目标。

单选题 19/180、A project team has been developing a new social media platform. The current project phase is nearing completion, and the team is working to finish its tasks and transition to the next phase. The project manager must determine whether the deliverables have been completed successfully. What should the project manager do?
一个项目团队一直在开发新的社交媒体平台。当前项目阶段接近完成，团队正在努力完成任务并过渡到下一个阶段。项目经理必须确定可交付成果是否已成功完成。项目经理应当怎么做?

A. Compare the finished product with the project’ s definition of done (DoD) to ensure it meets all the completion criteria. 将成品与项目的完成的定义（DoD）进行比较，以确保其满足所有完成标准。

B. Evaluate whether each project component has achieved its intended value as outlined in the value breakdown structure (VBS). 评估每个项目组件是否已实现价值分解结构（VBS）中概述的预期价值。

C. Schedule a meeting with the relevant stakeholders to evaluate the project and determine whether it meets their expectations. 安排与相关利益相关方的会议，评估项目并确定其是否满足他们的期望。

D. Examine the project backlog to confirm that all prioritized tasks are complete and that no outstanding work remains. 检查项目待办事项列表，确认所有优先任务均已完成，且没有未完成的工作。

答案：A

解析：DoD 是对某项工作（用户故事、特性或增量）被视为完成并可发布到下一阶段或交付给客户之前应满足的具体标准的共同理解。与 DoD 进行比较，可确保其满足所有预定义的完成标准，并符合商定的质量、功能性和可交付成果标准。这种比较可确保项目能够进入后续阶段或正式收尾，而不留下任何未完成的工作。 其余选项错误，因为它们各自只涉及完成要求的一个组成部分： 尽管评估项目价值、获得利益相关方签字确认和分析项目待办事项列表都是完成项目的重要步骤，但仅靠其中任何一项都不足以确定项目的完成状态。项目经理必须完成所有这些步骤以及 DoD 中列出的任何其他事项，以验证项目阶段已成功完成。

单选题 20/180、A project team is implementing a large-scale enterprise resource planning (ERP) system in the manufacturing industry. This is a high-priority project for the organization, in which the executive leadership is involved as project sponsors. The project manager is tasked with aligning expectations among all the relevant stakeholders. What should the project manager do?
一个项目团队正在制造业中实施大规模的企业资源计划（ERP）系统。这是组织的一个高优先

级项目，高管领导层作为项目发起人参与其中。项目经理的任务是对齐所有相关利益相关方的期望。项目经理应当怎么做?

A. Compare the priorities of executive leadership with those of other stakeholders and identify the common expectations. 将高管领导层的优先级与其他利益相关方的优先级进行比较，并识别共同的期望。

B. Analyze the differing needs and expectations of all stakeholders and prioritize them according to the organizational hierarchy. 分析所有利益相关方的不同需求和期望，并根据组织层级对其进行优先级排序。

C. Use predictive analytics and data visualization to present documentation to stakeholders and guide them toward the project team’s vision. 使用预测性分析和数据可视化向利益相关方呈现文档，并引导他们朝着项目团队的愿景前进。

D. Schedule steering committee meetings with the project sponsor and other stakeholders to discuss the project’s objectives. 与项目发起人和其他利益相关方安排指导委员会会议，讨论项目的目标。

答案：D

解析：让项目发起人参与所有重要的讨论和决策，使其能够行使决策权，同时促进与具有代表性的其他相关利益相关方的协作。这可确保利益相关方的期望与组织更广泛的战略和项目目标保持一致。 其余选项均错误： 在一个高知名度项目中，项目发起人拥有最终决策权，但促进与其他优先级和见解可能不同的利益相关方的讨论仍然是有帮助的。找到共同点很重要，但讨论期望存在差异的领域并达成协议同样重要。 虽然有时可能需要根据参与者的层级做出决策，但这并不能促进利益相关方期望的对齐，而且如果一些利益相关方感到他们的需求未得到重视，可能会在整个项目中对协作沟通产生负面影响。 预测性分析和数据可视化可以是收集文档以呈现给利益相关方并促进快速决策的强大工具，但考虑利益相关方的需求和期望，并在必要时调整项目目标以与之保持一致，仍然很重要。

单选题 21/180、A project team is developing a critical organizational training initiative. The project manager has consolidated all requirements into the formally

approved and baselined project management plan. During execution, unforeseen factors arise that were not captured in the plan. These factors could potentially affect implementation. What should the project manager do first?
一个项目团队正在制定一项关键的组织培训举措。项目经理已将所有需求整合到正式批准并设定基准的项目管理计划中。在执行期间，出现了计划中未捕获的不可预见因素。这些因素可能影响实施。项目经理首先应当怎么做?

A. Conduct a risk analysis on the new factors and submit a formal change request for review and approval by the change control board (CCB). 对新因素进行风险分析，并提交正式变更请求，供变更控制委员会（CCB）审查和批准。

B. Apply rolling wave planning techniques to refine detailed deliverables and progressively update the approved project management plan. 应用滚动式规划技术，细化详细可交付成果，并渐进更新已批准的项目管理计划。

C. Deliver the training initiative as originally planned and document the unforeseen factors that materialized as lessons learned for future projects. 按原计划交付培训举措，并将已实现的不可预见因素记录为供未来项目参考的经验教训。


D. Increase contingency and management reserves to account for unforeseen uncertainties and reduce the need for mid-project plan revisions. 增加应急储备和管理储备，以应对不可预见的不确定性，并减少项目中期计划修订的需要。

答案：A

解析：第一步是进行风险分析，以量化其潜在影响并评估其严重程度。该分析为准备正式变更请求奠定了基础。通过提交变更请求供 CCB 审查和批准，项目经理遵守了对已设定基准的计划所要求的正式变更控制流程。 其余选项均错误： 滚动式规划不适用于此处。滚动式规划用于迭代型、适应型方法，其中近期工作计划得更详细，而长期工作则渐进明细。然而，在本场景中，项目管理计划已经设定基准并正式批准。这些不可预见的因素代表变更，而非计划的细化，因此需要先进行正式处理。 按原计划交付培训举措不是主动的做法，也无法实时处理不可预见因素的影响，这可能危及项目的成功。记录经验教训很重要，但它是在项目完成后进行的，而非作为解决项目中期问题的方案。 储备通常在项目启动期间规划，不会在项目执行期间随意增加。对储备的任何增加也必须遵循正式的变更控制流程。

单选题 22/180、During a sprint review, the project manager presents a burndown chart. The line depicting the actual amount accomplished remains far below the expected trend for most of the sprint. The sponsor demands action, but the scrum master insists the team should self-organize. The product sponsor worries stakeholders will lose confidence if this pattern continues. What should the project manager do? (Refer to the chart)

在冲刺评审期间，项目经理展示了一张燃尽图。在冲刺的大部分时间里，描绘实际完成量的线条远低于预期趋势线。发起人要求采取行动，但敏捷教练坚持认为团队应自组织。产品发起人担心，如果这种模式持续下去，利益相关方将失去信心。项目经理应当怎么做？（参考图表）

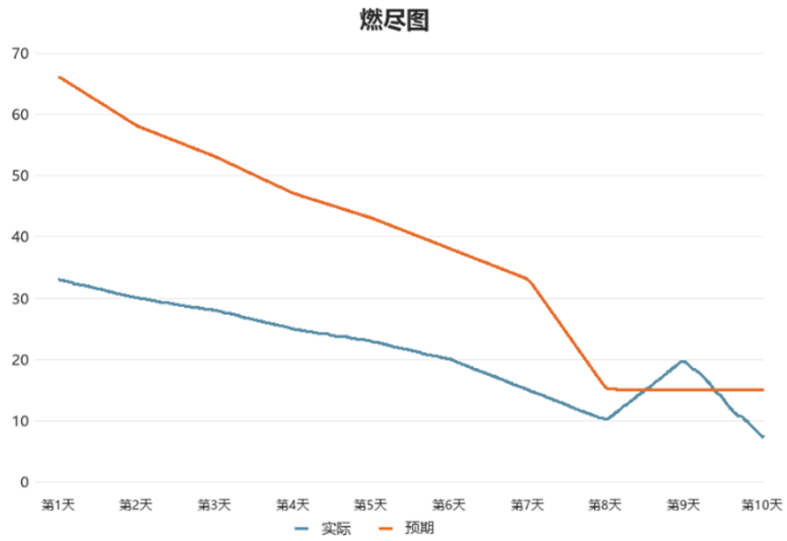

A. Recruit temporary team members to accelerate delivery and reduce the sprint backlog in order to satisfy stakeholders. 招募临时团队成员以加快交付并缩减冲刺待办事项列表，以满足利益相关方。

B. Escalate the concern to senior management and request approval to adjust the scope and modify the sprint commitment. 向高级管理层升级该担忧，并请求批准调整范围并修改冲刺承诺。

C. Support the scrum master and allow the team to self-organize, using the retrospective for improvements and learning. 支持敏捷教练，允许团队自组织，利用回顾会进行改进和学习。

D. Extend the sprint duration to allow the team to complete all committed work and demonstrate progress to stakeholders. 延长冲刺时长，让团队完成所有承诺的工作，并向利益相关方展示进展。

答案：C

解析：项目经理应让团队自组织，在回顾会中检视，并调整未来的规划。这通过允许团队利用回顾会进行检视和调整，优先遵循敏捷原则。它促进了问责制、持续改进和协作式问题解决。其余选项均错误： 在冲刺中期增加新成员会破坏团队稳定性，并违反敏捷原则。 升级是不必要的。待办事项列表和冲刺范围由团队和产品负责人管理，而非高级管理层。 冲刺时长是固定的。为容纳未完成的工作而延长冲刺，会降低可预测性，并为未来的冲刺树立负面先例。

单选题 23/180、A project manager at a mining company has been assigned the first engineering project since the company implemented a comprehensive new environmental policy. While integrating the required sustainability measures into the project management plan, the project manager becomes concerned that internal and external stakeholders may view these mandatory requirements as constraints that will slow progress. What should the project manager do?
一家矿业公司的项目经理被指派负责该公司实施全面的新环境政策以来的第一个工程项目。在将所需的可持续发展措施整合到项目管理计划中时，项目经理开始担心内部和外部利益相关方可能将这些强制性要求视为会拖慢进度的约束。项目经理应当怎么做?

A. Offset the cost of sustainability practices with the projected cost of failing regulatory compliance. 用未能遵守监管合规的预计成本来抵消可持续发展实践的成本。

B. Provide tools that will enable the team to measure and manage the sustainability of their work. 提供工具，使团队能够衡量和管理其工作的可持续性。

C. Educate the stakeholders about sustainability to ensure all parties are aligned with the environmental goals. 向利益相关方宣传可持续发展，确保各方都与环境目标保持一致。

D. Create opportunities for innovation by encouraging the team to develop resource-efficient solutions. 通过鼓励团队开发资源高效型解决方案，创造创新机会。

答案：A

解析：用未能遵守监管合规的预计成本来抵消可持续发展实践的成本，是一种基于财务推理的务实方法。它通过比较实施可持续发展实践的费用与不合规可能带来的更高成本，侧重于展示可持续发展的业务论证。 其余选项均错误： 虽然提供衡量和管理可持续性的工具在操作上是合理的，对执行也很重要，但它满足的是团队的需求，而非利益相关方的担忧。 向利益相关方宣传可持续发展强调教育和意识，这很重要，但它不能直接解决对感知限制的担忧，而成本等常见、可关联的指标才能衡量这些限制。 鼓励团队内部创新对项目执行很有价值，但它主要面向内部。它不能直接解决利益相关方如何看待可持续发展作为约束这一核心问题。

单选题 24/180、A project manager is preparing for a complex new project with significant uncertainty. The team is gathering requirements, analyzing stakeholder needs, and attempting to define multi-layered dependencies. What should the project manager do?
一位项目经理正在为一个具有重大不确定性的复杂新项目做准备。团队正在收集需求、分析利益相关方需求，并尝试定义多层依赖关系。项目经理应当怎么做?

A. Allow time in the schedule for delays because incorporating differing opinions might slow progress. 在进度计划中为延误留出时间，因为纳入不同意见可能会拖慢进度。

B. Elicit advice from individuals outside the project team to help the team maintain its momentum. 征求项目团队以外人士的建议，以帮助团队保持势头。

C. Seek guidance from subject matter experts (SMEs) who can help identify uncertainties and blind spots. 寻求能够帮助识别不确定性和盲点的主题专家（SME）的指导。

D. Plan to involve an external quality assurance auditor throughout the project to ensure consistency. 计划在整个项目中引入外部质量保证审计人员，以确保一致性。

答案：C

解析：在初始阶段，SME 可以指出潜在的陷阱或约束，有助于风险识别和稳健的规划。SME 可以帮助识别项目团队可能遗漏的不确定性和盲点，提高项目的效率。SME 可以提供可靠的背景、真实世界的影响，并揭示团队可能忽视的隐藏依赖关系。这在复杂和不确定的环境中尤其有价值。 其余选项均错误： 在没有努力更好地理解项目完整范围、依赖关系和不确定性的情况下随意增加时间，不是主动的做法。获得洞察可以提高效率并缩短项目时间表。 根据项目所需的具体专业知识，引入外部审计人员或专家可能是适当的。然而，只寻求外部建议是短视的，忽视了团队成员的专业知识，并排除了团队的参与。 在整个项目期间聘用审计人员可能是不必要的，无法有效满足这些初始规划需求，而且成本高昂。

单选题 25/180、A government contractor is awarded a project that involves multiple requirements in various compliance categories. The project sponsor asks the project manager to ensure compliance by allocating resources effectively. The project management office cautions that noncompliance could result in significant penalties. What should the project manager do?
一家政府承包商中标了一个涉及多个不同合规类别要求的项目。项目发起人要求项目经理通过有效分配资源来确保合规。项目管理办公室警告说，不合规可能导致重大处罚。项目经理应当怎么做?

A. Categorize the compliance requirements based on the penalties that apply if standards are not met. 根据未达到标准时将适用的处罚对合规要求进行分类。

B. Prioritize compliance efforts according to their significance and potential impact on the project. 根据合规工作的重要性和对项目的潜在影响来确定其优先级。

C. Organize a workshop with stakeholders to gather insights from their past experience with compliance regulations. 组织一次与利益相关方的工作坊，收集他们以往处理合规法规经验中的见解。

D. Allocate the majority of resources to the compliance categories that pose the greatest risk if standards are not met. 将大部分资源分配给未达到标准时风险最大的合规类别。

答案：B

解析：根据合规工作的重要性和潜在影响确定优先级，直接将资源分配与要求的重要性和影响挂钩。通过识别具有重大影响的高优先级要求，项目经理可以将工作集中在对最重要的事项上。这种方法基于风险和相关性，确保结构化、战略性的资源分配。 其余选项均错误： 虽然对要求进行分类可以提供清晰度，但它只是一个准备步骤。它不能确保有效的资源分配，无法应对优先级排序这一更广泛的挑战，也无法直接帮助减轻处罚。 工作坊和利益相关方参与可以增加价值，但该选项主要是在收集信息，更为笼统，而非具体侧重于合规优先级排序或资源分配。基于合规工作的重要性和潜在影响来确定优先级，可能导致忽视其他关键的合规领域，从而在履行不太关键但仍属强制性的要求时出现问题。

单选题 26/180、A project manager is leading a small internal project with limited scope, low complexity, and minimal risks. Despite this, the sponsor insists on a comprehensive, detailed risk management plan. The project manager worries that creating such a plan will consume limited resources, delay deliverables, and reduce efficiency. What should the project manager do?
一位项目经理正在领导一个范围有限、低复杂性、风险极小的小型内部项目。尽管如此，发起人坚持要求制定一份全面、详细的风险管理计划。项目经理担心制定这样一份计划会消耗有限的资源、延误可交付成果并降低效率。项目经理应当怎么做?

A. Develop a comprehensive risk management plan to demonstrate rigorous and thorough governance practices. 制定全面的风险管理计划，以展示严格、彻底的管理实践。

B. Confirm that all risks are documented in a comprehensive, detailed risk register, regardless of the project’ s size. 确认所有风险都记录在全面、详细的风险登记册中，无论项目规模如何。

C. Reallocate resources and request additional budget approval to prepare the comprehensive risk plan required. 重新分配资源并请求额外预算批准，以准备所需的全面的风险计划。

D. Explain that the project scope does not justify a detailed plan and suggest adopting an adaptive approach instead. 解释项目范围不足以证明制定详细计划的合理性，并建议采用适应型方法。

答案：D

解析：由于范围、时间和资源有限，应考虑采用适应型方法。这符合根据项目的具体需求裁剪项目管理实践的原则。虽然风险管理至关重要，但应用的严格程度应与项目的范围、复杂性和风险成比例。项目经理不应投入大量资源制定全面的风险管理计划，而应提出适合目的的风险管理实践，在不损害治理的前提下提高效率。适应型方法允许项目经理在保持效率并将资源集中在最需要的地方的同时，适当地管理风险。 其余选项均错误： 制定全面的风险管理计划展示了治理，但它浪费资源和时间，导致效率低下和延误，尤其是在风险极小且项目简单的情况下。 风险登记册很有价值，但为一个风险极小的项目创建详细的风险登记册，与项目的规模或风险不成比例。 为一个小型内部项目请求额外预算，不太可能是务实或合理的方法。

单选题 27/180、A technology company is designing a new product. The project team wants to incorporate renewable resources to meet sustainability goals and ensure compliance with evolving regulatory shifts. Some of the stakeholders are reluctant and worry that incorporating renewable resources will increase the cost of the project. The project manager must align the stakeholders' vision with the team’ s sustainability goals. What should the project manager do?
一家科技公司正在设计一款新产品。项目团队希望纳入可再生资源，以实现可持续发展目标并确保符合不断变化的监管转变。一些利益相关方对此抵触，担心纳入可再生资源会增加项目成本。项目经理必须使利益相关方的愿景与团队的可持续发展目标保持一致。项目经理应当怎么做?

A. Ask the project sponsor to communicate the organization’s sustainability expectations to the relevant stakeholders. 请项目发起人向相关利益相关方传达组织的可持续发展期望。

B. Demonstrate the value of sustainable technology by emphasizing decreased financial risks, improved social reputation, and long-term savings. 通过强调降低财务风险、改善社会声誉和长期节约来展示可持续技术的价值。

C. Organize a mandatory company meeting to encourage discussions about the impact of sustainability goals. 组织一次强制性的公司会议，鼓励讨论可持续发展目标的影响。

D. Compare the business case, project charter, and other formal project documents to identify the key performance indicators. 比较业务论证、项目章程和其他正式项目文件，以识别关键绩效指标。

答案：B

解析：可持续发展教育和协作通过促进问责制、使范围与组织目标和社会需求保持一致，以及增强利益相关方信任，来促进利益相关方参与。这种方法将在项目执行期间使团队受益，并为组织带来持久价值，在项目生命周期结束后改善其声誉和韧性。 其余选项均错误： 请项目发起人传达组织的可持续发展期望，不能促进与利益相关方的协作方法。虽然让项目发起人参与传达组织的期望可能是必要的，但这样做本身并不能解决利益相关方对成本的担忧，也无法使其愿景与项目团队保持一致。 让更广泛的社区参与可能是识别社会和环境可持续发展需求的关键部分，但它本身并不能解决成本担忧。增加更多利益相关方还会扩大项目管理的范围，并可能增加管理项目的成本和复杂性。 识别关键绩效指标将使团队能够在项目推进过程中比较项目与其既定目标和预期价值的吻合程度，但它本身并不能呈现可持续发展的成本-价值收益，也无法促进与利益相关方的沟通和信任建立。

单选题 28/180、A nongovernmental organization operating internationally is launching a medium-sized global project. The project team is made up of stakeholders from diverse cultural backgrounds and regions. To guarantee consistent stakeholder engagement and collaboration, the project manager must implement

inclusive communication strategies. What should the project manager do?
一家在国际范围内运营的非政府组织正在启动一个中等规模的全球项目。项目团队由来自不同文化背景和地区的利益相关方组成。为保证一致的利益相关方参与和协作，项目经理必须实施包容性沟通策略。项目经理应当怎么做?

A. Hold daily coordination meetings to promote real-time collaboration and stakeholder engagement. 举行每日协调会议，促进实时协作和利益相关方参与。

B. Foster open communication by implementing informal channels to facilitate rapid decision-making. 通过实施非正式渠道促进开放沟通，以加快决策。

C. Leverage large language models (LLMs) and generative AI (Gen AI) to automate stakeholder communication. 利用大语言模型（LLM）和生成式人工智能（Gen AI）实现利益相关方沟通的自动化。

D. Schedule multilingual updates and monthly virtual forums to foster stakeholder engagement and collect feedback. 安排多语言更新和每月虚拟论坛，以促进利益相关方参与并收集反馈。

答案：D

解析：多语言更新可确保来自不同地区和文化背景的利益相关方都能获取相关信息和正式更新。每月虚拟论坛为利益相关方提供了与项目团队虚拟会面并直接沟通的机会，而不会因时区差异造成不合理的日程负担。 其余选项效果较差： 当利益相关方可能位于不同时区时，每日协调会议在全球范围内难以规划和实施。在全球范围内开展项目时，异步协作是必要的。 非正式沟通渠道可以是快速获取问题即时答案的有用工具，但在与不同文化背景的利益相关方接触时可能引发冲突。许多文化更看重组织结构的层级化方式，因此正式的沟通可能更受青睐。
LLM 和 AI 可用于提供翻译和为利益相关方沟通制作成果，但纳入这些技术的风险必须通过组织的决策过程进行评估。仅依赖 AI 还可能导致信息失实、混淆和错位。这种方法侧重于单向沟通，而 AI 不是收集反馈的最佳策略。

单选题 29/180、A major retailer known for its environmentally conscious branding is launching a new collaboration that will attract significant public attention. It is

important to the organization’s image and brand recognition that the collaboration aligns with its broader goals. The project manager needs to ensure the project aligns with the organization’s vision and expectations throughout the project timeline. What should the project manager do?
一家以环保意识品牌著称的大型零售商正在推出一个新的合作项目，该项目将吸引大量公众关注。合作项目与组织更广泛的目标保持一致，对组织的形象和品牌认知度至关重要。项目经理需要确保项目在整个项目时间表内与组织的愿景和期望保持一致。项目经理应当怎么做?

A. Organize weekly newsletter reports to stakeholders, communicating progress and soliciting feedback on the project’s developing vision. 组织每周向利益相关方发送新闻通讯报告，传达进展并征求对项目不断发展愿景的反馈。

B. Schedule regular check-ins with the project sponsor to align with business objectives, report progress, and facilitate executive decision-making. 安排与项目发起人的定期检查会议，以与业务目标保持一致、报告进展并促进高管决策。

C. Compare progress and deliverables against the vision statement and other documentation developed during the project’s initiation phase. 将进展和可交付成果与项目启动阶段制定的愿景声明和其他文档进行比较。

D. Implement a project charter and facilitate daily meetings with the team to update it as the vision evolves throughout project development. 实施项目章程，并促进与团队的每日会议，随着愿景在项目开发过程中的演变对其进行更新。

答案：B

解析：项目发起人的职责包括将组织持续演变的愿景、目标或期望传达给项目经理和项目团队，这对实现环境、社会和治理目标至关重要。定期与项目发起人检查，可确保关于项目的所有决策都与组织更大的目标保持一致，并确保愿景的任何变化都能高效地传达给项目团队，以便他们相应调整工作。 其余选项均错误： 虽然就项目持续进展和愿景与利益相关方沟通是项目管理的重要组成部分，但这样做并不能保证项目的愿景保持最新并与更大组织的业务目标保持一致。征求利益相关方反馈对确保项目顺利运行至关重要，但仅靠它无法使项目愿景保持一致。愿景声明和项目启动阶段制定的其他文档，是比较进展与初始目标的有用工具，但这些文档必须根据项目发起人的任何反馈进行更新，以确保文档和项目都保持最新。 项目发起人负责确

保项目与组织目标的任何变化保持一致。与项目团队的每日简报有助于确保开发顺利进行，并记录所有变更，但任何对总体愿景的变更都必须有项目发起人的参与。否则，项目将面临无法实现更大组织目标的风险。

单选题 30/180、A software company is developing a self-service portal. Analytics show that most support calls stem from password resets and order tracking, but the backlog focuses on minor features like profile customization. The sponsor requests a higher return on investment (ROI) in the next release. What should the project manager do?
一家软件公司正在开发自助服务门户。分析数据显示，大多数支持来电源于密码重置和订单跟踪，但待办事项列表的重点是个人资料定制等次要功能。发起人要求下一个发布实现更高的投资回报率（ROI）。项目经理应当怎么做?

A. Reorder the backlog to focus on features that reduce the highest-volume support requests. 对待办事项列表重新排序，重点关注能减少数量最大的支持请求的功能。

B. Extend the project timeline so all planned features can be delivered as designed. 延长项目时间表，使所有计划中的功能都能按设计交付。

C. Ask the sponsor to increase the budget to add more developers to the team. 请发起人增加预算，为团队增加更多开发人员。

D. Maintain backlog features in their original priority order to prevent disruption and rework. 保持待办事项列表功能的原始优先级顺序，以防止中断和返工。

答案：A

解析：将工作聚焦于高影响力功能，针对使用数据反映出的实际痛点，交付更高价值。 在适应型/敏捷环境中，待办事项列表是一个活的、经过优先级排序的列表。项目经理通常与产品负责人合作，应确保待办事项列表的排序使价值最高的项目（与业务目标和分析数据保持一致）优先交付。对待办事项列表重新排序以针对最大的支持驱动因素，是提高 ROI 最直接、最负责任的方式。 其余选项均错误： 延长时间表交付的是更多范围，不一定是更多价值。仅为按设计交付所有功能而延长时间表，忽视了发起人对更高 ROI 的明确要求以及来自分析的新信

息。 增加资源解决的是产能问题，而非价值优先级问题。在未先优化现有范围和待办事项列表的价值的情况下要求更多预算和资源，是不良实践。 保持现有顺序，忽视了关于用户和业务最看重什么的新证据。

单选题 31/180、During a stakeholder review, the project manager presents a performance report to the stakeholders. A key stakeholder demands access to all raw data to ensure full transparency, while another stakeholder complains that reports already contain too much detail. What should the project manager do?
在一次利益相关方评审中，项目经理向利益相关方展示绩效报告。一位关键利益相关方要求访问所有原始数据以确保完全透明，而另一位利益相关方抱怨报告已经包含太多细节。项目经理应当怎么做?

A. Provide all stakeholders with direct access to all raw data so that they can choose their own level of analysis. 让所有利益相关方直接访问所有原始数据，以便他们可以选择自己的分析层级。

B. Share only high-level summaries of the information with all stakeholders to minimize their confusion and archive the rest of the information. 仅向所有利益相关方分享信息的高层级摘要，以尽量减少他们的困惑，并将其余信息归档。

C. Allow each stakeholder group to define how data should be consolidated and provide input before creating reports. 允许每个利益相关方群体定义数据应如何整合，并在创建报告之前提供意见。

D. Clarify that raw data becomes work performance information, which is then summarized into performance reports tailored to stakeholder needs. 澄清原始数据会变成工作绩效信息，然后汇总为根据利益相关方需求量身定制的绩效报告。

答案：D

解析：项目经理应解释绩效报告如何根据利益相关方的需求量身定制，因为一刀切的报告无法满足不同的需求。澄清原始数据到工作绩效信息的演进，并将其转化为可操作的绩效报告，可使项目沟通与利益相关方期望保持一致，促进相互理解并支持项目决策。 其余选项均错误：

原始数据不会直接分发；它会在提供给利益相关方之前经过处理。 高层级摘要可能造成困惑，并缺乏必要的具体性。将剩余信息归档并不能增加清晰度或透明度。 允许利益相关方单方面定义数据应如何整合，可能导致效率低下、期望错位或运营挑战。他们对数据整合的偏好可能与项目的实际或技术现实不一致，可能导致请求过于细化、不完整或冗余。

单选题 32/180、During testing, a software update shows several errors. The software development team double-checks to ensure they have followed the design documents properly. The sponsor pressures the team lead to determine what caused the issues before the next iteration, so the mistakes will not be repeated. What should the team lead do?
在测试期间，一次软件更新显示多处错误。软件开发团队进行复核，以确保他们正确遵循了设计文档。发起人向团队负责人施压，要求其在下一个迭代之前确定导致这些问题的原因，以便错误不再重演。团队负责人应当怎么做?

A. Engage subject matter experts (SMEs) to inspect the errors. 让主题专家（SME）检查这些错误。

B. Confirm that a proper version control system is in place. 确认已建立适当的版本控制系统。

C. Replace the team with more senior software developers. 用更有经验的高级软件开发人员替换团队。

D. Survey stakeholders to determine the causes of the errors. 调查利益相关方以确定错误的原因。

答案：A

解析：在调试、测试实践或开发中使用的特定技术方面具有专业知识的 SME，可以帮助系统地检查这些问题，并就错误及其解决方案提供见解。通过利用 SME 检查错误，团队负责人可确保在下一个迭代之前对技术问题进行彻底调查。SME 可以根据其分析提供可操作的建议，以指导后续对工作流程、工具或流程的调整。 其余选项均不完整： 版本控制系统对于管理变更和缓解风险至关重要，但它们不能解决理解并修复导致这些问题的错误的当务之急。 在流

程中途替换整个团队不切实际，且会中断进展。 利益相关方通常缺乏软件开发中错误原因方面的技术专业知识；他们的意见更适合用于验证需求和优先级。

单选题 33/180、A project team has been put together to oversee the development of a new app. The team is composed of senior members with years of experience on similar applications, as well as junior employees who are new to the organization. The project manager must ensure the effective transfer of relevant knowledge to the entire team What should the project manager do?
一个项目团队被组建起来监督一款新应用的开发。团队成员既包括在类似应用方面有多年经验的资深成员，也包括刚加入组织的新员工。项目经理必须确保相关知识有效转移给整个团队。项目经理应当怎么做?

A. Organize a workflow to codify the team’ s collective knowledge into a series of standardized manuals, procedures, and other documentation. 组织一个工作流程，将团队的集体知识编码化为一系列标准化手册、程序和其他文档。

B. Input information about team members’ past projects to generate documentation of lessons learned and retrospectives using AI. 输入团队成员过往项目的信息，使用 AI 生成经验教训和回顾会的文档。

C. Schedule brainstorming sessions to foster a collaborative, trust-based environment and make the team’ s tacit knowledge more accessible. 安排头脑风暴会议，营造协作、基于信任的环境，使团队的隐性知识更易获取。

D. Demonstrate the importance of prioritizing explicit knowledge, which can be easily communicated to both current and future teams. 展示优先考虑显性知识的重要性，显性知识可以很容易地传达给当前和未来的团队。

答案：C

解析：隐性知识是个人的、基于经验的，难以以标准化的方式阐述或转移。营造协作环境可通过开放沟通、导师关系、技能演示和面对面互动创造知识转移的机会。头脑风暴会议也为创造项目产生的新知识提供了机会，以支持组织运营和未来的项目或阶段，并为将隐性知识转化为

显性知识提供了机会。 其余选项效果较差： 虽然在可能的情况下将隐性知识转化为显性知识是知识管理的重要目标，但在项目时间表内组织一个专门对团队知识进行编码化和标准化的流程，可能不是对时间和资源的最佳利用。 使用 AI 存在重大风险，包括无意中危及敏感或专有信息，以及遭遇 AI 幻觉。AI 工具可用于知识管理，但不应在没有负责任的 AI 政策来管理相关知识的情况下使用。 如果没有基于团队经验的隐性知识的补充，显性知识无法充分发挥其潜力。、

单选题 34/180、A popular app is entering its next iteration. Due to staffing changes, the project team is mostly made up of new team members who were not involved in developing the app's previous version. The project team must effectively leverage information and lessons learned from past projects. What should the project team do?
一款热门应用即将进入下一个迭代。由于人员变动，项目团队主要由未参与开发该应用上一版本的新团队成员组成。项目团队必须有效利用过去项目的信息和经验教训。项目团队应当怎么做?

A. Recreate the current version of the app to gain hands-on experience and understand its strengths and weaknesses in real time. 重新制作当前版本的应用，以获得动手经验，并实时了解其优势和劣势。

B. Review the organization’ s information management system to assess processes, manuals, retrospectives, and other documentation. 审查组织的信息管理系统，评估流程、手册、回顾会和其他文档。

C. Organize a meeting with the previous development team to allow them to speak face-to-face and gain insights from past experiences. 组织一次与前开发团队的会议，让他们面对面交流，并从过去的经验中获取见解。

D. Compare the previous versions of the app to identify the changes made in each iteration and analyze the results of these findings. 比较应用的前几个版本，识别每次迭代所做的更改，并分析这些发现的结果。

答案：B

解析：利用前开发团队记录的显性知识，使项目经理及其团队能够在过去的团队成员是否在场的情况下，高效地访问已记录的流程、程序和经验教训信息。知识管理的一个重要目标是在可能的情况下将隐性知识转化为显性知识，前几次迭代的文档应反映这一点。 其余选项均错误：重新制作应用的前一版本对于希望在动手环境中学习的开发人员来说可能是一项有价值的练习，但它需要宝贵的时间，而这些时间本应花在构思和开发下一个迭代上。利用前几个团队的文档比重新审视他们的工作来推断他们学到的经验教训更高效。 与前开发团队会面可以提供有用的见解，并让团队成员获得可能无法从正式文档中推断出的隐性知识。然而，无法保证以前的团队成员可用，或会向当前项目提供相关信息。 比较应用的前几个版本非常耗时，而且本身不会揭示关于所做更改及其原因的有用信息。这项练习消耗了开发周期中本可用于创建新版本的宝贵时间。

单选题 35/180、A project manager is producing a project schedule. They create a rough work effort estimate by calculating the number of resources needed to complete the designated number of work units. However, the initial estimate is larger than expected, and the project manager would like to revise it. What should the project manager do?
一位项目经理正在制定项目进度计划。他们通过计算完成指定数量工作单元所需的资源数量，创建了粗略的工作投入估算。然而，初始估算比预期更大，项目经理希望对其进行修订。项目经理应当怎么做?

A. Increase the number of resources allocated to speed up the work. 增加分配的资源数量以加快工作。

B. Increase the skill proficiency level of the assigned resources. 提高分配资源的技能熟练度水平。

C. Increase the use of technology to automate some of the tasks. 增加技术的使用，将部分任务自动化。

D. Increase the level of efficiency by breaking the work into smaller units 通过将工作分解为更小的单元来提高效率水平。

答案：B

解析：提高资源的技能熟练度水平是减少所需工作投入的最可能途径。有了能力很强的工作人员，花在学习曲线和知识转移上的时间就会减少，从而带来更高的效率。 其余选项均错误：增加资源数量不一定会减少时间。事实上，知识转移、学习曲线和更多协调等因素可能会增加项目的持续时间。 即使部分工作可以自动化，只有在存在适当的技术、价格可承受且易于集成到项目中的情况下，使用更多技术才有帮助。否则，添加新技术可能会使工作投入复杂化并延长。 将工作投入分解为更小的单元，以便在更低的层级上进行审查，可能会使估算更准确，但不会使工作投入本身更高效。需要完成和跟踪的单元越多，可能适得其反。

单选题 36/180、A project manager needs to propose a method for a software development project that involves significant uncertainty and evolving requirements. Although the team favors an adaptive approach, a crucial stakeholder points out that additional approaches should also be considered. What should the project manager emphasize to convince the stakeholder that an adaptive approach is appropriate?
一位项目经理需要为涉及重大不确定性和不断变化需求的软件开发项目提出一种方法。尽管团队倾向于采用适应型方法，但一位关键利益相关方指出，还应该考虑其他方法。项目经理应强调什么，以说服该利益相关方适应型方法是合适的?

A. The project has clear and stable requirements that won't change as the project progresses. 项目有清晰、稳定的需求，不会随着项目推进而改变。

B. The project requires frequent stakeholder engagement and feedback as requirements emerge. 随着需求的浮现，项目需要频繁的利益相关方参与和反馈。

C. The project has a fixed scope, cost, and schedule that must be tightly controlled. 项目具有必须严格控制的固定范围、成本和进度计划。

D. The project involves deliverables that are repetitive and predictable in nature. 项目涉及的可交付成果在本质上是重复性和可预测的。

答案：B

解析：项目经理应强调，适应型方法通过定期让利益相关方参与并在迭代周期内纳入他们的反馈，使团队能够有效应对不确定性和不断变化的需求。强调随着需求演变而让利益相关方参与

以完善需求的必要性，直接支持了使用适应型方法的理由。 其余选项均错误，未能准确反映项目不确定和不断变化的性质： 如果项目具有必须严格控制的固定范围、成本和进度计划，则符合预测型方法，在这种方法中，所有内容都提前锁定。 重复性、可预测的工作（如制造装配或常规流程）更适合预测型甚至精益/运营方法。适应型方法适用于创新、不确定性和变化较多的项目。

单选题 37/180、A large enterprise is developing a product with multiple modules. One module passes internal quality testing, but the client rejects it, citing undocumented business rules. The project sponsor demands immediate rework to protect the contract. The development team maintains that the requirements were delivered per the scope. The project management office warns that rework without formal updates could expose governance gaps. What should the project manager do? 一家大型企业正在开发一个包含多个模块的产品。一个模块通过了内部质量测试，但客户以未文档化的业务规则为由拒绝了它。项目发起人要求立即返工以保护合同。开发团队坚持认为需求是按范围交付的。项目管理办公室警告说，未经正式更新的返工可能暴露治理缺口。项目经理应当怎么做?

A. Approve rework immediately to keep the client satisfied and change the baseline documentation accordingly. 立即批准返工以让客户满意，并相应更改基准文档。

B. Facilitate clarification of acceptance criteria with stakeholders and formally update the project scope documentation. 促进与利益相关方澄清验收标准，并正式更新项目范围文档。

C. Escalate the dispute to senior project management because they need to take action to avoid financial penalties. 将争议升级给高级项目管理层，因为他们需要采取行动以避免财务处罚。

D. Recommend that the project sponsor negotiate directly with the client to prevent further rejections and schedule delays. 建议项目发起人直接与客户谈判，以防止进一步的拒绝和进度延误。

答案：B

解析：范围基准与验收标准应当用来对齐各方认知，以维护范围完整性，满足治理合规要求，避免误解或未经批准的范围变更。澄清并记录需求，可使后续模块的客户验收更顺畅，并促进客户与开发团队之间的信任。与利益相关方合作定义适当的期望并正式记录，可确保共同理解和遵守治理标准。 其余选项均错误： 在不澄清标准、不了解客户的请求是否符合有效的、已文档化的范围升级的情况下进行返工，可能导致进一步的争议或遗漏需求。 升级可能没有必要，并将责任从项目经理身上转移。问题源于不明确的需求，而项目经理有能力直接解决。将责任委托给项目发起人削弱了项目经理的角色。该选项没有解决未文档化的业务规则和不明确的验收标准这一根本问题。

单选题 38/180、A nationwide auto repair chain that imports tires may experience price increases due to proposed tariffs. Stakeholders have assigned a project manager to monitor developments that could escalate this situation from a potential risk to an issue for the company. What should the project manager do?
一家进口轮胎的全国性汽车维修连锁企业，可能因拟议的关税而面临价格上涨。利益相关方指派了一位项目经理来监控可能使这种情况从潜在风险升级为公司问题的进展。项目经理应当怎么做?

A. Watch the news and trade show announcements for updates on if and when the proposed tariffs take effect. 关注新闻和贸易展会公告，了解拟议关税是否以及何时生效的最新信息。

B. Maintain contact with the appropriate authorities to monitor tariffs and plan for incremental price increases. 与相关主管部门保持联系，监控关税，并为渐进式价格上涨做好计划。

C. Monitor sales and notify stakeholders if customers defer new tire purchases due to the threat of tariffs. 监控销售情况，如果客户因关税威胁而推迟购买新轮胎，则通知利益相关方。

D. Review the project management plan and communicate with stakeholders if there are any deviations. 审查项目管理计划，如果存在任何偏差，则与利益相关方沟通。

答案：C

解析：当客户推迟购买新轮胎导致销售下降时，潜在风险就变成了问题。如果发生这种情况，项目经理应立即告知利益相关方。通过通知利益相关方，项目经理履行了在风险变成问题之前升级风险的职责。 其余选项均错误： 监控报纸和贸易展会公告，不是检测风险何时变成问题的及时或有效方式。该选项没有跟踪对公司的实际业务影响。 相信主管部门会告知来电者关税变化，不是监控风险和问题的有效方式。项目经理的职责是主动检测并升级影响组织的风险，而不仅仅是观察外部政策变化。 审查项目管理计划并就任何偏差与利益相关方沟通是错误的，因为它没有针对具体场景。它侧重于一般性项目监控，而非关税影响轮胎销售这一具体风险。

单选题 39/180、A construction company is planning a project to upgrade a major public arts facility. The CFO requires that certain infrastructure costs be capitalized, but the operations manager insists that those costs should remain operational for flexibility. The project sponsor pressures the project manager to do whatever it takes to secure faster approvals. The finance manager warns that misclassification could create compliance issues. What should the project manager do?
一家建筑公司正在规划一个升级大型公共艺术设施的项目。首席财务官要求某些基础设施成本必须资本化，但运营经理坚持认为这些成本应保持运营性以获得灵活性。项目发起人向项目经理施压，要求不惜一切代价加快审批。财务经理警告说，错误分类可能造成合规问题。项目经理应当怎么做?

A. Follow the project sponsor’ s direction and code the costs informally, ensuring quick approval from project stakeholders. 遵循项目发起人的指示，非正式地归集成本，确保项目利益相关方快速批准。

B. Work with the finance and operations managers to align classification, using accounting standards and governance rules. 与财务和运营经理合作，就成本分类达成一致，并遵循会计准则和治理规则。。

C. Split costs equally between capital and operational categories to satisfy all the stakeholders. 在资本和运营类别之间平均分配成本，以满足所有利益相关方。

D. Propose a phased approach to the project, in which infrastructure costs are allocated incrementally over time. 为项目提出分阶段方法，随时间逐步分配基础设施成本。

答案：B

解析：项目经理应编制符合会计准则和组织治理的财务报告。与财务和运营经理合作，可促进决策和治理中的合规性、准确性和透明度。 其余选项均错误： 非正式归集成本会造成合规风险。 任意分配会歪曲真实的成本基础。 分阶段方法无法解决哪些成本属于资本支出、哪些属于运营支出的问题。

单选题 40/180、A project team that has been meeting its milestones now requires a large input of resources to finish producing one of the deliverables. This development conflicts with the project's overall goal of streamlining resource use. It is not immediately clear how this part of the project got off track. What should the project team do to correct this issue?
一个一直按里程碑推进的项目团队，现在需要大量资源投入才能完成其中一个可交付成果的生产。这一情况与项目精简资源使用的总体目标相冲突。目前尚不清楚项目的这一部分是如何偏离轨道的。项目团队应如何纠正这一问题?

A. Update the vision plan to minimize the overly ambitious scope of streamlining resource use. 更新愿景计划，以弱化精简资源使用这一过于宏大的范围。

B. Revisit the history of decision-making for this deliverable to see when the overuse of resources first started. 重新审视该可交付成果的决策历史，查明资源过度使用是从何时开始的。

C. Scale back the project deliverables to better streamline resources and revise the project management plan. 缩减项目可交付成果，以更好地精简资源，并修订项目管理计划。

D. Analyze the situation and identify the root cause of the issue to determine the best solution. 分析情况，识别问题的根本原因，以确定最佳解决方案。

答案：D

解析：分解情况以识别根本原因，可为做出平衡项目目标与当前现实的明智决策提供所需的理解。 其余选项均错误： 修订愿景计划以弱化原始目标，可能损害项目的价值，而且这不是一个未经调查和广泛共识就能做出的决定。 查明资源过度使用何时开始是有帮助的，但仅凭这

一点并不能解决问题或识别根本原因。 缩减可交付成果以与原始目标保持一致，可能损害项目的整体成功，而且这不是一个未经高层批准就能做出的决定。

单选题 41/180、A team has recently adopted agile and is following a scrum model for their first major project. A conflict has emerged between the lead developer and a quality assurance team member regarding their testing approaches and definition of done criteria, which is affecting sprint velocity and team morale. The conflict is escalating and beginning to impact sprint goals. What should the project manager do to resolve this conflict?
一个团队最近采用了敏捷，并首次在大型项目中遵循 Scrum 模式。首席开发人员和质量保证团队成员之间就测试方法和完成的定义标准出现了冲突，影响了冲刺速度和团队士气。冲突正在升级，并开始影响冲刺目标。项目经理应如何解决这一冲突?

A. Facilitate individual meetings with each member to understand perspectives and guide toward resolution. 与每位成员分别进行个别会议，了解各方观点并引导其走向解决。

B. Analyze conflict causes and help members understand the impact on team performance. 分析冲突原因，帮助成员理解其对团队绩效的影响。

C. Bring team members together to facilitate problem-solving and establish acceptable agreements. 将团队成员召集到一起，促进问题解决并达成可接受的协议。

D. Schedule conflict discussion for next retrospective and work with team to create action items. 安排在下一次回顾会上讨论冲突，并与团队一起制定行动项。

答案：C

解析：在敏捷团队中有效解决冲突，需要促进冲突双方之间的直接协作。将团队成员召集到一起，可促进透明度、共同理解和协作式问题解决，同时为未来的冲刺建立更强的工作关系。其余选项均错误： 个别会议将双方分开，而非促进敏捷成功所必需的协作。 只关注根本原因分析，无助于主动解决和团队建设。 这是一个需要立即行动的冲突，拖延解决无法保护当前的冲刺目标。

单选题 42/180、A scientific research institute is diversifying into artificial intelligence and needs to launch a series of complex projects under its project management office (PMO) roadmap. The project manager has been asked to assemble a delivery team. Some executives expect the PMO to handle the workload internally, while others push for external recruitment. The project timeline is compressed, and funding is limited. What should the project manager do first?
一家科研机构正在拓展进入人工智能领域，并需要在其项目管理办公室（PMO）路线图下启动一系列复杂项目。项目经理被要求组建一支交付团队。一些高管期望 PMO 在内部处理工作量，而另一些则推动外部招聘。项目时间表被压缩，资金有限。项目经理首先应当怎么做?

A. Promote cross-PMO collaboration initiatives to strengthen innovative practices and effective knowledge-sharing. 促进跨 PMO 协作举措，以加强创新实践和有效的知识共享。

B. Develop a comprehensive resource capability plan that details required technical skills, roles, and staffing levels. 制定一份全面的资源能力计划，详细说明所需的技术技能、角色和人员配置水平。

C. Assess the current workload and confirm that the PMO has resources to deliver the project's requirements. 评估当前工作量，确认 PMO 拥有满足项目需求的资源。

D. Identify external academic and technical recruitment sources to secure additional specialized project resources. 确定外部学术和技术招聘来源，以获得额外的专业项目资源。

答案：C

解析：项目经理应首先评估工作量，确保 PMO 拥有满足项目时间表和资金要求的资源。通过评估工作量并核实资源能力，项目经理可支持有效的规划、防止资源约束，并促进及时、成功的项目交付。 其余选项均错误： 促进跨 PMO 协作不能解决项目的要求。 资源能力和容量计划有助于识别所需资源，但首先，项目经理需要评估工作量，以了解必要的要求是什么。 在完成工作量评估之前，无法有效地进行招聘。

单选题 43/180、A software team developing a new application encounters a critical technical failure that blocks progress toward a regulatory compliance milestone. The

project manager has reviewed knowledge repositories and lessons learned documents, but found no usable solution. Several stakeholders are pressuring for on-time delivery, warning that delays could trigger penalties. What should the project manager do next?
一个开发新应用的软件团队遇到了严重的技术故障，阻碍了向监管合规里程碑的推进。项目经理审查了知识库和经验教训文档，但没有找到可用的解决方案。几位利益相关方施压要求按时交付，并警告延误可能引发处罚。项目经理下一步应当怎么做？

A. Authorize a focused timeboxed technical spike to evaluate feasible fixes, compliance implications, and potential risks. 授权一个聚焦的限时技术探针，评估可行的修复方案、合规影响和潜在风险。

B. Convene subject matter experts (SMEs) through structured workshops to capture tacit knowledge and propose solutions. 通过结构化研讨会召集主题专家（SME），获取隐性知识并提出解决方案。

C. Submit a formal change request to defer milestone delivery due to schedule pressures and regulatory impacts. 提交正式变更请求，因进度压力和监管影响推迟里程碑交付。

D. Conduct a feasibility analysis to evaluate the technical aspects of the problem and its potential solution. 进行可行性分析，评估问题的技术层面及其潜在解决方案。

答案：B

解析：SME 可以提供正式文档中未捕捉到的见解。这是在压力下获取未文档化知识并解决阻塞因素最快、最可靠的方式。 其余选项效果较差： 授权聚焦的限时技术探针显示了主动性和有纪律的探索，看起来像主动缓解。然而，它仅是探索性的，有可能浪费稀缺的时间，而没有直接解决知识缺口。 提交正式变更请求遵循了适当的治理，并可以让利益相关方放心。然而，它推迟了问题。项目经理应在升级进度变更之前穷尽主动解决方案。 可行性研究确保解决方案可行且可持续，但它本身并不提供解决方案。

单选题 44/180、The project manager of a new hybrid project is assembling a specialized project team. The best candidates for team members are geographically dispersed, which could affect the project's performance. Colocation would significantly raise costs, and the company is experiencing financial limitations. What should the project manager do?
一个新型混合型项目的项目经理正在组建一支专业项目团队。最佳候选人在地理上分散，这可能影响项目的绩效。集中办公会显著提高成本，而公司正面临财务限制。项目经理应当怎么做?

A. Make sure the team can access and use virtual collaboration tools effectively. 确保团队能够有效地访问和使用虚拟协作工具。

B. Insist on bringing the team together by cutting the budget somewhere else. 坚持将团队集中在一起，通过削减其他地方的预算来实现。

C. Ask the product owner for additional funds to support colocation. 请产品负责人提供额外资金以支持集中办公。

D. Organize the work according to the locations of the team members. 根据团队成员的位置组织工作。

答案：A

解析：在团队成员地理上分散且资金有限的混合型项目中，最务实、以价值为导向的方法是实现有效的虚拟协作。提供正确的沟通和协调工具有助于在不增加成本的情况下保持绩效。这反映了良好的资源管理、适应性和与业务约束的契合。 其余选项均错误： 尽管存在明显的财务限制仍坚持集中办公是不现实的，并可能带来额外的项目风险。它也显示了忽视成本效益权衡的糟糕判断。 请求额外资金用于集中办公可能不可行或不适当。对于财务资源有限的公司来说，为一个项目进行搬迁不是最务实或最负责任的做法。 严格按照物理位置组织工作可能使团队碎片化，并降低跨职能协作。这可能意味着必须根据成员的位置，而非其资质，移除有价值、有经验的团队成员。这可能导致孤岛，并破坏混合型方法。

单选题 45/180、A financial institution has developed a new product. During final acceptance, the client rejects a deliverable and requests additional usability testing.

The quality assurance lead warns that the schedule cannot absorb this work, while the project sponsor insists the deliverable must be signed off immediately to avoid delaying contractual payments. The project management office cautions that proceeding without addressing the client's request could trigger claims against the institution and result in reputational damage. What should the project manager do?
一家金融机构开发了一款新产品。在最终验收期间，客户拒绝了一个可交付成果，并要求进行额外的可用性测试。质量保证负责人警告说，进度计划无法容纳这项工作，而项目发起人坚持要求立即签署确认该可交付成果，以避免延误合同付款。项目管理办公室告诫说，在不解决客户请求的情况下推进，可能引发对该机构的索赔，并导致声誉损害。项目经理应当怎么做?

A. Approve immediate sign-off to release payments according to the contract, and meet with the client to resolve the conflict. 批准立即签署确认，以按合同放行付款，并与客户会面解决冲突。

B. Firmly deny the client's request because requirements were already validated against the approved scope baseline. 坚决拒绝客户的请求，因为需求已经对照已批准的范围基准进行了验证。

C. Facilitate a structured review of the signed acceptance criteria and a change request for the additional testing. 促进对已签署验收标准的结构化审查，并为额外测试提交变更请求。

D. Reassign resources and authorize overtime to perform the additional usability testing as soon as possible. 重新分配资源并批准加班，以尽快进行额外的可用性测试。

答案：C

解析：这种方法保持对合同和质量标准的合规，防止潜在的索赔或声誉损害，并确保所有利益相关方在最终签署确认之前就什么构成可接受的可交付成果达成一致。 其余选项均错误： 在不解决争议的情况下放行付款，存在未来索赔的风险。 坚决拒绝忽视了客户的担忧，并加剧冲突。 重新分配资源并批准加班，将导致项目超出预算和进度限制。

单选题 46/180、A non-governmental organization (NGO) has been running a successful public health outreach initiative for the past year. The project team is managing the campaign's closure and wants to ensure that the organization is set up for future iterations of the initiative and that future campaigns can benefit from the successes and challenges of this one. What step should the project team prioritize? 一个非政府组织（NGO）过去一年一直在开展一项成功的公共卫生外联倡议。项目团队正在管理该活动的收尾，希望确保组织为倡议的未来迭代做好准备，并确保未来的活动能够受益于本活动的成功和经验教训。项目团队应优先采取哪一步？

A. Execute the transfer of deliverables and information to stakeholders to ensure the information exists in multiple places for future use. 执行向利益相关方移交可交付成果和信息，确保信息存在于多个位置以备未来使用。

B. Organize a lessons learned register to record knowledge gained during the project to improve future performance for the organization. 组织经验教训登记册，记录项目期间获得的知识，以改善组织未来的绩效。

C. Experiment with uploading documentation into artificial intelligence (AI) technology to analyze and summarize all relevant successes and challenges. 尝试将文档上传到人工智能（AI）技术中，以分析和总结所有相关的成功和经验教训。

D. Schedule a presentation to the governance board to formally report on all successes and failures for the organization’ s records. 安排向治理委员会做演示，正式报告所有成功和失败，以供组织记录。

答案：B

解析：经验教训登记册是项目的关键输出之一，应在项目期间持续更新。项目完成后，团队应举行最终回顾会，反思本次迭代的经验教训以及未来工作中改进的机会，无论是对团队本身还是对整个组织。在信息管理系统中正式记录这些知识，可确保所有经验教训都能供未来的项目团队使用，无论当前团队成员是否参与。 其余选项均错误： 维护项目知识以供未来迭代使用不是利益相关方的责任。尽管与利益相关方共享任何信息总体上可能有益，但这并不能保证信息在未来的活动中随时可用。下一次活动可能涉及不同的利益相关方，如果没有正式的系统来记录信息，未来的团队可能无法访问这些信息。成功的项目收尾需要为未来项目的成功做好准

备。 AI 可以是总结信息和将经验教训汇编成简洁文档的有用工具，但与任何工具一样，它也有局限性，需要人工审阅以确保捕捉到所有相关数据。此外，项目团队必须为该工具生成的任何信息建立存储库，以确保未来的团队能够访问。AI 可用于辅助记录经验教训，但仅靠它本身是无效的。 治理委员会不负责项目收尾。向治理委员会呈现经验教训和其他相关数据可能是结束项目的重要一步，但它不能保证这些信息会被系统化记录并存储以供未来迭代使用。任何呈现给治理委员会的内容，也应汇编到经验教训登记册中，并记录在信息管理系统中，以便向未来的团队提供。

单选题 47/180、A project team is assembled to create a new line of household electronics. In a highly competitive industry, the team must ensure that every stakeholder understands the project objectives and what sets their product apart from the competition. What should the project manager do?
一个项目团队被组建起来，打造一条新的家用电子产品产品线。在竞争激烈的行业中，团队必须确保每位利益相关方都理解项目目标，以及是什么让他们的产品在竞争中脱颖而出。项目经理应当怎么做?

A. Use a vision statement to describe the project team’ s objectives and stakeholders’ expectations. 使用愿景声明来描述项目团队的目标和利益相关方的期望。

B. Demonstrate the value of the project's vision by creating a prototype with industry experts. 与行业专家一起创建原型，以展示项目愿景的价值。

C. Schedule regular meetings with organizational leaders to ensure the project’ s vision is aligned with the organization's mission. 安排与组织领导者的定期会议，确保项目愿景与组织使命保持一致。

D. Implement a self-governance approach so all stakeholders feel a shared ownership of the project’ s vision and outcomes. 实施自我治理方法，使所有利益相关方都能感受到对项目愿景和成果的共同所有权。

答案：A

解析：愿景声明是对项目期望及其与市场上其他项目差异化特征的高度概括性描述。愿景声明可以成为适应型项目章程的基础，项目团队可以用它来指导团队并确保利益相关方之间达成一致，同时仍提供适应性和灵活性。 其余选项均错误： 与行业专家一起创建原型，不一定会解决利益相关方理解项目目标或项目如何与竞争对手区分的问题。 虽然确保项目与组织的使命和愿景保持一致很重要，但其他非组织领导者的利益相关方也应了解项目的愿景和目标，即使他们不参加这些对齐会议。 无论项目经理对项目团队的工作采用哪种治理方法，都必须为项目团队和利益相关方提供正式的文档以供参考，以确保每个人都保持一致，并看到项目愿景的价值。

单选题 48/180、A project manager is drafting a governance framework that will enhance the project's efficiency and effectiveness. The project manager wants to start with all existing resources, structured frameworks, or other useful information that might be available. What should the project manager do?
一位项目经理正在起草一份治理框架，以提高项目的效率和有效性。项目经理希望从所有现有的资源、结构化框架或其他可能有用的信息开始。项目经理应当怎么做?

A. Investigate regulatory agency standards related to this type of project. 调查与这类项目相关的监管机构标准。

B. Review academic research, such as industry studies, on the project’ s topic. 审查关于项目主题的学术研究，例如行业研究。

C. Refer to the organizational process assets (OPAs) from similar projects. 参考类似项目的组织过程资产（OPA）。

D. Incorporate information technology tools such as scheduling software. 纳入信息技术工具，例如进度计划软件。

答案：C

解析：组织过程资产，包括从先前内部项目获得的工件、实践或知识，可以成为治理新项目的宝贵输入。通过审查已完成的项目进度计划和经验教训等文档，项目经理很可能找到有助于指导新项目的有用信息。 其余选项均错误： 根据项目的性质，调查监管标准可能是适当的。然

而，由于这些标准不受团队的直接控制，它们被归类为事业环境因素，而非组织过程资产。与监管机构标准一样，学术研究可能为团队提供有用的输入，但它们属于事业环境因素，而非组织过程资产。 项目可能受益于纳入信息技术工具，例如进度计划软件。然而，即使组织拥有的工具也不受团队的直接控制，因此它们被归类为事业环境因素，而非组织过程资产。

单选题 49/180、A project team has identified improvements in processes and scheduling practices during execution, and they have also discovered that some existing organizational policies are ambiguous and are causing repeated confusion across multiple projects. The project manager has been asked to address the policy gap before the lessons are entered into the organizational knowledge system so future teams can work with clearer guidance. Because policy changes require broader organizational approval, the project manager must begin the formal policy update effort. What should the project manager do first?
一个项目团队在执行期间识别出流程和进度安排实践的改进，他们还发现一些现有的组织政策模糊不清，并在多个项目中造成反复的困惑。项目经理被要求在经验教训录入组织知识系统之前解决政策缺口，以便未来的团队能够在更清晰的指导下工作。由于政策变更需要更广泛的组织批准，项目经理必须启动正式的政策更新工作。项目经理首先应当怎么做?

A. Add the current project's information to the organization's knowledge repository. 将当前项目的信息添加到组织的知识库中。

B. Review and initiate updates to the existing policy to address the identified ambiguity. 审查现有政策并启动更新，以解决已识别的模糊性。

C. Update the project management plan to incorporate the most current information. 更新项目管理计划，纳入最新的信息。

D. Create a detailed lessons learned document to help guide future project planning. 创建详细的经验教训文档，以帮助指导未来的项目规划。

答案：B

解析：项目经理被要求在经验教训录入组织知识系统之前解决政策缺口。这使得政策问题成为当务之急。由于该模糊性影响多个项目，该问题不仅是项目层面的经验教训，更是组织治理问题。第一步是启动正式的政策更新工作，以便通过适当的批准路径解决根本原因。 其余选项均错误： 场景明确说明，必须在经验教训录入组织知识系统之前解决政策缺口。在政策问题正式启动并澄清之后，再向知识库添加信息才是适当的。 项目管理计划适用于当前项目，而所描述的问题更广泛，影响多个项目。更新该计划可能帮助该团队在短期内更有效地运作，但它不能解决组织政策的模糊性。 经验教训支持未来的知识共享，但问题要求在将其添加到组织知识系统之前解决政策缺口。当务之急是启动对模糊政策的纠正，以便未来的指导清晰且得到正式支持。

单选题 50/180、A project manager is overseeing the development of a new software application. The project is halfway through its timeline when the project manager receives a financial report that indicates the project is over budget. Recently, the client expressed concerns about the project's progress and the quality of deliverables. What should the project manager do?
一位项目经理正在监督一款新软件应用的开发。项目进行到时间表的一半时，项目经理收到一份财务报告，显示项目超出预算。最近，客户对项目进展和可交付成果的质量表达了担忧。项目经理应当怎么做?

A. Undertake a reconciliation process to address the discrepancies and concerns. 进行对账流程，以解决差异和担忧。

B. Submit a change request through project governance to increase the budget. 通过项目治理提交变更请求，以增加预算。

C. Meet with the client to discuss the concerns and the steps taken to address them. 与客户会面，讨论这些担忧以及为解决它们所采取的步骤。

D. Perform a risk assessment and update the risk response planning document. 进行风险评估，并更新风险应对规划文档。

答案：A

解析：开展项目对账可确保财务和项目数据准确一致。该流程涉及比较计划数据与实际数据，以识别差异并进行必要的调整。 其余选项均错误： 在超支原因未知之前，要求增加预算为时过早。 在未首先核对差异的情况下，没有必要与客户会面讨论担忧。 进行风险评估并更新风险应对规划文档不切实际，也没有必要。

单选题 51/180、A university plans to build a new performing arts center on campus. The project manager has identified the financial requirements for executing a high-visibility, high-cost project. After announcing the plans, the university was impacted by budget cuts. The project manager needs to confirm there is enough budget to complete the project successfully. What strategy should the project manager adopt in this scenario?
一所大学计划在校园内新建一座表演艺术中心。项目经理已经确定了执行这个高知名度、高成本项目的财务需求。宣布计划后，大学受到预算削减的影响。项目经理需要确认有足够的预算来成功完成项目。在这种情况下，项目经理应采用什么策略?

A. Adopt a fixed budget approach to apply internally owned assets, ensuring all oversight and funding stays within the organization. 采用固定预算方法，使用内部自有资产，确保所有监督和资金都留在组织内部。

B. Begin a crowdfunding campaign that capitalizes on community interest to generate engagement and raise funds from within the community. 发起众筹活动，利用社区兴趣产生参与度，并从社区内部筹集资金。

C. Adopt a lump sum approach to reallocate the entirety of the project’s budget and reserves, ensuring the funds go exactly where intended. 采用一次性总付方法，重新分配项目的全部预算和储备，确保资金准确流向预期用途。

D. Engage high net-worth individuals and institutional investors and offer naming rights or long-term ownership in exchange for their investment. 吸引高净值个人和机构投资者，并以其投资换取冠名权或长期所有权。

答案：D

解析：引入外部投资者，例如高净值个人或组织，是为如此雄心勃勃的项目获得所需的大量资金并确保充足财务缓冲的有效方式。愿意为创新项目提供资金的投资者，往往以投资换取对长期所有权或运营权的担保利益。 其余选项均错误： 将内部自有资产和由固定年度部门预算资助的员工应用于如此雄心勃勃的项目，将使组织在施工过程中可能被视为必要的其他项目缺乏资金。项目团队应至少从外部来源获得部分资金，以确保组织有预算覆盖其他必要的举措。 如果无法引起足够的社区兴趣，众筹存在预算不足的风险。众筹有助于补充雄心勃勃的项目，例如向大学校友发出呼吁，但设计和施工项目缺乏灵活性，这意味着项目团队需要更稳定的资金来源才能开始开发。 一次性总付方法不会为不可预见的成本留下足够的储备。在项目开始时分配所有资金，而非在项目的各个阶段按需分期发放资金，使项目面临资金管理不善的风险，并且缺乏在挑战出现时重新分配资源所需的灵活性。

单选题 52/180、An organization that advocates for senior citizens is planning a new project. A previous project resulted in some issues that the organization cannot afford to repeat. The stakeholders have tasked the project manager with identifying ways to prevent these issues from occurring again. What should the project manager do?
一个倡导老年人权益的组织正在规划一个新项目。之前的项目导致了一些该组织无法承受再次发生的问题。利益相关方已委托项目经理识别防止这些问题再次发生的方法。项目经理应当怎么做?

A. Draft a risk assessment to assess the probability of risks and their potential impact on project outcomes. 起草风险评估，评估风险的概率及其对项目成果的潜在影响。

B. Interview stakeholders involved in the previous project to gather their feedback on the causes of the project risks. 采访参与之前项目的利益相关方，收集他们对项目风险原因的反馈。

C. Design a risk matrix that links the project requirements to the deliverables to identify and minimize risks. 设计一个将项目需求与可交付成果联系起来的风险矩阵，以识别并最小化风险。

D. Use historical information to identify patterns and trends that can inform the current project's risk assessment. 使用历史信息识别可以为当前项目风险评估提供信息的模式和趋势。

答案：D

解析：利用过去项目的历史信息和经验教训，有助于识别反复出现的问题、趋势或模式，从而为风险管理流程提供信息。历史数据为制定预防策略提供了坚实基础，并有助于确保同样的问题不会再次发生。 其余选项均错误： 起草风险评估是为整体潜在未来问题做预期和准备的主动努力。防止障碍是采取行动消除已经发生或极有可能发生的问题。 采访基于个人意见，可能有偏见、不完整或不一致。它们可能有助于加深理解，但不应作为识别可重复障碍的主要来源。 风险矩阵或评估等工具是在障碍被识别之后使用的。在这个早期阶段，重点应放在收集和分析相关数据上，而非对障碍进行优先级排序或应对。

单选题 53/180、A project manager is assigned to a project that is transitioning the organization to adopt agile principles. The project scope definition is in progress, but the project team wants to have a less formal definition. What should the project manager do first?
一位项目经理被指派负责一个让组织过渡到采用敏捷原则的项目。项目范围定义正在进行中，但项目团队希望采用不太正式的定义。项目经理首先应当怎么做?

A. Review the scope, identify desired deliverables, and create contingency plans for risks. 审查范围，识别期望的可交付成果，并为风险制定应急计划。

B. Organize a workshop with the product owner and team to create the backlog and acceptance criteria. 与产品负责人和团队组织一场研讨会，创建待办事项列表和验收标准。

C. Create a communications website to share the scope definition and product backlog with the team. 创建一个沟通网站，与团队共享范围定义和产品待办事项列表。

D. Meet with the project team to identify the mandatory project requirements and deliverables. 与项目团队会面，识别强制性的项目需求和可交付成果。

答案：B

解析：在敏捷转型中，与产品负责人和团队举行的协作研讨会对于创建产品待办事项列表和验收标准至关重要。这种方法支持团队对不太正式的范围定义的偏好，同时建立项目成功所需的结构化敏捷工件。 其余选项均错误： 审查范围、识别期望的可交付成果并制定应急计划，符合传统的范围和风险管理方法，而非敏捷实践。 创建沟通网站侧重于沟通工具，而没有解决协作式范围定义流程。 识别强制性的项目需求和可交付成果，强调强制性需求，这与敏捷的适应性范围管理原则相矛盾。

单选题 54/180、A project manager is leading a construction project, 40% through execution. The sponsor requests confirmation that key stakeholders remain sufficiently engaged to support project success. Early indications suggest some stakeholders' interest and influence may be shifting due to external factors and competing priorities. How should the project manager best assess stakeholder engagement now?
一位项目经理正在领导一个建筑项目，执行进度已达 40%。发起人要求确认关键利益相关方是否仍保持足够参与以支持项目成功。早期迹象表明，由于外部因素和相互竞争的优先事项，一些利益相关方的利益和影响力可能正在发生变化。项目经理现在应如何最好地评估利益相关方参与情况?

A. Review and update the communications plan to reflect stakeholder needs and engagement strategies. 审查并更新沟通计划，以反映利益相关方的需求和参与策略。

B. Analyze the latest issue log and risk register to identify unresolved problems or emerging stakeholder risks. 分析最新的问题日志和风险登记册，以识别未解决的问题或新兴的利益相关方风险。

C. Collect feedback through interviews or surveys with key stakeholders to gauge commitment and perceptions. 通过对关键利益相关方的访谈或调查收集反馈，以衡量承诺和看法。

D. Review the stakeholder engagement matrix, analyzing engagement levels against planned metrics. 审查利益相关方参与矩阵，对照计划指标分析参与水平。

答案：D

解析：这提供了当前利益相关方参与情况与计划指标的、结构化的客观比较。这使项目经理能够准确识别参与方面的任何差距或变化，从而实现有针对性的行动和有效的利益相关方管理。其余选项均错误： 更新沟通计划很重要，但它应在正确评估利益相关方参与水平之后进行。它是后续行动，而非评估方法。 分析问题日志和风险登记册可以突出与利益相关方相关的问题或风险，但它不能直接衡量或评估当前的参与水平。 通过访谈或调查收集反馈可提供有用的定性见解，但如果没有正式的、可比较的框架，评估可能是主观和不完整的。

单选题 55/180、A project manager at a large construction firm has been overseeing the development of a new subdivision. The financial manager is concerned that the project might be at risk of exceeding its budget and has asked the project manager about the project's financial reserves. How should the project manager respond?
一家大型建筑公司的项目经理一直在监督一个新住宅小区的开发。财务经理担心项目可能面临超出预算的风险，并向项目经理询问项目的财务储备情况。项目经理应如何回应?

A. Examine the risk breakdown structure (RBS) to determine whether conditions constitute a budgetary risk and whether reserves can cover the risk. 检查风险分解结构（RBS），确定这些情况是否构成预算风险，以及储备能否覆盖该风险。

B. Execute a sensitivity analysis to determine which project risks or sources of uncertainty have the most potential impact on the remaining budget. 执行敏感性分析，确定哪些项目风险或不确定性来源对剩余预算的潜在影响最大。

C. Use cost forecasts to determine whether the project is within defined tolerance ranges for budget and submit any necessary change requests. 使用成本预测确定项目是否在预算的既定公差范围内，并提交任何必要的变更请求。

D. Use a simulation to model the potential impact current challenges will have on the outcome of the project and the state of its reserves. 使用模拟来建模当前挑战对项目结果及其储备状态的潜在影响。

答案：C

解析：通过分析项目的过往绩效，项目经理可以对项目当前对财务储备构成的风险水平做出合理预测，并识别需要提交的任何变更请求，以使项目保持在既定公差范围内。这还可以为项目团队提供计算出的完工估算值，以供记录并呈现给相关利益相关方。 其余选项均错误： RBS 用于对潜在风险来源进行分类，本身不能用于管理财务储备。RBS 是潜在风险来源的层级表示，在识别风险或对已识别风险进行分类时很有帮助。RBS 可以帮助项目团队了解项目可能遇到的风险，这有助于管理财务储备，但本身不能提供充分的成本预测。 敏感性分析有助于确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目结果（包括维持项目预算）构成的威胁最大，但它本身不能促进财务储备的管理。 模拟模型涉及使用不同的活动假设、约束、风险、问题或情景组合计算多个工作包持续时间，以对可能的结果进行建模。模拟可以提供重要信息，指导项目经理确定是否需要变更请求来调整进度计划，但应执行成本预测以了解对财务储备的影响。

单选题 56/180、The sponsor directs the project manager to use performance data collected over several months to establish a culture of continuous improvement. The project manager is tasked with identifying weaknesses, testing solutions, and sustaining improvements across project processes. What should the project manager do?
发起人指示项目经理使用数月来收集的绩效数据，建立持续改进的文化。项目经理的任务是识别弱点、测试解决方案，并在项目流程中维持改进。项目经理应当怎么做?

A. Define specific, measurable, achievable, relevant, time-bound (SMART) objectives linked to deliverables to measure improvement. 定义与可交付成果相关的具体、可衡量、可实现、相关、有时限（SMART）目标，以衡量改进。

B. Integrate the plan-do-check-act (PDCA) cycle into workflows to embed continuous project improvement. 将计划-执行-检查-处理（PDCA）循环整合到工作流程中，以嵌入持续的项目改进。

C. Conduct benchmarking by comparing project outcomes with standard industry practices to identify areas for improvement. 通过将项目结果与标准行业实践进行比较来进行标杆对照，以识别需要改进的领域。

D. Perform root cause analysis when recurring deviations or variances appear for continuous improvement. 当反复出现的偏差或差异出现时，执行根本原因分析以实现持续改进。

答案：B

解析：一个反馈丰富、定期传达频繁的基于数据的信息的文化，有助于标准化改进，并确保有效更新以取得成功的项目成果。PDCA 循环使改进制度化，符合发起人的要求。 计划：识别弱点并制定改进计划。 执行：测试解决方案并实施变更。 检查：通过分析绩效数据来监控和评估变更的影响。 处理：维持改进并标准化成功的实践。这种方法是动态的，将持续改进直接嵌入工作流程，使其成为按发起人指示实现持续改进的理想选择。 其余选项均错误： 虽然使用 SMART 目标对于设定清晰的基准很重要，但该选项侧重于定义可衡量的目标，而非实现持续改进的实际过程。 标杆对照是有用的工具，但它更侧重于外部比较，而非使用从项目中收集的内部绩效数据。 根本原因分析是被动解决问题；它不是持续的框架。根本原因分析是识别特定问题根本原因的绝佳工具，但它是反应性的（在偏差反复出现后使用），而非主动性的。

单选题 57/180、A pharmaceutical company has launched a research and development project. Project stakeholders have tasked the project manager with promoting a risk-aware culture to ensure project objectives are met. In response, the project manager prepared a risk register and assigned risk owners. What should the project manager do next?
一家制药公司启动了一个研发项目。项目利益相关方委托项目经理促进风险意识文化，以确保项目目标得以实现。作为回应，项目经理准备了风险登记册并指定了风险责任人。项目经理下一步应当怎么做?

A. Implement a change control system to manage how modifications from risk mitigation are delivered and documented. 实施变更控制系统，以管理风险缓解所产生的修改如何被交付和记录。

B. Create a most likely duration scenario to assess the most probable mitigation activity, accounting for all known risks. 创建最可能工期情景，以评估最可能的缓解活动，并考虑所有已知风险。

C. Develop ongoing processes to identify, prioritize, monitor, and address risks throughout the project's entire life cycle. 制定持续流程，在整个项目生命周期中识别、排序、监控和处理风险。

D. Focus on operational resilience so the project can continue to deliver services and functions despite disruptions from realized risks. 专注于运营韧性，使项目能够在已实现风险造成的干扰中继续交付服务和功能。

答案：C

解析：通过制定持续的、结构化的风险识别、排序、监控和应对流程，项目团队使风险意识成为项目开展和管理方式中固有的一部分。这种主动方法最大限度地减少干扰，并建立韧性、问责制、信任和风险意识文化。 其余选项效果较差，因为它们不能专门控制和管理项目风险，也不能促进风险意识文化。 变更控制系统是一套程序，定义如何管理和控制对项目可交付成果和文档的修改。 工期情景是对最可能的活动工期所做的估算，考虑了所有已知的项目变量。运营韧性是一个组织在干扰期间继续交付服务和功能的能力。

单选题 58/180、A project is midway through execution when the project manager learns of a newly introduced organizational process that could potentially enhance efficiency and quality. What should the project manager do?
一个项目在执行进行到一半时，项目经理得知一项新引入的组织流程可能提高效率和质量。项目经理应当怎么做?

A. Evaluate a strategy for integrating the new process into the current project management plan. 评估将新流程整合到当前项目管理计划中的策略。

B. Issue a directive to implement the new process immediately, prioritizing it over current planned activities. 发布指令立即实施新流程，将其置于当前计划活动之上。

C. Analyze the expected benefits of the new process and compare them against potential risks. 分析新流程的预期收益，并将其与潜在风险进行比较。

D. Update the requirements documentation to include the new process without delay to maintain progress. 立即更新需求文档以纳入新流程，以保持进展。

答案：C

解析：评估预期收益与潜在风险，是决定是否应推进变更的关键第一步。这确保在启动变更之前，决策基于证据并与项目目标保持一致。当项目已在进展中时尤其如此。 其余选项均错误：整合策略应在新流程确定会使当前项目受益之后再考虑。 发布立即执行的指令绕过了所需的分析和批准步骤，增加了对成本、进度或质量产生意外影响的可能性。 未经事先评估或批准就更新需求，违反了变更控制流程，并有可能引入未经批准的范围变更。

单选题 59/180、A project manager is preparing a weekly status report. The data they have compiled shows that they have spent 20,000sofar.Asoftoday,theyhavecompleted12,000 worth of work, exceeding the original plan to complete $10,000 worth of work by this date. How should the project manager report the schedule variance?
一位项目经理正在准备每周状态报告。他们汇总的数据显示，迄今为止已花费 20,000 美元。截至今天，他们已完成价值 12,000 美元的工作，超过了原计划到该日期完成价值 10,000 美元的工作。项目经理应如何报告进度偏差?

A. The schedule variance is −$2,000. 进度偏差为−2,000 美元。

B. The schedule variance is −$8,000. 进度偏差为−8,000 美元。

C. The schedule variance is $10,000. 进度偏差为 10,000 美元。

D. The schedule variance is $2,000. 进度偏差为 2,000 美元。

答案：D

解析：进度偏差是衡量进度绩效的指标，表示为挣值（EV）与计划价值（PV）之间的差值。SV = EV − PV PV = 10,000 美元 EV = 12,000 美元 12,000 美元 − 10,000 美元 = 2,000 美

元 项目进度超前（正偏差），因为完成的工作比计划的多。实际成本（AC）不用于进度偏差的计算。 其余选项均错误，因为它们没有基于相关公式和数字准确表示真实的进度偏差。

单选题 60/180、A company is implementing a new computerized system. During project execution, the leader of a department that is critical to project completion raises a concern that the department's requirements are completely missing from the approved project management plan. What should the project manager have done to avoid this issue?
一家公司正在实施一个新的计算机化系统。在项目执行期间，一个对项目完成至关重要的部门的负责人提出担忧：该部门的需求完全没有包含在已批准的项目管理计划中。项目经理本应怎么做才能避免这个问题?

A. Managed the expectations of all relevant stakeholders. 管理所有相关利益相关方的期望。

B. Involved all relevant stakeholders in the project planning. 让所有相关利益相关方参与项目规划。

C. Sought expert judgment in the project scope design. 在项目范围设计中寻求专家判断。

D. Developed a change management plan to approve changes. 制定变更管理计划以批准变更。

答案：B

解析：项目经理应让相关利益相关方参与项目规划。该部门的负责人担心需求完全没有包含在已批准的项目管理计划中。部门负责人是利益相关方，他们本应被纳入项目规划活动。如果已批准的项目管理计划不包含所有利益相关方的需求，那么项目经理就没有在项目规划流程中充分让所有相关利益相关方参与。如果部门负责人参与了项目规划流程，团队就会清楚了解他们的需求以及如何让他们参与。 其余选项均错误： 管理利益相关方期望是错误的，因为需求完全缺失。部门负责人有理由期望本部门的需求得到满足并记录在已批准的项目管理计划中。
在项目范围设计中寻求专家判断是错误的。如果部门负责人没有被纳入项目规划活动，在项目

范围设计中寻求专家判断无法解决需求缺失的问题。 制定变更管理计划是错误的，因为项目经理直到部门负责人表达担忧后才意识到这个问题。

单选题 61/180、A university launches a new LMS, leading to faculty confusion and student complaints about assignment submissions. The vendor recommends more training, and the university president requests an action plan to fix issues before wider rollout. What should the project manager do?
一所大学推出了一个新的学习管理系统（LMS），导致教师困惑和学生抱怨作业提交问题。供应商建议进行更多培训，大学校长要求制定行动计划，在更大范围推广之前解决问题。项目经理应当怎么做?

A. Request that the expansion be delayed until the vendor releases a major system upgrade. 要求推迟扩展，直到供应商发布重大系统升级。

B. Assign individual complaint management to each department in order to enable the team to focus on future project phases. 将个别投诉管理分配给每个部门，以使团队能够专注于未来的项目阶段。

C. Send a communication to all users reminding them to follow the system user guide and FAQs. 向所有用户发送沟通信息，提醒他们遵循系统用户指南和常见问题解答（FAQ）。

D. Categorize the reported problems as issues, assess their impact, and prioritize them for resolution with the vendor and internal teams. 将报告的问题归类为问题（issues），评估其影响，并与供应商和内部团队一起对其进行排序以解决。

答案：D

解析：LMS 已经以某种形式推出，用户（教师和学生）正在遇到问题。这些不是假设性的风险；它们是当前的问题，因此必须将其作为问题处理，记入问题日志、进行分析并排序，从而能够集中解决并制定可靠的稳定化计划。 其余选项均错误： 没有证据表明未来的升级会解决当前的问题，而且它忽略了系统性地理解和处理问题的需要。 将投诉处理推给部门，而非在项目层面集中管理问题，会使应对措施碎片化，使识别模式和根本原因更加困难，并且无法解决底层的系统或流程问题。 沟通和培训可能是解决方案的一部分，但在没有首先了解出错原

因的情况下发送提醒是肤浅且无效的。该选项没有解决根本问题，也没有提供管理这些问题的必要结构。

单选题 62/180、During a daily coordination meeting, the project manager displays a table that the team developed using three-point estimates for critical path activities. A key stakeholder insists on using the optimistic estimates to shorten the overall schedule, but the risk manager argues that excluding pessimistic values will make the contingency reserve meaningless. The project sponsor is worried that inflated estimates could delay project approval. What should the project manager do? (Refer to the table)
在一次每日协调会议上，项目经理展示了一个团队使用三点估算为关键路径活动制作的表格。一位关键利益相关方坚持使用乐观估算来缩短总体进度计划，但风险经理认为排除悲观值会使应急储备失去意义。项目发起人担心膨胀的估算可能延误项目批准。项目经理应当怎么做？（参考表格）

活动	乐观工期（天）	最可能工期（天）	悲观工期（天）
A	4	8	12
B	5	7	8
C	10	11	14
D	3	6	9
E	4	5	8

A. Develop the baseline using only the optimistic estimates to satisfy stakeholders and secure early approval. 仅使用乐观估算制定基准，以满足利益相关方并获得早期批准。

B. Select the most likely values as the baseline and document optimistic and pessimistic values separately. 选择最可能值作为基准，并单独记录乐观值和悲观值。

C. Apply the program evaluation review technique (PERT) formula to integrate all three estimates and justify a balanced, data-driven schedule. 应用计划评审技术（PERT）公式整合所有三个估算，并论证一个均衡的、数据驱动的进度计划。

D. Escalate the disagreement to the steering committee and ask them to provide guidance on which estimate to use for project planning activities. 将分歧上报给指导委员会，请他们就项目规划活动应使用哪种估算提供指导。

E. = (O + 4ML + P) / 6 其余选项均错误： 仅基于乐观估算进行规划，会歪曲风险并损害可信度。 单独使用最可能值，未充分利用数据范围，并削弱风险分析。 上报为时过早。项目经理有责任准备一个有依据的进度基准。

答案：C

解析：项目经理应使用 PERT，PERT 方程是一种通过纳入不确定性来估算项目任务持续时间的公式。它依赖于三个时间估算的加权平均值，反映活动持续时间的不同潜在情景： 乐观（O）：在理想条件下完成任务所需的最短时间。 最可能（ML）：完成任务最可能或最现实的时间。 悲观（P）：如果一切出错所需的最长时间。 用于计算期望时间（E）的 PERT 公式为：

单选题 63/180、A stakeholder requests that the project manager provide a clear timeline for project completion. At the end of the second sprint, the project manager shares a status table. The agile team lead reports to the project manager that multiple backlog items remain, all roughly equal in size, and notes that the team’s average velocity is 10 backlog items per two-week sprint. The stakeholder is requesting an exact date, but the agile team lead reminds the project manager that forecasts should be communicated as approximations rather than single-point estimates. What should the project manager communicate to the stakeholder? (Refer to the table)
一位利益相关方要求项目经理提供项目完成的明确时间表。在第二个冲刺结束时，项目经理分享了一个状态表格。敏捷团队负责人向项目经理报告说，多个待办事项列表项仍然存在，大小大致相同，并指出团队的平均速度是每两周冲刺 10 个待办事项列表项。利益相关方要求一个

确切的日期，但敏捷团队负责人提醒项目经理，预测应作为近似值传达，而非单点估算。项目经理应向利益相关方传达什么？（参考表格）

功能	A	B	C	D	E
待办事项	24	18	9	14	25
故事点	5	5	10	10	5

A. The project will finish in about 9 weeks. 项目将在大约 9 周内完成。

B. The project will finish in about 10 weeks. 项目将在大约 10 周内完成。

C. The project will finish in about 18 weeks. 项目将在大约 18 周内完成。

D. The project will finish in about 20 weeks. 项目将在大约 20 周内完成。

答案：C

解析：啊啊啊啊啊啊

单选题 64/180、A government agency is implementing a citizen services portal. During user acceptance testing, the cybersecurity team warns that the authentication design may be vulnerable to credential stuffing, rated medium likelihood and high impact. The vendor says changes need extra funding, and the sponsor is worried about missing the promised launch window. What should the project manager do next?
一个政府机构正在实施公民服务门户。在用户验收测试期间，网络安全团队警告说，认证设计可能容易遭受撞库攻击，被评为中等可能性、高影响。供应商表示变更需要额外资金，而发起人担心错过承诺的上线窗口。项目经理下一步应当怎么做？

A. Proceed with the current design and plan to upgrade security later. 继续使用当前设计，并计划稍后升级安全性。

B. Work with cybersecurity and the vendor to provide a risk-based recommendation. 与网络安全团队和供应商合作，提供基于风险的推荐方案。

C. Immediately halt the project until the highest level of security is implemented. 立即停止项目，直到实施最高级别的安全性。

D. Ask cybersecurity to downgrade the risk rating so the project can launch on time. 要求网络安全团队降低风险评级，以便项目按时上线。

答案：B

解析：与专家合作制定并呈现实用的风险应对选项，可实现平衡安全性、成本和进度的知情决策。 其余选项均错误： 继续使用当前设计，忽略了已知的高影响风险，并在没有结构化决策的情况下推迟缓解措施。 立即停止项目反应过度，在未首先确定相称的应对选项和权衡的情况下冻结所有工作。 要求网络安全团队降低风险评级，是为了进度便利而不当施压控制职能更改风险评级，破坏了风险治理。

单选题 65/180、A project manager is forming a new team. All members have worked together before, and one team member has a history of regularly challenging organizational processes and decisions. The project is about to begin, and the project manager wants to ensure alignment and smooth collaboration from the start. What should the project manager do first?
一位项目经理正在组建一个新团队。所有成员以前都一起工作过，其中一名团队成员有经常质疑组织流程和决策的历史。项目即将开始，项目经理希望从一开始就确保步调一致和顺畅协作。项目经理首先应当怎么做?

A. Facilitate a team discussion to review organizational process assets (OPAs) and agree on ground rules. 推动团队讨论，审查组织过程资产（OPA），并就基本规则达成一致。

B. Use predefined corporate guidelines to establish team conduct expectations. 使用预定义的公司准则来建立团队行为期望。

C. Request reassignment of the disruptive team member and secure a replacement before project initiation. 要求重新调配这名具有破坏性的团队成员，并在项目启动前找到替代人选。

D. Conduct a project kickoff meeting to review the project management plan. 召开项目启动会议，审查项目管理计划。

答案：A

解析：在项目开始时，尤其是在存在已知行为风险的情况下，项目经理应采取主动措施设定期望并使团队保持一致。围绕组织过程资产（OPA）推动讨论并就团队基本规则达成一致，可建立相互理解和认同。这种方法反映了强大的领导力、利益相关方意识和情商，这些是团队组建的关键要素。 其余选项均错误： 虽然组织准则是有所帮助的，但仅在不涉及团队的情况下应用它们，可能导致抵触——尤其是来自以质疑流程而闻名的人。团队必须参与达成一致的过程，以确保认同。 在给予公平机会之前移除团队成员，与服务型领导相矛盾，并削弱心理安全。这是在未尝试解决的情况下过早升级。 启动会议很有用，但审查项目计划不能解决行为风险或团队规范。基本规则和团队凝聚力必须单独、有意识地建立。

单选题 66/180、A project manager is requesting a lessons learned analysis from a recently concluded project. The project manager is looking for insight into how documenting lessons can benefit the company’ s goal to improve future project outcomes. What should the project manager do?
一位项目经理正在要求对最近结束的项目进行经验教训分析。项目经理希望了解记录经验教训如何有益于公司改进未来项目成果的目标。项目经理应当怎么做?

A. Integrate the findings into project plans to ensure that valuable insights are incorporated into upcoming projects and stages. 将发现整合到项目计划中，确保有价值的见解被纳入即将开展的项目和阶段。

B. Review the archive in the project management information system for details about past risk management and mitigation efforts. 在项目管理信息系统中审查档案，了解过去风险管理和缓解工作的细节。

C. Interview the relevant stakeholders to understand their concerns and use their feedback to refine the scope of new projects. 采访相关利益相关方以了解他们的担忧，并利用他们的反馈来细化新项目的范围。

D. Organize a session with the appropriate team members to review videos of phases where the team encountered documented issues. 与适当的团队成员组织一场会议，回顾团队遇到已记录问题的阶段的视频。

答案：A

解析：将经验教训的发现整合到项目计划中，可确保有价值的见解不仅被记录下来，还能为未来的项目和阶段提供信息。记录和分享经验教训可以防止重蹈覆辙、复制成功，并推动持续的积极变革，从而改进项目成果。 其余选项均错误： 在项目管理信息系统中审查风险沟通档案，可以核实共享了什么以及何时共享，但它不能衡量项目时间线上的风险行为、经验教训或演变。采访利益相关方以了解他们的担忧很重要，但细化项目范围是不同于利用经验教训改进成果的另一个流程。 视频会议可以在项目阶段之后进行，以便向所有团队成员提供及时的反馈。关键目标仍然需要经验教训的益处来改进成果。

单选题 67/180、A collocated project team is facing communication issues. Some team members work early shifts (6 a.m. to 2 p.m.), others standard hours (9 a.m. to 5 p.m.), and a few work late (12 p.m. to 8 p.m.) due to client support requirements. Weekly team meetings scheduled at 3 p.m. consistently miss 40% of participants. The early shift team makes crucial technical decisions without late shift input, while the late shift finds integration issues the next morning. What should the project manager prioritize?
一个集中办公的项目团队正面临沟通问题。部分团队成员上早班（上午 6 点至下午 2 点），其他成员按标准时间工作（上午 9 点至下午 5 点），还有少数成员因客户支持需求上晚班（中午 12 点至晚上 8 点）。每周安排在下午 3 点的团队会议始终有 40% 的参与者缺席。早班团队在无晚班成员参与的情况下做出关键技术决策，而晚班成员次日早上才发现集成问题。项目经理应优先做什么?

A. Encourage team members to work standard business hours for better collaboration. 鼓励团队成员按照标准工作时间工作，以加强协作。

B. Schedule team meetings during the 2-hour overlap period with mandatory attendance. 在 2 小时重叠时段安排团队会议，并要求强制参加。

C. Create detailed documentation processes with asynchronous decision-making protocols. 制定详细的文档记录流程，并建立异步决策机制。

D. Implement multiple short meetings across different time slots with recorded summaries. 在不同时段安排多次简短会议，并记录会议摘要。

答案：B

解析：在现有的 2 小时重叠时段安排强制会议，可在当前约束范围内最大化参与度。这解决了参会者缺席的核心问题，同时不会打乱既有的工作模式。 其余选项均错误： 改变既定的轮班安排并不现实，这可能无法实现，并可能进一步扰乱工作流。 详细的文档记录流程是有帮助的，但对于需要实时输入的关键技术决策而言，异步流程过于缓慢。 安排多次会议会增加会议管理开销，并割裂沟通。

单选题 68/180、A project manager has recently been assigned to a complex multinational project with multiple stakeholders across time zones and business units. They quickly realize they lack clarity on who holds influence and what each stakeholder expects from the project. What should the project manager do first?
一位项目经理最近被指派到一个复杂的跨国项目，涉及跨时区和跨业务单元的多个利益相关方。他们很快意识到自己对谁拥有影响力以及每位利益相关方对项目的期望缺乏清晰认识。项目经理首先应当怎么做?

A. Initiate discussions with the resource manager to understand historical context and prior team dynamics. 与资源经理展开讨论，以了解历史背景和先前的团队动态。

B. Review and refine the stakeholder register to identify roles, expectations, and influence levels. 审查并完善利益相关方登记册，以识别角色、期望和影响力水平。

C. Request stakeholder mapping insights directly from the sponsor to prioritize key relationships. 直接向发起人请求利益相关方映射见解，以对关键关系进行排序。

D. Evaluate current communication channels and adapt the plan to better reflect stakeholder complexity. 评估当前的沟通渠道，并调整计划以更好地反映利益相关方的复杂性。

答案：B

解析：审查和完善利益相关方登记册是核心的利益相关方管理活动。它使项目经理能够在采取任何参与行动之前，映射影响力、参与度和期望。 其余选项均错误： 虽然历史团队背景可能有所帮助，但它不能直接解决参与规划所需的关键利益相关方分析。 发起人只能提供有限的输入，但仅依赖单一观点可能错失更广泛的利益相关方担忧或动态。 沟通规划很重要，但它应紧随利益相关方识别和分析之后——而非之前。

单选题 69/180、A large enterprise is developing a new feature-driven product. The project team is working under a tight timeline to prototype, test, and refine the product. The team lead has gathered the latest user stories and realizes the product needs two additional features. What impact does this have on the project?
一家大型企业正在开发一个功能驱动的新产品。项目团队正在紧凑的时间表下进行原型制作、测试和产品优化。团队负责人收集了最新的用户故事，并意识到产品需要两个额外的功能。这对项目有什么影响?

A. It significantly extends the project scope, timeline, and budget. 它显著扩展了项目范围、时间表和预算。

B. It requires additional resources and an increase in the budget. 它需要额外资源和预算增加。

C. It increases the backlog and might negatively impact velocity. 它增加了待办事项列表，并可能对速率产生负面影响。

D. It requires adjustments to the contingency and management reserves. 它需要调整应急储备和管理储备。

答案：C

解析：由于该项目必须采用敏捷方法，添加两个新功能将增加待办事项列表，并可能导致项目速率下滑。 其余选项均错误： 新的开发不一定会扩展项目范围、时间表和预算，也不清楚它是否需要额外资源。 对应急储备和管理储备进行更改应是最后的手段，且不应被假定为此开发的结果。

单选题 70/180、An engineering project is moving from the development phase to production. The project manager has a closing checklist for this phase that covers all the standard tasks. However, product development involved external dependencies, some of which have unresolved problems. The project manager does not want the project’s current status to be compromised by these uncertainties. What should the project manager do?
一个工程项目正在从开发阶段转入生产阶段。项目经理有一份涵盖所有标准任务的该阶段收尾核对单。然而，产品开发涉及外部依赖，其中一些存在未解决的问题。项目经理不希望项目的当前状态因这些不确定性而受到损害。项目经理应当怎么做?

A. Review the project records to confirm that they accurately represent the project’s history and problems. 审查项目记录，确认它们准确反映了项目的历史和问题。

B. Identify outstanding risks that should be accepted or transitioned to the production team. 识别应被接受或移交给生产团队的未决风险。

C. Verify that all contractual and legal obligations have been met to prevent any future legal issues. 核实所有合同和法律义务已得到履行，以防止未来的法律问题。

D. Hold knowledge-sharing sessions and forward the team’s insights and lessons learned to the production team. 举行知识分享会议，并将团队的见解和经验教训转交给生产团队。

答案：B

解析：在收尾项目的一个阶段时，项目经理有责任传达任何可能在未来影响项目的未决风险或不确定性。作为收尾的一部分报告这些问题，可使其可见，以便下一个团队做好准备处理它们。

其余选项均错误： 审查项目记录很重要。然而，确认它们准确反映了项目的历史和问题，可能无法突出持续存在的风险。 必须核实所有合同和法律义务已得到履行。然而，如果这些问题不属于合同或法律性质，那么核实这些义务将无法解决它们。项目经理应将团队的见解和经验教训转交给下一个团队以提供支持。然而，未解决问题带来的风险可能不会在知识分享会议中出现，而这些风险值得单独强调。

单选题 71/180、A manufacturing project is nearing completion, and the deliverables are expected to be finished on time. Before the deliverables can be handed over to the distribution center, the project manager must validate that the product is ready for transition. The organization has defined readiness for transition primarily through objective proof that the deliverables consistently meet required quality and performance standards and will provide measurable value in use. What should the project manager do?
一个制造项目接近完成，可交付成果预计将按时完成。在可交付成果移交给配送中心之前，项目经理必须验证产品已准备好移交。组织主要通过客观证明来定义移交就绪，即可交付成果持续满足所需的质量和绩效标准，并将在使用中提供可衡量的价值。项目经理应当怎么做?

A. Audit project records to confirm that deliverables meet the organization's internal policies. 审计项目记录，确认可交付成果符合组织的内部政策。

B. Survey the stakeholders for agreement that the deliverables demonstrate business value. 调查利益相关方，确认可交付成果展示了商业价值。

C. Conduct an independent product certification test to prove that quality standards are met. 进行独立的产品认证测试，以证明质量标准得到满足。

D. Verify that all regulatory, legal, and contractual obligations have been signed off on. 核实所有监管、法律和合同义务已签署确认。

答案：C

解析：进行独立的产品认证测试以证明质量标准得到满足，可提供客观、可验证的证据，证明可交付成果满足与移交就绪相关的质量和绩效标准。由于就绪主要定义为产品持续满足所需标

准并将在使用中提供可衡量价值的证明，独立认证测试是最直接、最有说服力的验证方法。其余选项均错误： 审计记录可以显示项目遵循了内部程序，但它不能证明可交付成果本身满足定义可衡量价值所需的质量和绩效标准。 利益相关方的输入对于认知、采用和经验教训可能有用，但当组织要求可衡量证据证明可交付成果满足既定标准时，它不如正式测试有力。签署确认确认了合规性和正式可接受性，但它们本身并不能证明产品已达到组织用来定义可衡量价值的、经测试的质量和绩效成果。

单选题 72/180、During the design phase of a complex project, the project manager identifies that incorporating adaptive tools could increase value and stakeholder alignment. This approach has proven effective in similar projects within the organization. However, it is unclear whether the current team has the capabilities to work with adaptive methods. What should the project manager do first?
在一个复杂项目的设计阶段，项目经理发现纳入适应型工具可以提升价值并增强利益相关方的一致性。这种方法在组织内的类似项目中已被证明有效。然而，尚不清楚当前团队是否有能力使用适应型方法。项目经理首先应当怎么做?

A. Confirm the team’s capabilities before introducing adaptive tools and artifacts. 在引入适应型工具和工件之前，确认团队的能力。

B. Request support from the sponsor to bring in resources experienced in adaptive delivery. 请求发起人支持，引入具有适应型交付经验的资源。

C. Update the project plan to include adaptive tools and schedule the first iteration 更新项目计划以纳入适应型工具，并安排第一次迭代。

D. Proceed with adaptive tools and monitor performance during the next phase. 继续使用适应型工具，并在下一阶段监控绩效。

答案：A

解析：项目经理必须在引入适应型工具之前评估团队是否具备采用这些工具所需的技能。如果没有这一确认，转型可能失败或产生不必要的延误。从能力检查开始，支持知情决策和负责任的规划，符合裁剪和团队赋能的原则。 其余选项均错误： 请求发起人支持，绕过了团队评估，

并在未确认需求的情况下跳过升级。 更新项目计划以纳入适应型工具并安排第一次迭代，是假定已做好准备，并在未评估可行性的情况下更改计划。 在未确保团队能够执行的情况下引入解决方案，增加了不一致或失败的风险。

单选题 73/180、During the planning phase of a project, the project manager is struggling to identify key stakeholders. Without the right stakeholders, gathering accurate requirements and securing user feedback will be difficult. The stakeholder register is incomplete, and existing team members are uncertain about who to consult. What should the project manager do?
在项目的规划阶段，项目经理难以识别关键利益相关方。没有正确的利益相关方，收集准确的需求和获得用户反馈将会很困难。利益相关方登记册不完整，现有团队成员不确定该咨询谁。项目经理应当怎么做?

A. Review the stakeholder engagement plan for potential contacts and communication needs. 审查争取利益相关方参与计划，寻找潜在的联系人和沟通需求。

B. Consult the project sponsor to confirm missing or unclear stakeholder information. 咨询项目发起人，以确认缺失或不清晰的利益相关方信息。

C. Refer to the project charter to identify stakeholders named during project initiation. 参考项目章程，识别项目启动期间列出的利益相关方。

D. Review the project scope document for information about stakeholder involvement. 审查项目范围文件，获取有关利益相关方参与的信息。

答案：C

解析：在启动期间创建的项目章程，通常包含高层级利益相关方及其角色的列表。这使其成为规划早期识别利益相关方的主要来源。 其余选项均错误： 审查争取利益相关方参与计划，是假定该计划已经完整；然而，它通常是在利益相关方被识别之后才创建的。 咨询发起人以确认缺失信息，应在审查现有文档之后进行。 审查范围文件只侧重于范围，范围可能间接提及利益相关方，但不是识别他们的主要来源。

单选题 74/180、A project manager has just finished a project charter and received approval from the project sponsor. The project manager then presented the project charter to the stakeholders and noticed a lack of participation from some of them during this meeting. What should the project manager do?
一位项目经理刚刚完成项目章程，并获得了项目发起人的批准。随后，项目经理向利益相关方介绍了项目章程，并注意到其中一些人在此次会议上缺乏参与。项目经理应当怎么做?

A. Include this in the risk register because the project manager is uncertain that the stakeholders understood their responsibilities in this project. 将此记录在风险登记册中，因为项目经理不确定利益相关方是否理解他们在该项目中的职责。

B. Hold one-on-one meetings with these stakeholders to ensure their understanding of key deliverables and their responsibilities. 与这些利益相关方举行一对一会议，确保他们理解关键可交付成果及其职责。

C. Report the concerns about the stakeholders' lack of involvement to the project sponsor. 将利益相关方缺乏参与的担忧报告给项目发起人。

D. Ask the project team to monitor these stakeholders and their involvement. 要求项目团队监控这些利益相关方及其参与情况。

答案：B

解析：每位利益相关方都需要理解可交付成果以及他们对项目的职责。项目经理应立即解决这个问题。 其余选项均错误： 这不是要记录在风险登记册中的风险，而是项目经理要解决的问题。确保利益相关方参与项目是项目经理的责任。 将担忧报告给项目发起人，不能解决利益相关方参与的问题。 监控利益相关方不是项目团队的责任。这需要由项目经理来完成。

单选题 75/180、A company has started doing agile projects. The project sponsor is frustrated and does not understand the new requirements gathering process, which seems to be incomplete and moving too fast. What should the project manager do?
一家公司开始开展敏捷项目。项目发起人感到沮丧，不理解新的需求收集流程，该流程似乎不完整且推进得太快。项目经理应当怎么做?

A. Help the project sponsor understand the different tools and techniques available and why this one was selected. 帮助项目发起人理解可用的不同工具和技术，以及为什么选择这一种。

B. Update the stakeholder register to identify the project sponsor as a potential impediment to project progress. 更新利益相关方登记册，将项目发起人标识为项目进展的潜在障碍。

C. Let the team know that the sponsor is unhappy and switch from iterative planning to predictive planning. 让团队知道发起人不满意，并从迭代规划切换到预测型规划。

D. Pause the project work until the scrum master has a chance to review the complete backlog with the sponsor. 暂停项目工作，直到 Scrum 主管有机会与发起人一起审查完整的待办事项列表。

答案：A

解析：每位敏捷实践者都有权培训和组织中的利益相关方，帮助他们理解流程并有效参与。其余选项均错误： 项目发起人不能被当作敏捷项目的障碍。这会破坏基本的信任模式。在不征得执行工作的团队认同的情况下强行规定流程，违背了自组织和服务型领导的敏捷原则。暂停项目是错误的，因为它破坏了敏捷流程，并意味着全部待办工作都必须事先获得批准。这实际上会创建一个没有敏捷性也没有严谨性的瀑布项目。

单选题 76/180、A startup is expanding to scale its product development efforts. The project manager builds a team that includes both experienced members and several new hires. Facing a tight deadline and limited time for formal training, the team must become competent as quickly as possible. What should the project manager do?
一家初创公司正在扩展其产品开发工作。项目经理组建了一个既包含经验丰富的成员、也包含几名新员工的团队。面对紧迫的截止日期和有限的正式培训时间，团队必须尽快变得胜任。项目经理应当怎么做?

A. Evaluate the team’s knowledge levels and provide a series of training sessions to address the deficits. 评估团队的知识水平，并提供一系列培训课程以弥补不足。

B. Assign all critical tasks to experienced team members and the easy tasks to newer team members. 将所有关键任务分配给经验丰富的团队成员，将简单任务分配给较新的团队成员。

C. Brainstorm with the entire team to find ways to accelerate project velocity and offset the learning curve. 与整个团队集思广益，寻找加速项目速率并抵消学习曲线的方法。

D. Strategically mix team members with varying expertise to combine diverse skills across the team. 战略性地混合具有不同专业技能的团队成员，以整合团队中的多样化技能。

答案：D

解析：通过战略性地混合不同资历水平和专业技能的团队成员，项目经理可以促进知识共享、培养学习文化、提供指导机会，并让团队成员获得实践经验，以提升整体团队能力。 其余选项均错误： 在开始时评估团队的知识水平是一项关键任务，但紧迫的截止日期可能不允许在开始工作之前提供一系列培训课程。 将最重要的任务分配给最有经验的团队成员，有使其负担过重的风险，并剥夺了较新成员在职学习的机会，使团队的不平衡长期存在。 与团队集思广益寻找加速项目的方法可能会产生一些有用的想法，但它不能消除学习曲线，也不能解决能力发展的问题。

单选题 77/180、A project is currently 15% behind schedule. The sponsor believes recovery is possible with extensive overtime. The finance manager warns the budget cannot absorb additional costs. The project management office cautions that recovery options must be formally analyzed and approved before implementation. What should the project manager do?
一个项目目前进度落后 15%。发起人认为通过大量加班可以实现恢复。财务经理警告说，预算无法吸收额外成本。项目管理办公室告诫说，恢复方案在实施前必须经过正式分析和批准。项目经理应当怎么做?

A. Conduct a structured impact analysis and present recovery options with cost, schedule, and risk trade-offs. 进行结构化的影响分析，并提出带有成本、进度和风险权衡的恢复方案。

B. Examine the critical path to find tasks that can be moved or reduced in scope to aid in recovery. 检查关键路径，找出可以移动或缩小范围的任务，以帮助恢复。

C. Perform fast-tracking and crashing techniques to shorten the project schedule without increasing costs. 执行快速跟进和赶工技术，在不增加成本的情况下缩短项目进度计划。

D. Maintain the original schedule because there might be down time at the end of the project when the team can catch up. 保持原始进度计划，因为项目结束时可能会有停工时间，让团队赶上进度。

答案：A

解析：项目经理应在采取任何纠正措施之前，进行结构化的影响分析并提出恢复权衡方案；这是正确的方法。 其余选项效果较差： 关键路径法使项目经理能够专注于影响进度计划的关键任务，并在必要时对其进行调整。然而，未经正式批准，项目经理不应做出这些更改。 快速跟进和赶工技术可用于缩短项目进度计划，但并非没有后果，例如预算增加和风险增加。 在已经落后的情况下不做出任何改变地维持原路线，会导致日后出现更大的问题。

单选题 78/180、A medical engineering firm is developing new medical devices for hospitals and clinics. The devices are subject to government regulations and must be thoroughly tested before release. There is a high potential for circumstances to change throughout this project's life cycle. Project stakeholders have helped identify some risks and asked the project manager to prepare a plan to address all possible risks. What should the project manager do next?
一家医疗工程公司正在为医院和诊所开发新型医疗设备。这些设备受政府法规约束，必须在发布前进行全面测试。整个项目生命周期中情况发生变化的可能性很高。项目利益相关方帮助识别了一些风险，并要求项目经理准备一份计划来处理所有可能的风险。项目经理下一步应当怎么做?

A. Develop workarounds that can be acted on immediately to minimize the impact of risks as they are detected. 制定权宜之计，以便在风险被发现时立即采取行动，将风险影响降到最低。

B. Use qualitative and quantitative analyses to prioritize risks based on the severity of their potential impacts. 使用定性和定量分析，根据潜在影响的严重性对风险进行排序。

C. Use parametric estimating to employ an algorithm that can help calculate the extrapolated costs of each risk. 使用参数估算，采用一种算法来帮助计算每种风险的外推成本。

D. Use a continuous flow diagram (CFD) to track the amount of work accomplished despite risks and other obstacles. 使用累计流量图（CFD）跟踪尽管存在风险和其他障碍，已完成的工作量。

答案：B

解析：识别风险后，风险管理中的下一步是风险分析。定性分析基于概率和影响等标准评估风险，通常使用风险矩阵或排序。定量分析涉及更多的数值建模技术（例如蒙特卡洛模拟），以计算可能的成本和影响。对风险进行排序，使项目经理能够将精力集中在最重要的风险上，并有效分配资源。 其余选项均错误： 权宜之计应仅在风险评估和排序之后制定。权宜之计是对某个问题立即采取的临时应对措施，而该问题之前没有计划过应对措施，或者之前计划的应对措施无效。 参数估算用于基于历史数据和统计模型进行成本估算或进度估算，但它不是为评估或排序风险而设计的，尤其是评估其严重性或影响。 CFD 跟踪整个项目完成了多少工作。尽管这些都是有用的工具，但它们并非专门针对风险管理。

单选题 79/180、A team member is unhappy with their workload and feels they are not being supported enough. The project manager wants to meet with the team member to discuss their concerns and apply a compromise/reconcile conflict management approach. What should the project manager do first?
一名团队成员对自己的工作量不满，并感到自己没有得到足够的支持。项目经理想与该团队成员会面讨论他们的担忧，并应用妥协/调和的冲突管理方法。项目经理首先应当怎么做?

A. Explain the project's constraints and competing priorities before proposing options. 在提出选项之前，解释项目的约束和相互竞争的优先事项。

B. Listen carefully to the team member’s concerns and acknowledge their perspective. 仔细倾听团队成员的担忧，并认可他们的观点。

C. Propose a revised task schedule to reduce the team member’s workload pressure. 提出修订后的任务安排，以减轻团队成员的工作量压力。

D. Offer additional support resources to help the team member manage expectations. 提供额外的支持资源，帮助团队成员管理期望。

答案：B

解析：妥协/调和是一种协作式冲突解决策略，始于积极倾听。理解团队成员的观点可建立信任，并为双方都能接受的解决方案打开大门。 其余选项均错误： 直接跳到项目约束，可能显得轻慢，如果团队成员感到自己没有被倾听，可能会加剧紧张。 在未充分理解的情况下过早提供解决方案，可能无法解决根本担忧，或显得单方面。 虽然支持有帮助，但在理解问题之前提供支持，可能导致需求与行动之间的不匹配。

单选题 80/180、Disagreements have developed among project team members. The project manager initially attributed it to stress from the impending deadline, but it continued even after the deadline was met. To address the issue effectively, the project manager needs to identify the cause of friction and resolve the underlying conflict. What should the project manager do?
项目团队成员之间出现了分歧。项目经理最初将其归因于截止日期临近带来的压力，但在截止日期过后分歧仍然存在。为有效解决问题，项目经理需要找出摩擦的根源，并解决潜在的冲突。项目经理应当怎么做?

A. Determine whether different individual work styles are causing issues, and establish ground rules for the team’s interactions. 判断不同的个人工作风格是否导致了问题，并为团队互动制定基本规则。

B. Identify the team members who have been involved in the arguments and warn them that disciplinary action will be initiated. 找出参与争论的团队成员，并警告他们将启动纪律处分。

C. Distribute tasks evenly across the team and follow the communication plan. 在团队中平均分配任务，并遵循沟通管理计划。

D. Ignore the tensions and postpone resolution until the next project iteration. 忽略紧张气氛，将问题解决推迟到下一个项目迭代。

答案：A

解析：由于交付已经成功，且问题在交付完成后仍然存在，因此团队很可能已经理解需求并拥有成功所需的资源。工作风格的差异可能导致团队成员之间产生误解、效率低下甚至摩擦。主动识别问题并制定基本规则，可以帮助项目经理和团队成员营造合作、相互尊重和协调一致的环境，最终提升团队的有效性，确保项目交付成功。 其余选项均错误： 将冲突归咎于特定成员并启动纪律处分可能是一种错误做法。在未了解冲突根源的情况下点名指责特定人员，可能错失冲突背后的潜在动态，并延续导致冲突发生的条件。 如果确认平均重新分配任务和遵循沟通管理计划是问题根源，这算是积极的一步，但它未必能解决团队成员之间冲突的根源。忽略紧张气氛并将问题解决推迟到下一个迭代之后，无助于项目经理理解问题的根源。该选项还带来额外风险：未解决的冲突可能会随着时间推移而加剧。

单选题 81/180、A project manager has been assigned to a diverse team of individuals with different competencies. The project manager wants to ensure each team member contributes to the project vision and grows their skill set throughout the project. Their goal is to ensure alignment and enhance team efficiency. What should the project manager do?
一名项目经理被指派领导一支由不同能力成员组成的多元化团队。项目经理希望确保每位团队成员都为项目愿景做出贡献，并在整个项目过程中提升自身技能。其目标是确保目标一致并提高团队效率。项目经理应当怎么做?

A. Use AI technology to analyze each team member’s strengths and assign tasks based on their capabilities, interests, and vision. 利用 AI 技术分析每位团队成员的优势，并根据其能力、兴趣和愿景分配任务。

B. Implement a directive approach to ensure team members understand the importance of the project’ s intended outcome and how to achieve it. 采用指令式方法，确保团队成员理解项目预期成果的重要性及实现方式。

C. Organize mentorship opportunities to nurture less-experienced team members, building their capabilities and confidence. 组织导师辅导机会，培养经验较少的团队成员，提升其能力和信心。

D. Demonstrate the importance of hierarchy and the value of seeking guidance from senior stakeholders with experience in driving a project’ s vision. 展示层级的重要性，以及向具有推动项目愿景经验的资深利益相关方寻求指导的价值。

答案：C

解析：组织导师辅导机会，有助于团队成员在项目过程中以及通过长期关系发展其技能和知识。让经验较少的团队成员与资深利益相关方结对，可以营造一种融合团队各层级能力的学习氛围，增强团队信心，并加深他们对项目目标的一致性认识。 其余选项均错误： AI 技术可以作为分析文档的工具，但不应依赖它来准确评估团队成员的能力或愿景。过度依赖 AI 还存在输入敏感信息的风险，这可能违反组织的规章制度。 权威式方法可能让成员感到未被代表，并滋生不满情绪，从而削弱未来的协作。实现团队和利益相关方目标一致往往需要更大的灵活性。忽视初级团队成员的愿景和意见，而不是促进其成长并支持其贡献，可能导致团队内部产生不满情绪，并因新成员未被纳入项目愿景的定义而错失创新建议的风险。

单选题 82/180、A manufacturing company is adding a new product line, adopting best industry-standard practices. The project manager needs to prepare a project management plan that lists all resources. The resources should include any additional knowledge that might be critical to the project or beyond the organization's knowledge repository. What should the project manager do?
一家制造公司正在增加一条新的产品线，并采用行业最佳标准实践。项目经理需要编制一份列出所有资源的项目管理计划。资源应包括可能对项目至关重要、或超出组织知识库范围的任何附加知识。项目经理应当怎么做?

A. Ensure that all team members have easy access to manuals, procedures, and other documentation. 确保所有团队成员都能方便地获取手册、程序和其他文档。

B. Host brainstorming sessions to help make team members' implicit knowledge more accessible. 举办头脑风暴会议，帮助使团队成员的内隐知识更容易获取。

C. Select team members who have a deep knowledge of the industry to minimize the need for extra research. 选择对行业有深入了解的团队成员，以尽量减少额外研究的需要。

D. Help project team members understand their roles and responsibilities, including identifying gaps in knowledge. 帮助项目团队成员理解其角色与职责，包括识别知识缺口。

答案：B

解析：团队成员从其经验中携带的隐性知识，可以提供超出正式记录范围的关键信息。通过对话和头脑风暴会议营造开放沟通的文化，有助于让这些内隐知识为项目所用。 其余选项均错误： 提供手册、程序和其他文档的便捷获取渠道很重要，但这类知识已经编码在知识库中。项目经理需要识别正式文档之外的其他关键知识来源。 选择对行业有深入了解的团队成员可以尽量减少额外研究的需要，但这一选择可能超出项目经理的控制范围。而且，即使拥有经验最丰富的团队成员，项目经理仍需要识别对项目至关重要的附加知识。 帮助项目团队成员理解其角色与职责，应当是项目组建工作的一部分；识别知识缺口有助于团队了解应将培训和研究工作重点放在何处。然而，识别团队的知识缺口，首先要清晰理解关键知识是什么。

单选题 83/180、A public university is investing a portion of its funding in an innovative construction project. The project sponsor wants to ensure that the risks associated with this investment are evaluated regularly to determine whether to continue funding the next stage of the project. The project manager needs to ensure that this project does not exceed any of the established risk thresholds. What should the project manager do?
一所公立大学正将其部分资金投资于一个创新建设项目。项目发起人希望确保与该投资相关的风险得到定期评估，以决定是否继续资助项目的下一阶段。项目经理需要确保该项目不超过任何既定的风险阈值。项目经理应当怎么做?

A. Implement investment controls to evaluate and analyze the possible returns on investment and reduce potential risks. 实施投资控制，评估并分析可能的投资回报，降低潜在风险。

B. Organize a self-governance model in which the responsibilities and risks are equally distributed among the team. 组织一种自治理模式，由团队平均分担职责和风险。

C. Implement a system of escalation to the project sponsor whenever there is a question of risk outweighing the potential reward. 只要出现风险可能超过潜在回报的疑问，就建立向项目发起人升级的机制。

D. Use budget reserves to create a financial buffer and account for any unforeseen risks and uncertainties that may arise. 使用预算储备金建立财务缓冲，并应对可能出现的任何不可预见的风险和不确定性。

答案：A

解析：投资控制通常包含一套完善的风险评估程序，用于分析可能的投资回报并降低潜在风险，例如在项目各阶段设置明确的决策关口，以判断下一轮投资资金对出资方和整个项目而言是否仍具有良好商业意义。 其余选项均错误： 自治理模式存在决策分散、决策者之间冲突的较大可能性，导致缺乏方向和问责。此外，它也无法充分建立升级阈值。 在决策权限涉及项目团队经理之外的高层人员时，升级可能有用；但在未事先商定阈值的情况下向项目发起人升级，可能削弱项目经理的项目级权威，并引发比解决的问题更多的问题。 拥有充足的财务缓冲是确保项目不超过其成本阈值、不进入高风险财务领域的关键组成部分，但它只是升级阈值的一个单一要素，并非决定何时升级的流程。

单选题 84/180、Several senior partners at an architecture firm are preparing for retirement. These partners possess institutional knowledge and expertise that the firm needs to retain after the partners leave. To preserve this knowledge, the firm has asked the project manager to update its organizational process assets (OPAs). What should the project manager do next?
一家建筑事务所的几位资深合伙人即将退休。这些合伙人掌握着事务所需要在其离开后保留的

组织知识和专业技能。为保存这些知识，事务所已要求项目经理更新其组织过程资产（OPAs）。项目经理接下来应当做什么?

A. Review the stakeholder register to find individuals who are interested in ongoing, proactive engagement with project documentation. 审查利益相关方登记册，找出有兴趣持续、主动参与项目文档工作的个人。

B. Conduct team-building activities to strengthen bonds with the partners and document their conclusions about how teams can better work together. 开展团队建设活动以加强与合伙人的联系，并记录他们关于团队如何更好地协作的结论。

C. Perform an asset analysis of the strategic plan to evaluate the organization’s strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT). 对战略计划进行资产分析，评估组织的优势、劣势、机会与威胁（SWOT）。

D. Document lessons learned from each project phase and ensure the organization's information repositories are kept current. 记录每个项目阶段的经验教训，并确保组织的信息存储库保持更新。

答案：D

解析：组织过程资产是用于管理和改进项目的内部组织知识与流程资产。它们包括文档、流程和知识库，通过既定标准和集体知识帮助改进项目管理。项目经理应记录每个项目阶段的经验教训，并确保组织的知识存储库保持更新。 其余选项均错误： 审查利益相关方登记册有助于识别影响力，但无法识别具体的组织过程资产。 团队建设活动可能是加强团队理解与凝聚力的重要管理工具，但它们不会促成组织过程资产的更新。组织过程资产是更正式、更全面的组织资产。 SWOT 分析是用于规划的有效管理策略，而非组织过程资产。

单选题 85/180、A utility company is exploring renewable energy sources, developing new technologies for energy production and distribution. Midway through a project, two key resources are assigned to work on a high-priority initiative. The functional manager insists they can multitask. The project sponsor argues that delivery dates for both projects must remain fixed. The project teams warn quality may be negatively

impacted as a result of the overwork. What should the project manager do?
一家公用事业公司正在探索可再生能源，开发用于能源生产和分配的新技术。在项目进行到一半时，两名关键资源被指派从事一项高优先级计划。职能经理坚持认为他们可以同时处理多项任务。项目发起人主张两个项目的交付日期都必须保持不变。项目团队警告说，过度工作可能会对质量产生负面影响。项目经理应当怎么做?

A. Re-evaluate the schedule and make realistic adjustments with the functional manager and sponsor. 与职能经理和发起人重新评估进度计划，并做出切合实际的调整。

B. Keep resources double-assigned, accept reduced productivity, but assign a quality assurance manager to both projects. 让资源保持双重指派，接受生产率下降，但为两个项目各指派一名质量保证经理。

C. Reassign resources to the original project because this project aligns better with the organization's priorities. 将资源重新指派回原项目，因为该项目更符合组织的优先级。

D. Hire better qualified and more experienced replacements who can meet the delivery dates for the first project. 招聘资历更高、经验更丰富的替代人员，以赶上第一个项目的交付日期。

答案：A

解析：项目经理应与利益相关方一起切合实际地重新评估进度计划，以便同时兼顾两个项目，并找到解决方案，避免两个项目的质量都受到负面影响。 其余选项均错误： 工作过载会降低生产率和质量。 强制重新指派忽视了组织的平衡。 替代资源需要时间入职并逐步熟悉新项目，这会影响项目进度计划。

单选题 86/180、A project advisory team is working remotely from the core project team. There is a constant flow of information between these two teams, and both teams approve project documents. Any delays in approvals will result in additional expense. Which practice would assure the project manager that all of the documents are on hand, updated, and approved properly?
一个项目顾问团队与核心项目团队远程协作。两个团队之间存在持续的信息流动，并且两个团

队都审批项目文档。审批的任何延迟都会导致额外费用。
哪项做法能确保项目经理掌握所有文档均已就位、保持更新并得到妥善审批?

A. Let the advisory and core teams develop and maintain their own document categorization and naming systems. 让顾问团队和核心团队各自开发并维护自己的文档分类和命名系统。

B. Require each member of the advisory and project teams to maintain updated records. 要求顾问团队和项目团队的每位成员都维护更新的记录。

C. Have the sponsor maintain and approve changes within a single document registry. 让发起人在单一文档登记册中维护并审批变更。

D. Oversee a single document registry and change control system that both teams use. 监督两个团队共用的单一文档登记册和变更控制系统。

答案：D

解析：文档控制是项目变更控制的重要组成部分。单一文档登记册将确保存在版本控制，并且所有文档都可以从单一存储库中供所有利益相关方访问。项目经理应监督两个团队共用的单一文档登记册和变更控制系统。 其余选项均错误： 多个文档登记系统会导致不一致、混乱和延迟。 个人跟踪会增加信息缺失、过时或不一致的风险，因为缺乏协调一致的流程或工具。 项目发起人的角色是提供战略指导和治理，而非执行文档管理等日常行政任务。

单选题 87/180、A project manager is working on a large construction project with a tight deadline. The procurement department changes suppliers midway through the project. The project manager discovers that the new vendor is not on the approved vendor list and may be unable to meet the project schedule. What should the project manager do?
一名项目经理正在执行一个工期紧张的大型施工项目。采购部门在项目中途更换了供应商。项目经理发现新供应商不在批准的供应商名单上，并且可能无法满足项目进度计划。项目经理应当怎么做?

A. Engage a vendor from the approved vendors list to find a solution regarding the project's schedule. 从批准的供应商名单中选一家供应商，共同寻求解决项目进度计划问题的方案。

B. Consult with stakeholders to update the risk register and determine a mitigation strategy. 与利益相关方协商，更新风险登记册并确定缓解策略。

C. Perform a risk probability and impact assessment, then submit a change request as needed. 执行风险概率和影响评估，然后根据需要提交变更请求。

D. Meet with the vendor to negotiate a scope change to the procurement contract to meet the schedule. 与供应商会面，协商对采购合同进行范围变更以满足进度计划。

答案：C

解析：执行风险概率和影响评估将确定更换供应商对进度计划的影响。在与原供应商重新谈判或寻找新供应商之后，项目经理可以根据需要提交变更请求。 其余选项均错误： 从另一家供应商采购会进一步推迟进度计划，并可能增加成本。它也没有解决当前问题，或评估其对项目及潜在纠正措施的影响。 在此阶段与利益相关方协商更新风险登记册并确定缓解策略没有必要。 为满足截止日期而协商变更采购合同的范围，会对项目的其他领域产生影响，包括范围和质量保证。

单选题 88/180、This organization uses a red, yellow, green rating system. Project milestones are reported green, so the sponsor insists the overall status must remain green. Defect density and rework rates are increasing steadily, and the quality assurance manager argues that these trends signal future failure. The client asks for assurance that the product will meet acceptance standards. What should the project manager do?
该组织采用红、黄、绿三级评级系统。项目里程碑均报告为绿色，因此发起人坚持总体状态必须保持绿色。缺陷密度和返工率正在稳步上升，质量保证经理认为这些趋势预示着未来的失败。客户要求保证产品将达到验收标准。项目经理应当怎么做?

A. Maintain green status because milestones are achieved and reassure the client the product meets acceptance standards. 保持绿色状态，因为里程碑已经达成，并向客户保证产品符合验收标准。

B. Report red status immediately and halt execution of project activities until metrics show significant improvement. 立即报告红色状态，并暂停项目活动执行，直到指标显示出显著改善。

C. Maintain green status, citing defect density and rework rates that remain within acceptable thresholds. 保持绿色状态，理由是缺陷密度和返工率仍在可接受的阈值范围内。

D. Report yellow status, citing the quality metrics and outlining mitigation strategies underway. 报告黄色状态，引用质量指标并概述正在进行的缓解策略。

答案：D

解析：项目经理应沟通既包含滞后指标又包含领先指标的项目状态，并做到透明报告和说明缓解措施。报告带有支持性质量指标和缓解策略的黄色状态，可以实现主动决策，并表明为管理风险而采取的纠正措施正在进行中。 其余选项效果较差： 选择性报告会隐藏关键风险，并为高层管理者制造虚假的保证。 在没有进一步分析或纠正性规划的情况下宣布红色并暂停活动，属于反应过度。 当趋势显示并非如此时仍保持绿色状态，不是诚实的报告。

单选题 89/180、Although a project is performing on time, within scope and budget, the project manager learns that the project sponsor is unhappy with its progress. What should the project manager have done to avoid this situation?
尽管项目按时、在范围内且按预算执行，但项目经理得知项目发起人对项目进展不满意。项目经理本应如何做才能避免这种情况?

A. Conducted frequent reviews and assessments to identify and address any potential risks. 进行频繁的审查和评估，以识别并处理任何潜在风险。

B. Aligned project objectives with the project sponsor's expectations and requirements. 使项目目标与项目发起人的期望和要求保持一致。

C. Communicated regularly with the project sponsor to provide updates and address any concerns. 与项目发起人定期沟通，提供最新进展并处理任何关切。

D. Implemented strict control measures to ensure that project milestones and deliverables are met. 实施严格的控制措施，以确保项目里程碑和可交付成果得以实现。

答案：C

解析：项目经理必须与项目发起人进行有效沟通。发起人为项目提供资源和支持，并对促成成功负责。没有定期沟通，项目经理无法确保发起人充分了解并参与项目进展。尽管项目执行良好，发起人仍对进展不满。 其余选项均错误： 进行频繁审查以识别并处理任何潜在问题或风险，并不能解决发起人不满意的根源。项目执行良好，没有证据表明项目团队未能充分识别和处理风险。 使项目目标与发起人的期望保持一致很重要，但该选项不正确。实现或保持一致性需要有效的沟通。 实施严格的控制措施并不能解决发起人的不满。

单选题 90/180、A major manufacturing corporation is launching a lucrative new initiative that must meet strict internal and external regulations and policies. In preparation, the organization has conducted numerous surveys and collected valuable data to guide the management of the project. The project manager needs to ensure the organization is effectively governing the project. What should the project manager do?
一家大型制造公司正在启动一项利润丰厚的新计划，该计划必须满足严格的内外部法规和政策。为做准备，该组织开展了大量调查，并收集了宝贵数据以指导项目管理。项目经理需要确保组织对项目进行有效治理。项目经理应当怎么做?

A. Implement a project charter to formalize the project manager’ s authority to access and apply organizational data. 实施项目章程，以正式确立项目经理访问和应用组织数据的权力。

B. Organize a resource management plan to identify necessary resources and ensure they meet all internal policies. 编制资源管理计划，以识别必要资源，并确保其符合所有内部政策。

C. Examine the organizational process assets (OPAs) to define the structure, rules, procedures, and policies that the project must follow. 审查组织过程资产（OPAs），以确定项目必须遵循的结构、规则、程序和政策。

D. Use work performance data to analyze key performance indicators and ensure the project team is meeting internal regulations. 使用工作绩效数据来分析关键绩效指标，并确保项目团队遵守内部法规。

答案：C

解析：组织过程资产包括来自参与项目的执行组织的任何工件、实践或知识，包括但不限于政策、流程、程序和组织知识存储库。组织过程资产是许多项目管理过程的输入，并指导和影响项目的管理。 其余选项均错误： 项目章程是项目特有的，并不包括所有相关的组织政策和资源。项目章程的创建对项目团队的运作和项目经理权力的界定至关重要，但它本身并不向项目经理提供相关数据和信息。项目经理必须利用项目章程授予的权力来访问和应用组织过程资产，并向其团队提供必要的信息。 项目团队在编制资源管理计划时可以利用组织过程资产，以确保所有选定的资源符合内外部政策，并遵循所收集数据的结论。但资源管理计划本身并不能保证有效的治理。 来自过去和当前项目的工作绩效数据可能包含在组织过程资产中，但必须连同其他工件和数据一起分析，才能理解项目管理的整体范围。

单选题 91/180、During a daily coordination meeting, the project sponsor insists the project is on track, even though two milestones are already late. The clients stress that the continued setbacks may reduce their confidence in the project. What should the project manager do to reaffirm the client’ s confidence?
在一次每日协调会议上，项目发起人坚持认为项目进展正常，尽管两个里程碑已经延迟。客户强调，持续的挫折可能会降低他们对项目的信心。项目经理应当怎么做才能重新赢得客户的信心?

A. Report any milestone delays to all stakeholders and explain the corrective actions taken to recover the schedule. 向所有利益相关方报告任何里程碑延迟，并说明为恢复进度计划而采取的纠正措施。

B. Exclude milestone details from the review discussions and highlight only the positive aspects of progress. 将里程碑细节排除在评审讨论之外，只强调进展的积极方面。

C. Support the sponsor’ s statement to maintain confidence and explain plans to prevent potential milestone delays. 支持发起人的说法以维持信心，并解释防止潜在里程碑延迟的计划。

D. Work with the teams responsible for the missed milestones to develop a strategy and keep the project on track. 与负责错过里程碑的团队合作制定策略，使项目保持正轨。

答案：A

解析：项目经理应采取透明报告的做法，说明并实施纠正措施以应对挫折。解释纠正措施表明项目经理正在处理问题并采取措施恢复进度计划，这可能增强团队纠正方向能力的信心。 其余选项均错误： 误导利益相关方会侵蚀信任。 隐藏或回避真实数据会降低问责性。防止未来延期的计划无法解决已延误的里程碑。 虽然与团队合作处理延迟至关重要，但该选项没有解决重新赢得客户信心的当前问题。

单选题 92/180、A construction team is facing scrutiny because materials were repeatedly over-ordered in past projects, leading to waste and increased costs. The project sponsor advocates for efficient material management and waste reduction. Team members argue that ordering flexibility is key to preventing shortages, but the finance manager stresses budget constraints. The project manager must align project deliverables with stakeholder expectations while controlling costs. What should the project manager do?
一个施工团队正面临审查，因为在过去的项目中材料被反复过量订购，导致浪费和成本增加。项目发起人倡导高效的材料管理和减少浪费。团队成员认为订购的灵活性是防止短缺的关键，但财务经理强调预算限制。项目经理必须在控制成本的同时，使项目可交付成果与利益相关方的期望保持一致。项目经理应当怎么做?

A. Document risk thresholds and detailed material control strategies in the risk management plan for financial approval. 在风险管理计划中记录风险阈值和详细的材料控制策略，以供财务批准。

B. Implement an inventory monitoring system that regularly compares planned usage with actual consumption. 实施库存监控系统，定期将计划用量与实际消耗进行比较。

C. Facilitate stakeholder workshops to align expectations regarding acceptable material variance and efficiency targets. 组织利益相关方研讨会，就可接受的材料偏差和效率目标统一期望。

D. Apply a material requirements planning (MRP) system to forecast demand and automate materials ordering decisions. 应用物料需求计划（MRP）系统来预测需求并自动化材料订购决策。

答案：D

解析：项目经理应使用 MRP 系统来预测需求。MRP 是一种主动的、自动化的工具，可估算材料需求、防止过量订购，并与发起人的效率要求和财务的预算限制保持一致。它直接解决了题干中的问题。 其余选项均错误： 风险管理计划定义了管理风险的流程，而非预测或控制材料的运营工具。它涉及治理层面的规划，而非执行过程中的资源控制。 监控计划与实际活动的对比是一种被动行为，只能在浪费发生之后识别浪费。它无法主动防止过量订购或短缺。仅靠研讨会无法解决预测或控制材料的技术挑战。它们处理的是认知层面，而非实际风险。

单选题 93/180、A project manager is overseeing a controversial marketing project involving multiple vendors and stakeholders with strong opinions. The project manager wants to avoid conflicts that might hinder working relationships or delay the project's timeline. What approach should the project manager adopt?
一位项目经理正在监督一个颇具争议的营销项目，项目涉及多家供应商以及意见强烈的利益相关方。项目经理希望避免可能阻碍工作关系或延误项目进度的冲突。项目经理应当采用什么方法?

A. Use predictive analytics to discover patterns and forecast future scenarios, fostering objectivity in stakeholder discussions. 使用预测性分析来发现模式并预测未来情景，促进利益相关方讨论的客观性。

B. Facilitate a nominal group discussion to systematically gather input, ensuring that all ideas are considered. 组织名义小组讨论，系统性地收集意见，确保所有想法都被考虑。

C. Compare stakeholder opinions using a multicriteria decision analysis technique to guide discussions systematically. 使用多标准决策分析技术比较利益相关方的意见，系统地引导讨论。

D. Use a responsibility assignment matrix to define each stakeholder's responsibilities and prioritize their input during discussions. 使用责任分配矩阵确定每位利益相关方的职责，并在讨论中优先考虑他们的意见。

答案：B

解析：名义小组技术是一种结构化方法，旨在应对混乱且低效讨论带来的挑战，尤其是在大型群体中或针对棘手、有争议的话题时。该技术旨在使参与趋于均等，减少发言强势成员的支配，确保在讨论进行前所有想法都被考虑。通过以系统化的方式收集意见，名义小组技术有助于促进群体决策。 其余选项均错误： 使用机器学习分析模式和历史数据，是收集和呈现数据的有用工具，但无法保证能带来富有成效、无冲突的讨论。在存在如此多强烈意见的情况下，客观数据固然有用，但项目经理仍需运用其他技术来促进利益相关方之间富有成效的讨论。 多标准决策分析是一种利用决策矩阵提供分析方法的技术，用于建立标准以评估和排序众多想法。它是分析通过其他方法（如名义小组技术）收集到的想法的有效工具，但其本身并不能促进反馈或引导讨论。 责任分配矩阵用于说明工作包或活动与项目团队成员之间的联系。它是一种用于设计项目团队成员角色和工作量的技术，与促进外部利益相关方的讨论无关。

单选题 94/180、A large civil construction project currently underway is subject to several different compliance requirements. The sponsor stresses that the project must be safeguarded from potential legal and financial repercussions resulting from noncompliance. The project manager needs to ensure that the project adheres to all compliance requirements. What strategy should the project manager take?
一个正在实施的大型土木工程项目需满足多项不同的合规要求。发起人强调，项目必须避免因不合规而面临潜在的法律和财务后果。项目经理需要确保项目遵守所有合规要求。项目经理应采取什么策略?

A. Prioritize each compliance requirement based on the due date of the response to ensure a deadline is not missed. 根据回复的到期日对每项合规要求进行排序，以确保不遗漏截止日期。

B. Schedule an audit to catch any compliance requirements that might have been overlooked. 安排一次审计，以发现可能被遗漏的任何合规要求。

C. Classify the compliance categories to address each area systematically, including safety, legal, and environmental. 对合规类别进行分类，系统性地处理每个领域，包括安全、法律和环境。

D. Survey stakeholders for input on control mechanisms that could be set up to ensure ongoing compliance throughout the project lifecycle. 调查利益相关方对控制机制的意见，这些机制可用于确保整个项目生命周期内的持续合规。

答案：B

解析：审计能够让项目经理发现项目规划阶段可能被遗漏的任何合规要求。合规必须持续监控。其余选项效果较差： 仅关注截止日期是被动反应式的，存在遗漏更广泛合规义务的风险。 对合规类别进行分类，系统性地处理每个领域（包括安全、法律和环境），无法解决合规问题。利益相关方调查可能有帮助，但并非系统性的合规管理策略。

单选题 95/180、A pharmaceutical company has assembled a project team to research and develop a groundbreaking new medication. Given the complexity and uncertainty of the development process, the project’ s timeline and costs are likely to fluctuate significantly. As the project manager, you are responsible for selecting and implementing a contract before beginning the work. What type of contract would provide the necessary flexibility while minimizing financial risk for the client?
一家制药公司组建了一个项目团队，用于研发一种开创性的新药。鉴于开发过程的复杂性和不确定性，项目的时间线和成本很可能会大幅波动。作为项目经理，你负责在开始工作前选择和实施一份合同。哪种合同类型能在最大限度降低客户财务风险的同时，提供必要的灵活性?

A. A time and materials (T&M) contract. 工料合同

B. A fixed-price contract. 总价合同

C. A cost-reimbursable contract. 成本补偿合同

D. A target-cost contract. 目标成本合同

答案：C

解析：成本补偿合同非常适合复杂且不确定的项目，因为它允许灵活地适应开发工作不断变化的需求和范围。客户承担承包商实际发生的成本，外加约定费用，这降低了承包商的财务风险，并鼓励在没有固定约束的情况下进行充分探索。这种方法还减轻了承包商的财务风险，并确保客户只为实际执行的工作付费。 其余选项均错误： 工料合同虽然提供了灵活性，并且通常在范围未完全确定时使用，但它无法有效管理客户的财务风险。 由于项目固有的不确定性，总价合同不适用于此场景。它将过重的负担强加给承包商，要求其在限定的预算内完成项目，如果出现不可预见的挑战，可能导致质量受损或工作不完整。 目标成本合同通常用于通过在客户和承包商之间分摊成本节约或超支来激励效率。然而，在此案例中，由于开发时间线和成本高度不确定，这类合同不太适用。

单选题 96/180、A project team is responsible for managing the construction of a new office building. The job will require using a contractor for a specialized part of the construction. The project's scope is clear, so the contractor should be able to provide an accurate estimate. What type of contract is suitable for this project?
一个项目团队负责管理一栋新办公楼的建设。该工程需要使用一家承包商来完成建设中的某个专业部分。项目范围清晰明确，因此承包商应能够提供准确的估算。哪种合同类型适合这个项目?

A. A fixed-price contract 总价合同

B. A cost-reimbursable contract 成本补偿合同

C. A time and materials (T&M) contract 工料合同

D. A target-cost contract 目标成本合同

答案：A

解析：总价合同在建筑项目中很常见，它为范围明确定义的工作设定了预定的费用。这种协议将成本风险转移给卖方，并为买方提供预算可预测性。这类合同依赖于对所涉工作的准确估算。其余选项均错误： 成本补偿合同向卖方支付卖方的实际成本，外加卖方的利润费用。这类合同在项目范围不确定或风险较高时使用。它提供了灵活性，但存在成本不断攀升的风险。 在工料合同中，买方按实际使用的人工和材料付费，外加利润加成。这类合同通常更适合较小的项目，或范围未明确定义的情况。它提供了灵活性，但需要密切监控以控制成本。 目标成本合同设定一个总体成本目标，并规定在买方和卖方之间分摊成本节约或超支的条款。这类合同提供了灵活性，但要求双方紧密合作以监控效率和成本，因此更适合高度复杂的项目。

单选题 97/180、An organization has a mandate to update its continuous improvement processes regularly, and it provides guidance through written methodologies and development approaches. Although these guides serve as a starting point, the project teams own their own processes, and they are responsible for making project-specific improvements. The project manager has to support the organization’s mandate for ongoing improvement while actively managing the current project. What should the project manager do in this scenario?
一个组织肩负定期更新其持续改进流程的使命，并通过书面方法论和开发方法提供指导。尽管这些指南作为起点，但项目团队拥有自己的流程，并负责进行针对项目的改进。项目经理必须在积极管理当前项目的同时，支持组织持续改进的使命。在此场景下，项目经理应当怎么做?

A. Schedule retrospectives at key milestones during the project to analyze current performance, identify issues, and implement improvements. 在项目关键里程碑处安排回顾会，分析当前绩效，识别问题并实施改进。

B. Use quality assurance tools and techniques such as quality audits and failure analysis to ensure the project’s output will meet or exceed expectations. 使用质量保证工具和技术（如质量审计和失败分析），确保项目的输出达到或超出预期。

C. Hold daily coordination meetings with all team members to share feedback and keep the work of all parts of the team aligned for improvement. 与所有团队成员举行每日协调会，分享反馈并使团队各部分的工作保持一致以促进改进。

D. Update the organizational knowledge repositories with information such as financial performance, lessons learned, and other metrics. 用财务绩效、经验教训和其他指标等信息更新组织知识库。

答案：A

解析：进行中的回顾会是一种结构化过程，在项目生命周期的各个阶段开展，用于分析当前绩效。当团队在项目进行中发现问题时，他们可以立即在后续工作中实施改进。 其余选项均错误： 质量保证工具和技术（如质量审计和失败分析）有助于确保产品或项目最终成果的质量，但其关注点是结果，而非流程的持续改进。 与所有团队成员定期举行协调会，使他们能够分享反馈并保持整个团队工作一致，但保持这种一致本身并不能确保持续改进。 定期用相关项目信息更新组织知识库很重要，但那是维护知识的管理性工作，而非审查流程以寻找改进方法的工作。

单选题 98/180、A construction project is underway. The project manager is concerned about discrepancies between the minor milestones outlined in the project management plan and the order in which the vendor is actually completing them. After discussing it with the vendor, the project manager realizes that certain contingencies have affected the way the vendor has organized their work. However, these contingencies should not prevent the vendor from delivering on schedule. What should the project manager do next?
一个建筑项目正在进行中。项目经理担心项目管理计划中列出的次要里程碑与供应商实际完成这些里程碑的顺序之间存在差异。在与供应商讨论后，项目经理意识到某些意外情况影响了供应商组织工作的方式。然而，这些意外情况不应妨碍供应商按时交付。项目经理下一步应当怎么做?

A. Proceed without changing the plan because the final delivery is still safe, and there is little value in formally documenting low-level exceptions. 不改变计划继续推进，因为最终交付仍然安全，而且正式记录低层级例外情况的价值不大。

B. Adjust the project plan to align with the vendor’s work approach and integrate it with the vendor’s perspective and work outputs. 调整项目计划以与供应商的工作方式保持一致，并将其与供应商的视角和工作产出相整合。

C. Warn the vendor about potential penalties if deliverables are impacted, and closely monitor the situation to determine if intervention is needed. 警告供应商如果可交付成果受到影响将面临的潜在处罚，并密切监控情况以确定是否需要干预。

D. Alert upper management about the deviation from the project management plan in case they decide to replace the vendor. 就偏离项目管理计划的情况提醒高层管理人员，以防他们决定更换供应商。

答案：B

解析：理想的结果是项目计划与供应商的视角和工作产出相整合。如果出现不影响最终可交付成果的差异，则适合根据需要调整项目管理计划，使其与供应商的工作方式保持一致。 其余选项均错误： 只要最终交付仍然安全，不改变计划继续推进可能不会造成问题。但这会降低计划作为准确、权威信息来源的价值。 警告供应商处罚并抱着干预预期进行监控，会有对供应商进行微观管理并轻视其专业能力的风险，还可能产生阻碍可交付成果的意外效果。 就此偏离项目管理计划的情况提醒高层管理人员或许合适，但对供应商的工作方式发出警报可能会造成不必要的压力，并反过来反映项目经理自身技能和判断力的不足。

单选题 99/180、A corporate restaurant chain has opened locations nationwide and needs to maintain food safety. They have encountered issues such as late deliveries, inadequately temperature-controlled transportation, and food contamination. The project manager must determine which issues require immediate attention. What should the project manager do?
一家连锁餐饮企业已在全国开设门店，需要维护食品安全。他们遇到了送货延迟、运输温控不达标和食品污染等问题。项目经理必须确定哪些问题需要立即处理。项目经理应当怎么做?

A. Evaluate each issue separately and prioritize them according to their impact. 分别评估每个问题，并根据其影响进行优先级排序。

B. Develop workarounds for unexpected problems such as food shortages and work with vendors to resolve them. 针对食品短缺等意外问题制定变通方案，并与供应商合作解决。

C. Schedule reviews to determine which location has the highest safety record. 安排审查，确定哪个门店的安全记录最高。

D. Maximize revenue until the food security systems can manage the inevitable loss of revenue from food spoilage. 在食品安全系统能够管理食品变质造成的必然收入损失之前，先使收入最大化。

答案：A

解析：分别评估每个问题并按影响排序，可确保关键问题优先得到处理，支持有效决策并最大限度地降低项目风险。 其余选项均错误： 制定变通方案虽然能解决眼前的问题，但不能确保项目经理识别出哪些问题最为关键，或有效分配资源。 安排审查以比较各门店的食品安全记录，只涉及历史绩效，而非影响项目的当前问题。它无助于项目经理评估每个持续问题的影响，或优先采取行动立即处理关键问题。 专注于收入最大化忽略了影响项目的即时运营问题，如食品变质或配送问题。

单选题 100/180、A project manager has created the stakeholder list for a complex multi-phase project and is deciding how to distribute information effectively to the customer and other key stakeholders. The project involves diverse stakeholder groups with varying information needs and communication preferences. What should the project manager do next?
一位项目经理已经为一个复杂的多阶段项目创建了利益相关方清单，正在决定如何有效地向客户和其他关键利益相关方分发信息。该项目涉及具有不同信息需求和沟通偏好的多元化利益相关方群体。项目经理下一步应当怎么做?

A. Schedule regular face-to-face meetings with all stakeholders to ensure consistent communication and feedback. 与所有利益相关方安排定期的面对面会议，以确保沟通和反馈的一致性。

B. Establish standardized update distributions to all stakeholders including the customer to maintain transparency. 向所有利益相关方（包括客户）建立标准化的更新分发，以保持透明度。

C. Perform stakeholder analysis and develop a communications management plan based on identified needs. 进行利益相关方分析，并基于识别出的需求制定沟通管理计划。

D. Review historical communication practices from projects and adapt methods for stakeholder requirements. 审查以往项目中的沟通实践，并针对利益相关方的需求调整方法。

答案：C

解析：有效的利益相关方沟通要求先系统地分析每位利益相关方的信息需求、偏好的沟通方式和影响力水平，然后再制定分发策略。沟通管理计划可确保针对特定利益相关方需求进行有针对性、高效率的沟通，而非采用通用方法。 其余选项均错误： 安排会议是在未经分析的情况下，假设所有利益相关方都需要相同的频率和形式。 标准化更新将所有利益相关方同等对待，未考虑他们不同的信息需求。 审查历史实践依赖过往做法，而未分析当前项目独特的利益相关方需求。

单选题 101/180、Construction of a luxury resort complex is underway. Midway through development, the CFO requests deferring high-cost features to reduce expenses. The project sponsor argues that these features are essential to ensure customer satisfaction and return on investment. The project team members are divided in their opinions. What should the project manager do?
一个豪华度假综合体项目正在建设中。开发进行到一半时，首席财务官请求推迟高成本的功能以削减开支。项目发起人则认为这些功能对确保客户满意度和投资回报至关重要。项目团队成员意见分歧。项目经理应当怎么做?

A. Support the CFO and defer the most expensive features to control budget and ensure overall project success. 支持首席财务官，推迟最昂贵的功能以控制预算并确保项目整体成功。

B. Facilitate a workshop with the CFO and product sponsor to assess trade-offs using agreed-upon value metrics. 与首席财务官和产品发起人组织一次研讨会，使用商定的价值指标评估权衡取舍。

C. Continue with the original plan because the scope baseline was approved and cannot be altered easily. 继续执行原计划，因为范围基准已获批准，无法轻易更改。

D. Submit a change request for additional funding to cover the cost of the features in question. 提交变更请求，申请额外资金以支付所涉功能的成本。

答案：B

解析：使利益相关方保持一致，可确保关键决策者协同评估潜在权衡取舍对项目价值的影响。保持客观并与组织优先级保持一致，促进在财务和战略成果之间实现最优化的平衡决策。 其余选项均错误： 只关注成本会损害长期价值交付。 僵化地坚持基准忽略了真实的业务价值。申请额外资金会使项目超出原计划预算，造成项目膨胀。

单选题 102/180、A data center hardware manufacturer is designing a new component for enterprise environments. During a planning session, the project sponsor demands that the already tight schedule be shortened by two months to align with a new product launch. The engineering lead warns that critical path tasks cannot be reduced without cutting scope. The client insists that all features must remain in the final version. What should the project manager do?
一家数据中心硬件制造商正在为企业环境设计一款新组件。在一次规划会议期间，项目发起人要求将本已紧张的进度缩短两个月，以配合新产品的发布。工程负责人警告说，在不削减范围的情况下，关键路径任务无法压缩。客户坚持所有功能都必须保留在最终版本中。项目经理应当怎么做?

A. Shorten the schedule as requested and reallocate resources from less critical tasks and projects. 按要求缩短进度，并从不太关键的任务和项目中重新分配资源。

B. Perform a schedule compression analysis and present the trade-offs of fast-tracking to stakeholders. 进行进度压缩分析，并向利益相关方呈现赶工（快速跟进）的权衡取舍。

C. Agree with the engineering lead to protect schedule integrity and meet with the sponsor to explain the decision. 同意工程负责人的意见以保护进度完整性，并与发起人会面解释这一决定。

D. Implement alternative solutions such as outsourcing tasks, hiring temporary staff, or automating processes. 实施替代方案，如外包任务、雇用临时人员或实现流程自动化。

答案：B

解析：项目经理应当对赶工/快速跟进及其权衡取舍进行正式分析。进行进度压缩分析并呈现快速跟进的权衡取舍，可突出潜在风险、对成本和质量的影响，并支持知情且以价值为导向的决策。 其余选项均错误： 重新分配的资源需要针对这个新项目进行培训，而进度压缩会增加失败的风险。 忽视发起人的需求会损害双方关系。 替代方案的实施时间太长，对缩短本已紧张的进度毫无帮助。

单选题 103/180、A construction project for a large commercial complex is underway. The project manager learns of a potential timber shortage from a trusted vendor. This shortage could potentially impact the project timeline and increase costs. What should the project manager do?
一个大型商业综合体的建筑项目正在进行中。项目经理从一家可靠的供应商处得知可能出现木材短缺。这种短缺可能会影响项目进度并增加成本。项目经理应当怎么做?

A. Develop a risk assessment matrix to evaluate risks, and appoint a dedicated risk manager to create a mitigation plan. 制定风险评估矩阵来评估风险，并指定一名专职风险经理制定缓解计划。

B. Initiate a change request and record the outcome in the change log as a project document update. 发起变更请求，并将结果作为项目文件更新记录在变更日志中。

C. Use an iterative approach that combines qualitative and quantitative risk analyses to evaluate the risk. 采用定性风险分析和定量风险分析相结合的迭代方法来评估该风险。

D. Establish relationships with multiple vendors to reduce dependency and minimize risks to the schedule and budget. 与多家供应商建立关系，以减少依赖并最大程度降低进度和预算风险。

答案：D

解析：项目经理应当制定并应用干预策略。使供应商基础多元化有助于缓解材料短缺、延迟或价格上涨带来的潜在风险。通过确保在一家供应商出现问题时仍有替代来源可用，它促进了项目执行的连续性和稳定性。 其余选项效果较差： 制定风险评估矩阵和指定风险经理虽然是有价值的长期实践，但它们无法解决当前木材短缺的风险，也无法减轻其对项目成本和进度的直接影响。 发起变更请求可能之后是必要的，但它无助于项目经理缓解木材短缺的直接风险，或防止进一步的进度和成本影响。 进行风险分析无法立即解决供应链、进度和成本方面的障碍。

单选题 104/180、A vendor's delivery of key components is on the critical path. The vendor informs the project manager that delivery will be delayed by three weeks, but the project sponsor insists that the final deadline is non-negotiable. The procurement manager reminds the project manager about the penalties for late vendor deliveries. The client is concerned that the overall project launch is at risk of being postponed. What should the project manager do?
供应商交付关键组件的工作处于关键路径上。供应商通知项目经理交付将延迟三周，但项目发起人坚持最终截止日期不可协商。采购经理提醒项目经理供应商延迟交付的处罚条款。客户担心整个项目发布存在被推迟的风险。项目经理应当怎么做?

A. Accept the vendor’ s delay and compress any internal tasks to protect the final delivery date. 接受供应商的延迟，并压缩任何内部任务以保护最终交付日期。

B. Assess the schedule impact and discuss recovery options with stakeholders and the vendor. 评估进度影响，并与利益相关方和供应商讨论恢复方案。

C. Request a meeting with the vendor to negotiate accelerating the delivery without accruing additional costs. 要求与供应商会面，协商在不产生额外成本的情况下加快交付。

D. Review the approved vendor list to find a replacement and remove the penalty clause from the new contract. 审查已批准的供应商清单以寻找替代者，并在新合同中删除处罚条款。

答案：B

解析：项目经理应当进行影响分析和协作式恢复规划。评估进度影响并与利益相关方和供应商讨论恢复方案，有助于协作解决问题、做出知情决策，并制定使项目保持正轨的可行策略。其余选项均错误： 不经审查就接受会隐藏风险和影响。压缩内部任务会因过度工作和压力而影响质量。 强制加速忽视了可行性和成本。项目经理应当有一份明确规定价格和交付条款的合同；遵守合同不应产生额外成本。 替代供应商需要时间来在分配好的预算内交付所需组件。

单选题 105/180、A national retail chain has initiated a rebranding project. During an executive review of the project, stakeholders note that milestones are on track and costs are within baseline. The project sponsor warns that low-value features are being released before critical ones. Other stakeholders argue that the schedule was approved and should not change. What should the project manager do?
一家全国性零售连锁企业启动了一个品牌重塑项目。在项目的高管评审中，利益相关方注意到里程碑进展顺利，成本在基准范围内。项目发起人警告称，低价值功能先于关键功能发布。其他利益相关方则认为进度计划已经获批，不应更改。项目经理应当怎么做?

A. Maintain the current schedule to avoid re-baselining and to mitigate potential stakeholder dissatisfaction. 维持当前进度计划，以避免重新确定基准，并减轻利益相关方潜在的不满。

B. Reassess backlog priorities with stakeholders to focus on features delivering the highest business value. 与利益相关方重新评估待办事项列表的优先级，聚焦于交付最高业务价值的功能。

C. Facilitate a meeting among all stakeholders to gather their input and attempt to reach a consensus. 促成一次所有利益相关方的会议，收集他们的意见并尝试达成共识。

D. Log the concern as an issue but continue delivering the features according to the approved business plan. 将该关切记录为问题，但继续按照已获批的业务计划交付功能。

答案：B

解析：项目经理应促成重新确定优先级，以与业务价值保持一致。 其余选项均错误： 在不关注业务价值的情况下维持进度计划，忽视了基本的价值原则。 与利益相关方会面并不能保证达成共识，而且可能影响进度计划。 仅记录问题只是推迟了必要的行动，价值关切仍未得到解决。

单选题 106/180、During a release planning workshop, the client requests advancing the delivery of a high-value analytics dashboard. The dashboard was scheduled for a later phase because it depends on the infrastructure being at least partially stable. Developers argue that advancing it introduces integration risks, although business stakeholders insist that early insights are critical to maintaining market advantage. What should the project manager do?
在一次发布规划工作坊期间，客户请求提前交付一个高价值的分析仪表盘。该仪表盘原计划在后期阶段交付，因为它依赖于基础设施至少部分稳定。开发人员认为提前交付会带来集成风险，而业务利益相关方坚持认为尽早获得洞察对于保持市场优势至关重要。项目经理应当怎么做?

A. Approve early delivery to satisfy business stakeholders and secure immediate competitive advantage. 批准提前交付，以满足业务利益相关方的需求并获得即时竞争优势。

B. Maintain the original schedule because advancing delivery would disrupt baselines and add technical debt. 维持原计划，因为提前交付会扰乱基准并增加技术债务。

C. Facilitate a trade-off analysis with stakeholders to evaluate delivering early value against integration risks. 与利益相关方组织权衡分析，评估提前交付价值与集成风险之间的取舍。

D. Meet with the development team to introduce incremental improvements to avoid major rework in the future. 与开发团队会面，引入渐进式改进，以避免将来进行重大返工。

答案：C

解析：项目经理应当促进与利益相关方就价值与风险的权衡进行对话，使利益相关方能够做出明智的决策。权衡分析促进透明度，使利益相关方的期望保持一致，并有助于确保项目成果在短期收益与长期稳定性之间取得平衡。 其余选项均错误： 立即批准忽视了集成风险。 盲目坚持基准会损害价值交付。 向开发团队引入渐进式改进会违背他们的最佳判断。

单选题 107/180、Various project teams are working together on an agile project. During a portfolio review, the project sponsor observes that many delivery approaches, templates, and team practices have changed significantly from project to project. The sponsor is concerned that existing guidance and knowledge have changed several times and no longer reflect how work is actually being delivered. What should the project manager do?
多个项目团队正在共同参与一个敏捷项目。在一次组合审查期间，项目发起人观察到，许多交付方法、模板和团队实践在不同项目之间存在显著差异。发起人担心现有的指导和知识已多次变更，不再反映工作实际的交付方式。项目经理应当怎么做?

A. Ensure that all team members have reliable online access to project information and attend all coordination meetings. 确保所有团队成员都能可靠地在线访问项目信息，并参加所有协调会议。

B. Update the organizational process assets (OPAs) to ensure they remain effective and aligned with the company's goals. 更新组织过程资产，确保其保持有效并与公司目标保持一致。

C. Encourage the teams to review the service level agreements (SLAs) and statement of work (SOW) relevant to the project. 鼓励团队审查与项目相关的服务水平协议和工作说明书。

D. Refer the teams to historical information, knowledge repositories, and lessons learned logs from similar past projects. 引导团队查阅类似以往项目的历史信息、知识库和经验教训日志。

答案：B

解析：定期更新组织过程资产可确保其保持有效并与公司目标保持一致，有助于维护跨项目和跨项目团队的一致性。更新组织过程资产可确保变更如何获批、记录和沟通的清晰性。这直接回应了发起人的担忧，表明在更好地管理变更、将改进纳入既定流程，以及展示项目产出与组织目标之间的一致性方面做出了刻意努力。 其余选项均错误： 发起人的担忧在于变更的数量，而非信息的访问渠道。 审查服务水平协议或工作说明书可以提供对项目范围和可交付成果的洞察，但无法解决频繁变更这一根本担忧。 历史信息和经验教训日志对决策和避免过往错误很有价值，但无法解决项目变更问题。

单选题 108/180、A large construction company is in the early stages of a hybrid project that combines predictive infrastructure work with adaptive software development. Stakeholders are complaining that the early phases of the project show little visible value because most of the effort is going into infrastructure work, and they are asking for earlier business-facing results. The team lead for the infrastructure work argues that the phase sequencing has been planned and should not change. What should the project manager do?
一家大型建筑公司正处于一个混合型项目的早期阶段，该项目将预测性基础设施工作与适应性软件开发相结合。利益相关方抱怨项目早期阶段几乎没有可见的价值，因为大部分精力都投入了基础设施工作，他们要求更早看到面向业务的结果。基础设施工作的团队负责人认为阶段排序已规划妥当，不应更改。项目经理应当怎么做?

A. Reevaluate sequencing with stakeholders to assess earlier delivery of high-value features without compromising stability. 与利益相关方重新评估排序，以在不损害稳定性的情况下更早交付高价值功能。

B. Defend the original sequencing because infrastructure completion is essential to complete before releasing user features. 坚持原有排序，因为基础设施的完成是发布用户功能之前必不可少的环节。

C. Emphasize the progress achieved on infrastructure in reports to reassure executives that the project is on track. 在报告中强调基础设施方面取得的进展，以安抚高管并表明项目在正轨上。

D. Facilitate a workshop with the infrastructure team to determine how a change in sequence would impact the project. 与基础设施团队组织一次工作坊，确定排序变更将对项目产生何种影响。

答案：A

解析：项目经理应当组织重新排序工作坊，以优化技术和业务成果。通过与利益相关方协作，识别更早交付高价值功能的机会，项目经理帮助在维持系统稳定性和最大限度降低交付风险的同时实现价值最大化。项目经理应当促进与利益相关方和团队的结构化讨论，集思广益如何重新确定工作优先级、识别权衡取舍和风险并达成共识。 其余选项均错误： 不经讨论就坚持排序，是对利益相关方期望更早获得价值的被动反应式回应。 报告进展无法解决可见价值缺失的问题。 基础设施团队不应拥有交付顺序的最终决定权。

单选题 109/180、Some team members from a newly formed team are constantly arguing. The project manager aims to implement a resolution strategy that has the team’s full support and leads to effective conflict resolution. What should the project manager do?
一个新组建的团队中，一些团队成员经常争吵。项目经理旨在实施一项能获得团队全力支持并促成有效冲突解决的策略。项目经理应当怎么做?

A. Speak privately with each team member to address their individual concerns without involving the entire team. 私下与每位团队成员交谈，解决他们个人的顾虑，不牵涉整个团队。

B. Negotiate a compromise on the issue that satisfies all parties involved so the next delivery deadline can be met. 就问题协商达成一个令所有相关方满意的折中方案，以便赶上下一个交付截止日期。

C. Engage the team in constructive dialogue to understand the issue and consider different insights and perspectives. 引导团队进行建设性对话，以理解问题并考虑不同的见解和视角。

D. Advise the team to treat differences of opinion as opportunities for increased conversation and creativity. 建议团队将意见分歧视为增加对话和创造力的机会。

答案：C

解析：团队的直接协作对于正确理解情况是必要的，并且预期是纳入所有观点将促成共识和他们全力的投入。开放的对话有助于建立共同理解、建立信任并促进协作，同时最大程度减少误解。开放的沟通鼓励团队成员自由表达，使他们感到被倾听和被重视。 其余选项均错误： 私下与每位团队成员交谈以尊重地解决他们个人的顾虑是恰当的第一步，但仅凭这一点不太可能解决整个团队的问题，而且可能不会取得任何进展。 说服相关方同意折中方案以赶上下一个截止日期可能是有效的短期策略，但它无法解决根本原因，也无助于创建长期解决方案。 建议团队将意见分歧视为增加创造力的机会是好的建议，应当成为团队规范的一部分，但仅仅给出建议并不是解决根本问题的有效方式，也没有为团队成员提供改变其方法的策略。

单选题 110/180、A Scrum team noticed a trend of work spilling over for the last several sprints. The root cause of this has been identified as the code review task. This bottleneck appears to occur because the team is dependent on an external expert. What should the project manager do first?
一个 Scrum 团队注意到，最近几个冲刺一直存在工作溢出到下一冲刺的趋势。根本原因已被确定为代码审查任务。这个瓶颈之所以出现，是因为团队依赖一名外部专家。项目经理首先应当怎么做?

A. Assess the code review bottleneck, document the issue, and extend the sprint duration to absorb the impact 评估代码审查瓶颈，记录问题，并延长冲刺时长以吸收影响。

B. Evaluate team skills and facilitate targeted upskilling to eliminate reliance on external code reviewers 评估团队技能，并推动有针对性的技能提升，以消除对外部代码审查人员的依赖。

C. Identify and onboard a secondary expert resource to provide redundancy and reduce the risk of delays 确定并引入一名二级专家资源，以提供冗余并降低延误风险。

D. Collaborate with the team to internalize the review process and immediately discontinue external support 与团队协作将审查流程内部化，并立即停止外部支持。

答案：B

解析：最佳长期解决方案是建立内部能力。通过培训团队，依赖被消除，未来的冲刺得到保护，团队自主性得到提升——这与敏捷原则完全一致。 其余选项均错误： 延长冲刺是一种变通办法，而非解决方案。它无法解决根本原因（依赖），并会破坏敏捷的时间盒约束。 增加另一名外部审查人员会增加复杂性，且无法建立可持续的团队能力。 在未确保团队做好准备的情况下突然终止外部专家的参与，会危及质量和交付绩效。

单选题 111/180、A consumer electronics company is developing a new smart speaker. Two weeks before final testing, a marketing director asks the project manager to add voice profiles for children, insisting it is just a small addition. The development team says this will affect data privacy features and extend testing. What should the project manager do?
一家消费电子公司正在开发一款新的智能音箱。在最终测试前两周，一位营销总监要求项目经理为儿童添加语音配置文件，坚称这只是一个小改动。开发团队表示，这将影响数据隐私功能并延长测试时间。项目经理应当怎么做?

A. Approve the change verbally because the sponsor is likely to support it. 口头批准该变更，因为发起人很可能会支持。

B. Reject the request immediately to protect the current project schedule. 立即拒绝该请求，以保护当前的项目进度。

C. Log the request and process it through the established change control for scope impacts. 记录该请求，并通过既定的变更控制流程处理其范围影响。

D. Delegate a member of the team to implement the change and track the impact informally. 委派一名团队成员实施该变更，并非正式地跟踪其影响。

答案：C

解析：营销总监的请求属于范围变更，且发生在项目后期，可能对隐私、测试工作量和进度产生影响。即使它被描述为只是一个小改动，开发团队也已经表明它将影响数据隐私功能并延长测试时间。这必须作为正式的变更请求处理。项目经理应当记录该请求，分析其对范围、进度、成本、质量和风险的影响，并通过既定的变更控制流程处理。这既维护了基准的完整性，也支持透明、基于证据的决策。 其余选项均错误： 未经记录的分析或适当的授权就进行口头批准，会允许在缺乏明确监督的情况下发生范围、进度和成本变更，从而增加风险。 拒绝该请求忽视了该功能的潜在业务价值和战略重要性，尤其是它来自临近发布前提出要求的营销部门。非正式地实施变更会破坏治理，并使项目难以管理和监控。它在未经正式批准或更新基准的情况下增加工作，从而引入范围蔓延。非正式的跟踪意味着对成本、进度、质量和风险的影响可能无法被正确理解或沟通。

单选题 112/180、A local government is launching a community redevelopment project that will involve stakeholders with varying levels of influence and involvement. With so many interested parties and conflicting opinions, the project manager needs to identify the stakeholders who should be involved in governance decisions and engage them to ensure that the project can progress efficiently. How should the project manager proceed?
一个地方政府正在启动一个社区重建项目，该项目将涉及影响力和参与程度各不相同的利益相关方。由于相关方众多且意见相互冲突，项目经理需要识别应参与治理决策的利益相关方，并让他们参与进来，以确保项目能够高效推进。项目经理应如何进行？

A. Schedule weekly community review meetings with open attendance to solicit opinions from all relevant stakeholders, regardless of involvement. 安排开放参加的每周社区审查会议，征求所有相关利益相关方的意见，无论其参与程度如何。

B. Implement a predictive approach and prioritize the involvement of control boards, committees, and other high-influence stakeholders. 实施预测性方法，并优先让控制委员会、指导委员会及其他高影响力利益相关方参与。

C. Execute agreed-upon processes, protocols, and team agreements to categorize stakeholders based on analyzing past projects. 执行已商定的流程、规程和团队协议，基于对以往项目的分析对利益相关方进行分类。

D. Organize a governance board and analyze the specific needs and context of the project to determine which stakeholders should be involved. 组建治理委员会，并分析项目的具体需求和背景，以确定应让哪些利益相关方参与。

答案：D

解析：在确定哪些利益相关方应高度参与项目、哪些更适合在项目的特定时点参与时，应考虑项目独特的需求和背景。建立治理委员会使项目团队能够与关键利益相关方建立联系，并确保项目符合关键期望。 其余选项均错误： 让所有相关方参与日常治理存在引发冲突和延误项目的风险。一个具有如此广泛影响的项目需要关键利益相关方的监督，以确保进展按计划进行并满足更广泛的项目目标。开放参加的社区审查会议应在特定时间举行，即更广泛的意见有利于完善项目目标和成果之时。 虽然让控制委员会、指导委员会和其他高影响力利益相关方参与并将其纳入治理过程很重要，但可能还有其他利益相关方的意见对项目的有效交付至关重要。项目经理必须彻底分析项目独特的需求和优先级，以识别其专业知识或要求将有利于项目治理的任何其他关键利益相关方。 所有流程、规程和团队协议都必须针对当前项目制定，并征得关键利益相关方的同意。以往项目对于收集数据很有用，但仅凭以往经验无法识别相关利益相关方。

单选题 113/180、During a project's execution, a vendor delivers components that pass functional tests but fail durability checks. To avoid delay, the project sponsor wants to accept the components. The client threatens to reject final delivery if these issues persist. The procurement manager notes that durability performance is an integral part of the contract. What should the project manager do?
在项目执行期间，一家供应商交付的组件通过了功能测试，但未通过耐久性检查。为避免延误，

项目发起人想要接受这些组件。客户威胁说，如果这些问题持续存在，将拒绝最终交付。采购经理指出，耐久性性能是合同不可分割的一部分。项目经理应当怎么做?

A. Reject delivery and enforce the durability requirements specified in the contract agreement. 拒绝交付，并强制执行合同协议中规定的耐久性要求。

B. Accept the components to maintain the schedule although durability requirements are not satisfied. 接受这些组件以维持进度，尽管耐久性要求未得到满足。

C. Negotiate with the vendor to accept the components as-is with minor concessions to reduce conflict. 与供应商协商，以小幅让步接受组件现状，以减少冲突。

D. Accept the components as-is and increase the length of the end-user product warranty. 按现状接受组件，并延长终端用户产品的保修期。

答案：A

解析：项目经理应当强制执行合同中的质量标准。拒绝不合规的交付可保护组织的利益、强制问责，并按照商定的期望维持质量和可靠性。 其余选项均错误： 接受劣质材料会破坏合同的质量承诺。 通过非正式让步按现状接受组件，日后可能导致交付被拒收。 接受组件并延长保修期会带来未来成本以及公司声誉受损的风险。

单选题 114/180、A software development company is designing a new application for a management firm that oversees properties across multiple locations. The project manager has implemented an incremental life cycle approach to prioritize customer-requested features. The project manager has compiled these user stories and their estimated values into a table. What feature should the project manager develop and implement first? (Refer to the table)
一家软件开发公司正在为一家管理公司设计一款新应用，该管理公司负责多个地点的物业管理。项目经理已实施增量式生命周期方法，以对客户要求的功能进行优先级排序。项目经理已将这些用户故事及其估算值汇总成一张表格。项目经理应首先开发和实施哪个功能？（参考表格）

功能	用户故事	估算故事点
成本分析	作为物业经理，我希望能够确定盈利能力。	4
每位客人可多次预订	作为预订经理，我希望能够同时为多个房源锁定时间段。	3
容量概览	作为预订经理，我希望能够一眼查看容量。	2
物业入住 / 退房	作为前台职员，我希望能够快速为客人办理入住和退房。	2
排班日历	作为维护经理，我希望能够优先安排维修和保养工作。	1

A. Capacity overview 容量概览

B. Property check-in/out 物业入住 / 退房

C. Scheduling calendar 日程安排日历

D. Cost analysis 成本分析

答案：D

解析：项目经理应首先开发和实施的功能是 "成本分析"，对应的用户故事是："作为物业经理，我希望能够确定盈利能力。" 这是基于按估算故事点进行的优先级排序，更高的故事点通常表示功能具有更大的价值或复杂性。在该表格中，"成本分析" 的估算故事点最高，为 4，因此它是增量式生命周期方法中应首先关注的功能。 其余选项效果较差： 来自预订经理、前台人员和维护经理的用户故事都被分配了较少的故事点，因此它们的功能应按估算故事点的高低顺序实施到新软件中。

单选题 115/180、A stakeholder expresses concern that the project may be falling behind schedule, based on informal conversations with team members. While some tasks have experienced minor delays, these are within allowable float and do not affect the critical path. The project manager follows up immediately and walks the stakeholder through the most recent status report, demonstrating that the overall

timeline remains intact. What should the project manager do next?
一位利益相关方基于与团队成员的私下交谈，表达了对项目可能落后于进度的担忧。虽然一些任务出现了轻微延误，但这些延误在允许的浮动时间内，不影响关键路径。项目经理立即跟进，引导该利益相关方查看最新的状态报告，证明整体时间线仍然完好。项目经理下一步应当怎么做?

A. Send an official communication stating that project status must only be shared through formal channels. 发送正式通知，声明项目状态只能通过正式渠道共享。

B. Add the concerned stakeholder to the distribution list for all upcoming status updates. 将这位表示担忧的利益相关方添加到所有后续状态更新的分发名单中。

C. Review the communications management plan with the team and update it if gaps or informal leaks are identified. 与团队一起审查沟通管理计划，如果发现缺口或非正式信息泄漏，则对其进行更新。

D. Update the format of status reports to emphasize delays with potential critical path impact. 更新状态报告的格式，以强调具有潜在关键路径影响的延误。

答案：C

解析：这是最结构化且最具预防性的方法。它确保准确的项目信息得到恰当共享，避免误解，并强化团队内部以及与利益相关方之间的沟通规程。 其余选项均错误： 虽然控制沟通很重要，但这可能显得过于刻板或防御性过强，并且无法解决沟通不畅的根本原因。 将利益相关方添加到邮件名单有助于提高透明度，但如果不对更广泛的沟通计划进行重新审视，则无法防止将来出现类似误解。 在报告中强调延误细节可能会不必要地突出非关键性延误而令利益相关方困惑，并且无法解决非正式沟通实践中的问题。

单选题 116/180、An architectural firm has designed a building to withstand hurricane conditions. During design testing, the client requests higher performance standards than the standards documented in the requirements. The quality assurance lead warns this would require redesigning the building. To preserve goodwill with the client, the sponsor puts pressure on the project manager to agree. The project

management office insists quality changes must go through governance. What should the project manager do?
一家建筑事务所设计了一栋可抵御飓风条件的建筑。在设计测试期间，客户要求采用比需求文档中记录的标准更高的性能标准。质量保证负责人警告说，这将需要重新设计建筑。为了维护与客户的良好关系，发起人向项目经理施压，要求其同意。项目管理办公室坚持认为质量变更必须通过治理流程。项目经理应当怎么做?

A. Approve higher standards to satisfy the client, although redesign may delay delivery and raise costs. 批准更高的标准以满足客户，尽管重新设计可能延误交付并提高成本。

B. Deny the request to protect baseline scope and communicate with the client to monitor satisfaction. 拒绝该请求以保护基准范围，并与客户沟通以监控其满意度。

C. Facilitate an impact analysis and submit the new standards through a formal change control process. 组织影响分析，并通过正式的变更控制流程提交新标准。


D. Explain to the client how the standards used in the design are sufficient to achieve the client's goals. 向客户解释设计中使用的标准已足以实现客户的目标。

答案：C

解析：项目经理应当在接受之前进行正式的变更控制流程并进行分析。这一行动确保新标准获批的影响在实施之前得到彻底评估。 其余选项均错误： 未经分析就批准会造成不受控制的范围蔓延和质量蔓延。 严格拒绝忽视了潜在价值并损害信任。 在客户想要更多的时候试图说服客户接受当前标准，很可能会失败。

单选题 117/180、Project stakeholders have requested an update on the team’s iteration progress. The project manager shares a burndown chart showing actual remaining work compared to expected remaining work across 10 iterations. After reviewing the chart, some stakeholders would like more information about the project's status at Iteration 9. Based on the burndown chart, what update should the project manager provide regarding the team’s status at Iteration 9?

项目利益相关方要求更新团队的迭代进度信息。项目经理分享了一张燃尽图，图中显示 10 个迭代的实际剩余工作量与预期剩余工作量的对比。查看图表后，部分利益相关方希望进一步了解项目在第 9 个迭代的状态。基于燃尽图，项目经理应如何更新团队在第 9 个迭代的状态?

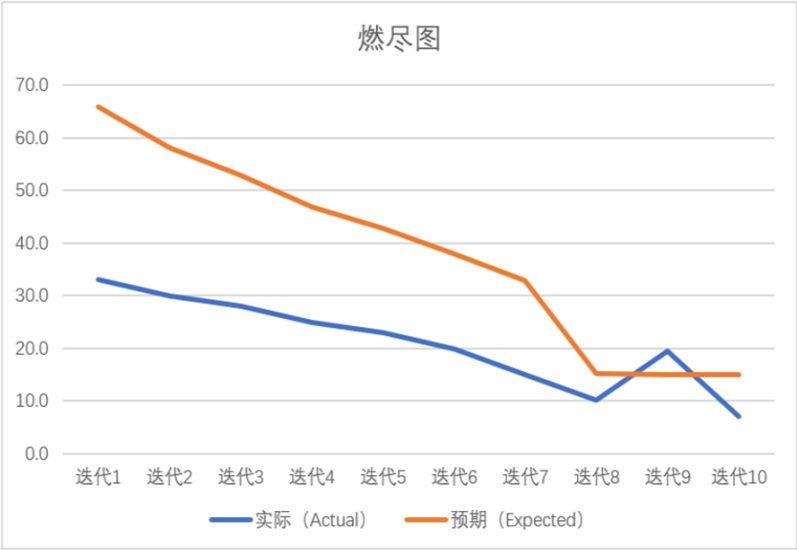

A. The team is progressing slower than planned, as the actual remaining work is higher than the expected remaining work at Iteration 9. 团队进度慢于计划，因为第 9 个迭代的实际剩余工作量高于预期剩余工作量。

B. The team is progressing faster than planned, as the actual remaining work is lower than the expected remaining work at Iteration 9. 团队进度快于计划，因为第 9 个迭代的实际剩余工作量低于预期剩余工作量。

C. The team is progressing exactly as planned, as actual and expected remaining work are equal at Iteration 1. 团队进度与计划完全一致，因为第 1 个迭代的实际与预期剩余工作量相等。

D. The team cannot determine progress because burndown charts do not measure iteration performance. 团队无法确定进度，因为燃尽图不衡量迭代绩效。

答案：A

解析：燃尽图将实际剩余工作量与预期（计划）剩余工作量随时间进行对比。在第 9 个迭代，实际剩余工作量高于预期剩余工作量，这意味着团队完成的工作少于计划，因此进度慢于预期。

其余选项均错误： 在第 9 个迭代，实际剩余工作量高于而非低于预期剩余工作量，数值更低才表示团队进度快于计划。 第 9 个迭代的实际与预期剩余工作量并不相等，因此团队进度并非与计划完全一致。 燃尽图正是通过将剩余工作量与预期趋势随时间进行对比，来衡量并沟通项目进度。

单选题 118/180、A banking company is designing a new user interface for its customers. The project manager needs to monitor progress and ensure that all requirements are tracked and met. To do so, the project manager is developing a requirements traceability matrix. The bank’ s president is requesting that data security be of utmost importance. What should the project manager do to update the requirements traceability matrix (RTM)? (Refer to the RTM)
一家银行公司正在为其客户设计新的用户界面。项目经理需要监控进度，并确保所有需求均被跟踪且得到满足。为此，项目经理正在编制需求跟踪矩阵。银行行长要求将数据安全列为重中之重。项目经理应如何更新需求跟踪矩阵（RTM）？ （参见需求跟踪矩阵）

需求可追溯性矩阵					
项目名称	ABC 银行软件更新				
项目负责人	银行行长				
项目描述	新版银行软件界面				
编号	**功能**	**需求描述**	**来源**	**状态**	**优先级**
RQ-001	A1	用户必须能够查看余额	用户	进行中	最高
	A2	用户必须能够转账资金	用户	未开始	高
	A3	用户必须能够存入支票	用户	已完成	高
	A4	用户必须能够下载数据	IT 部门		中
RQ-002	B1	系统必须发送账单到期日提醒			
	B2	系统必须发送透支提醒			
	B3	系统必须发送最低余额提醒			
RQ-003	C1	系统必须防止交易错误			
	C2	系统必须防止电子邮件投递失败			
	C3	系统必须汇编交易历史			
RQ-004	D1	系统必须支持安全的多因素身份验证（MFA）			
RQ-005	E1				

A. Update the priority of “User must be able to transfer funds” to Medium and set the priority of “User must be able to download data” to Highest. 将"用户必须能够转账"的优先级更新为"中"，并将"用户必须能够下载数据"的优先级设为"最高"。

B. Change the priority of “User must be able to view balance” to High and set the priority of “System must support multi-factor authentication (MFA)” to Highest. 将"用户必须能够查看余额"的优先级改为"高"，并将"系统必须支持多因素身份验证（MFA）"的优先级设为"最高"。

C. Add a new column titled “Order of Completion” and designate “System must support multi-factor authentication (MFA)” as 1. 新增一列，标题为"完成顺序"，并将"系统必须支持多因素身份验证（MFA）"指定为 1。

D. Add the Requirements Description "System must support high performance data protection" for Feature E1 with a priority of High. 为功能 E1 添加需求描述"系统必须支持高性能数据保护"，优先级为"高"。

答案：B

解析：为满足银行行长的要求，项目经理需要将"用户必须能够查看余额"的优先级改为"高"，并将"系统必须支持多因素身份验证（MFA）"的优先级设为"最高"。 其余选项均错误： 其余选项均未满足"数据安全为重中之重"的要求，只有将"系统必须支持多因素身份验证（MFA）"的优先级设为"最高"才能体现这一点。

单选题 119/180、A project selection committee is reviewing three candidate projects using the weighted scoring model shown in the table. Among the evaluated projects, Project 2 ranks the highest. During the meeting, a key stakeholder advocates for selecting Project 1, noting that political support will help secure resources and approvals more efficiently. Several team members prefer Project 3 because its benefits are distributed more evenly across multiple criteria. What should the project manager recommend? (Refer to the table)
项目选择委员会正在使用表中所示的加权评分模型评审三个候选项目。在被评估的项目中，项目 2 得分最高。会议期间，一位关键利益相关方主张选择项目 1，指出政治支持将有助于更高效地获取资源和审批。几位团队成员更倾向于项目 3，因为其收益在多个标准之间分布更均衡。项目经理应给出什么建议？（参见表格）

加权评分模型				
评估标准	权重	项目1	项目2	项目3
支持关键业务目标	60	90	90	50
使用标准技术	20	25	90	50
能在项目时间表内完成	10	20	20	50
提供正的净现值（NPV）	10	50	70	50

A. Support Project 1 because key stakeholder sponsorship is key to project success. 支持项目 1，因为关键利益相关方的支持是项目成功的关键。

B. Support Project 2 because it achieved the highest overall score. 支持项目 2，因为它获得了最高总分。

C. Support Project 3 because it balances benefits across multiple categories. 支持项目 3，因为它在多个类别之间均衡了收益。


D. Request that the steering committee adjust the weighting before making a final decision. 要求指导委员会在做出最终决定前调整权重。

答案：B

解析：项目 2 总分最高，表明它在委员会认为最重要的标准上实现了最大化。这强调了一个使用已批准模型的透明、公平的流程。 加权得分计算： 项目 1 的得分： (90×60%) + (25×20%) + (20×10%) + (50×10%) = 63 + 5 + 2 + 5 = 75 ， 项目 2 的得分： (90×60%) + (90×20%) + (20×10%) + (70×10%) = 63 + 18 + 2 + 7 = 90 ， 项目 3 的得分： (50×60%) + (50×20%) + (50×10%) + (50×10%) = 30 + 10 + 5 + 5 = 50， 其余选项均错误： 支持固然有价值，但项目治理要求遵循商定的评估流程。 均衡标准是主观的，商定的评分模型已经纳入了权重考量。 在过程中途更改权重会损害治理与决策的完整性。

单选题 120/180、During a program review, the program sponsor observes that Risk 1 has the highest exposure on the risk chart and is a substantial threat. The sponsor insists that the project manager escalate this risk to senior management. However,

several team members disagree and believe that the risk should instead be managed through mitigation efforts. Although the team has documented risk thresholds and categories in the risk register, detailed risk response plans have not yet been developed. What should the project manager do? (Refer to the chart)
在一次项目集评审中，项目集发起人观察到风险 1 在风险图上敞口最高，且构成重大威胁。发起人坚持要求项目经理将该风险上报至高级管理层。然而，几位团队成员不同意，认为该风险应通过减轻措施加以管理。虽然团队已在风险登记册中记录了风险阈值和风险类别，但详细的风险应对计划尚未制定。项目经理应怎么做？（参见图表）

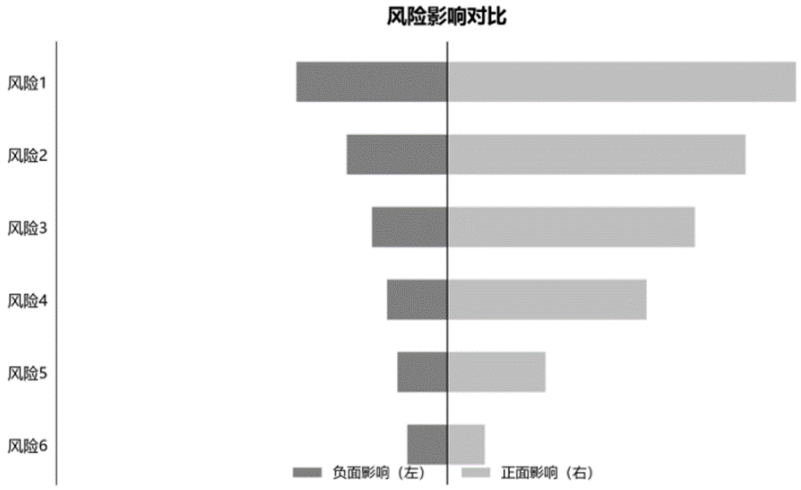

A. Escalate Risk 1 to senior management as requested by the sponsor since the risk exceeds the established threshold. 按发起人的要求，将风险 1 上报至高级管理层，因为该风险超过了既定阈值。

B. Facilitate a team planning session to strategize responses for all prioritized risks, starting with the highest risks. 组织团队规划会议，为所有已确定优先级的风险制定应对策略，从最高风险开始。


C. Monitor all risks in the risk register, but delay response planning until the risk materializes to avoid delaying delivery. 监控风险登记册中的所有风险，但将应对计划制定推迟至风险实际发生之后，以免延误交付。

D. Reassure the sponsor that Risk 1 is recorded in the risk register and continue focusing on project execution activities. 向发起人保证风险 1 已记录在风险登记册中，并继续专注于项目执行活动。

答案：B

解析：优先级较高的风险（如风险 1）通常对项目目标产生负面影响的可能性最大。优先处理这些风险，可确保项目团队将精力集中于减轻或管理最重大的威胁，从而保护项目集的战略成果。这将有助于根据风险的影响和范围，确定该风险应在团队权限内处理，还是应予以上报。团队应向项目集发起人展示研究结果（以风险登记册、风险敞口水平和影响评估为依据），供其讨论，并据此提出基于证据的建议。 其余选项均错误： 上报会将风险所有权转移至高级管理层，且只有在风险超出项目权限时才应进行。如果减轻措施能够在项目层面解决问题，则不应考虑上报。 风险应对策略应在风险规划过程中制定，而非在风险发生之后。仅在风险发生时采取行动是一种被动做法。项目经理不应已确定优先级的风险采取"观望"态度。 回避发起人的关切会损害信任，且无法解决风险敞口问题。

单选题 121/180、A project team is reviewing the cumulative flow diagram (CFD) during a daily coordination meeting. The chart shows that tasks remain stable until Period 7, while the line representing done continues to grow. The sponsor is pleased, but the quality manager warns that work might be rushed, leading to defects. Some team members suggest pulling extra backlog items to use the available capacity. What should the project manager do? (Refer to the chart)
某项目团队在每日协调会议上审查累积流图（CFD）。图表显示，任务在周期 7 之前保持稳定，而代表 "已完成" 的线条持续增长。发起人对此感到满意，但质量经理提醒，工作可能因赶工而导致缺陷。部分团队成员建议拉取额外的待办事项，以利用现有产能。项目经理应当怎么做？（请参考图表）

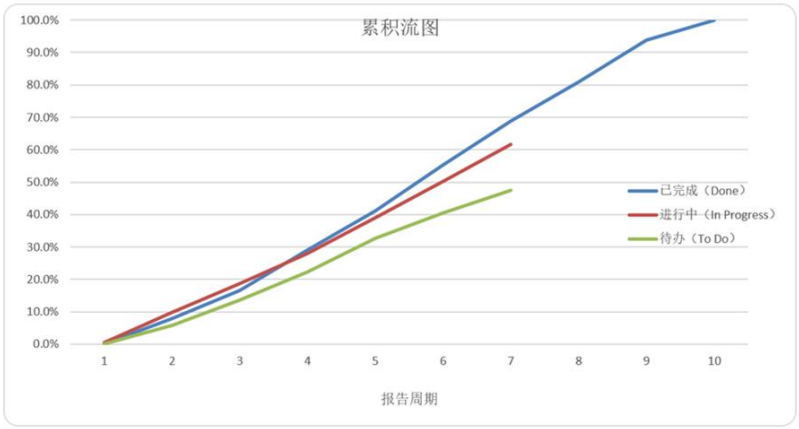

A. Confirm that completed work meets the definition of done and maintain the current sprint scope until the next iteration. 确认已完成的工作满足 "完成的定义"，并在下一迭代之前维持当前冲刺范围。

B. Approve the addition of new backlog items mid-sprint to maximize productivity and maintain the project's momentum. 批准在冲刺中途新增待办事项，以最大化生产力并保持项目势头。

C. Escalate the concern to senior management and request authorization to formally adjust backlog commitments. 将问题上报高级管理层，并请求授权正式调整待办事项承诺。

D. Restrict progress reporting to only high-level updates to reassure stakeholders and prevent unnecessary concerns. 将进度报告限制为仅提供高层级更新，以安抚利益相关方并避免不必要的担忧。

答案：A

解析：所有任务和事项都必须满足 "完成的定义"。在下一迭代之前，范围应保持固定。维持范围并应用 "完成的定义"，可确保交付高质量的工作，并帮助团队保持健康、可预测的节奏，避免因赶工或冲刺过载而产生的不必要风险。 其余选项均错误： 在冲刺中途增加待办事项会破坏时间盒限制，并削弱可预测性。 当前无需上报。待办范围应在项目团队内部进行管理。通过限制报告来隐瞒信息，会破坏透明度的重要性。利益相关方的信心依赖于准确的信息。

单选题 122/180、A large medical office complex is facing staffing and personnel management challenges. Recruitment issues, inadequate training, and high staff turnover are causing costly disruptions to office operations and patient care. Key stakeholders enlist a new project manager to resolve these issues. What should the new project manager do first?
某大型医疗办公综合体正面临人员配备和人事管理方面的挑战。招聘问题、培训不足以及高员工流动率正在对办公运营和患者护理造成代价高昂的干扰。关键利益相关方聘请了一位新项目经理来解决这些问题。新项目经理首先应当做什么？

A. Review the lessons learned document and work with the human resources department to resolve the issues. 审查经验教训文档，并与人力资源部门合作解决问题。

B. Focus on filling critical staff roles and reducing personnel turnover to ensure safe and effective patient care. 专注于填补关键岗位空缺并降低人员流动率，以确保安全有效的患者护理。

C. Work with the IT department to select effective staffing management software and integrate it into existing systems. 与 IT 部门合作，选择有效的员工管理软件并将其集成到现有系统中。

D. Establish clear communication channels among project staff and stakeholders and standardize personnel protocols. 在项目人员和利益相关方之间建立清晰的沟通渠道，并标准化人事规程。

答案：B

解析：解决人员缺口和高流动率问题，直接支持项目的首要目标。如果没有经过培训的员工，运营和护理质量将受到影响，因此这是项目经理的首要任务。聚焦于安全有效的患者护理，将客户放在首位，并维护医疗中心的质量声誉。 其余选项效果较差： 审查经验教训并与人力资源部门协商属于行政性步骤，无法立即解决影响患者护理的人员短缺问题。项目经理需要立即采取行动，填补关键岗位并稳定员工队伍，以确保患者安全和运营连续性。 实施新软件是长期解决方案，无法解决影响患者护理的紧迫人员配备和流动率问题，也未涉及员工培训和流动问题。 虽然改善沟通和标准化流程可以提升协调性，但该措施无法解决直接干扰患者护理的即时人员短缺和流动问题。

单选题 123/180、An internal auditor discovers that a developer has been working on a feature not included in the baseline. The project sponsor argues that the feature adds value and should be retained. The compliance officer warns that this effort could be flagged as uncontrolled work. The project management office insists corrective action is necessary to preserve governance integrity. What should the project manager do?
内部审计师发现，一名开发人员一直在开发一个未包含在基准中的功能。项目发起人认为该功能具有价值，应当予以保留。合规官警告称，这项工作可能被标记为失控工作。项目管理办公室坚持认为，必须采取纠正措施以维护治理的完整性。项目经理应当怎么做?

A. Stop the unauthorized work and initiate a change control request. 停止未授权工作，并发起变更控制请求。

B. Retain the feature because it adds value and is already partly developed. 保留该功能，因为它具有价值且已部分开发完成。

C. Request retroactive sponsor approval to integrate the feature into scope. 请求项目发起人追溯批准，将该功能纳入范围。

D. Facilitate a meeting with the developer to stress the costs of scope creep. 组织一次与开发人员的会议，强调范围蔓延的成本。

答案：A

解析：项目经理应当立即停止所有未授权工作，并通过正式流程处理该变更，以维护治理的完整性。 其余选项均错误： 仅凭价值无法成为绕过治理的正当理由。 追溯批准会削弱权威性与纪律性。 与开发人员开会既无法解决如何处理该功能的问题，也无法改变工作未经授权这一事实。

单选题 124/180、A change control board has approved several changes that will affect the scope of a project. The project manager needs to confirm that the changes have been implemented to ensure their impact on the project scope is kept as

minimal as possible. What should the project manager do?
变更控制委员会已批准多项将影响项目范围的变更。项目经理需要确认这些变更已得到实施，以确保其对项目范围的影响尽可能保持在最小程度。项目经理应当怎么做?

A. Record the disposition of all changes in the project's change log and update it as necessary. 在项目变更日志中记录所有变更的处理结果，并根据需要及时更新。

B. Update the project baseline documents to show the revised expected outcome. 更新项目基准文件，以反映修订后的预期成果。

C. Run quality audits to assess the effectiveness of the changes that have been implemented. 开展质量审计，评估已实施变更的有效性。

D. Meet with stakeholders to obtain feedback on the changes implemented and catalog their responses. 与利益相关方会面，获取其对已实施变更的反馈，并整理记录他们的回应。

答案：C

解析：质量审计可以揭示变更的有效性，并表明变更是否已全面实施。它还可以提供数据，帮助判断变更对项目范围的影响。 其余选项效果相对较弱： 在项目变更日志中记录所有变更的处理结果以保持其最新状态，属于标准项目管理任务，但无法确认变更是否已实施，也无法表明其对项目范围的影响。 更新项目基准文件以传达修订后的预期成果固然重要，但预测对范围的影响发生在确认实际成果之前。 虽然与利益相关方会面并整理记录他们对变更的回应是有益的，但这未必能评估已实施变更的有效性，而质量审计可以做到。

单选题 125/180、At the beginning of a project, the project team identifies specific values the project should provide. As the project progresses, the project manager needs to have a measurement system in place to verify that these intended values are being delivered on track. What should the project manager do?
项目启动时，项目团队确定了项目应提供的特定价值。随着项目推进，项目经理需要建立一套测量系统，以验证这些预期价值正在按计划如期交付。项目经理应当怎么做?

A. Track the spending for each project component to ensure a good return on investment. 跟踪每个项目组件的支出，以确保良好的投资回报率。

B. Create a value breakdown structure (VBS) to connect and deliver the intended value of the product. 创建价值分解结构（VBS），以连接并交付产品的预期价值。

C. Assign each project component a percentage to quantify the value it is expected to add. 为每个项目组件分配一个百分比，以量化其预期增加的价值。

D. Define all the work required to complete the project and eliminate work that will not add value. 界定完成项目所需的全部工作，并消除不会增加价值的工作。

答案：B

解析：VBS 是工作分解结构（WBS）的一种变体，但更进一步，其重点在于将特定价值与相应的项目可交付成果或组件相关联。这些增值估算随后可用于对可交付成果进行优先级排序和跟踪，以确保基于价值的交付。VBS 有助于跟踪和衡量每项活动或组件是否有助于实现项目的预期价值，使项目经理能够监控价值实现的进展，并在出现偏差时做出调整。 其余选项均错误： 虽然跟踪项目成本很重要，但这与跟踪项目特定价值的实现不同，成本很可能只是其中的一个要素。投资回报率是一种间接衡量指标，并非确保价值一致性时的首要关注点。 仅分配百分比无法提供一套完整的系统来验证各组件是否共同实现了项目总体目标。这种方法缺乏 VBS 所提供的组织性和可操作的洞察。 消除不增加价值的工作属于项目范围优化的一部分，并非在整个项目生命周期中衡量价值交付的方法。

单选题 126/180、A software team is halfway through a project to develop a new application. During an iteration review, a stakeholder demands accelerated delivery to beat a competitor’s release of a similar product. The sponsor insists the budget cannot cover overtime, and team members warn that forcing higher velocity will harm quality and morale. The project manager must balance business value with financial constraints, stakeholder alignment, and sustainable team performance What should the project manager do?
一个软件团队正在开发一款新应用程序，项目已进行到一半。在一次迭代审查中，一位利益相关方要求加速交付，以抢在竞争对手发布类似产品之前推出产品。项目发起人坚称预算无法覆

盖加班费用，团队成员也警告说，强行提高速度将损害质量和士气。项目经理必须在商业价值与财务约束、利益相关方一致性以及可持续的团队绩效之间取得平衡。项目经理应当怎么做?

A. Facilitate backlog reprioritization sessions with stakeholders to maximize delivered business value. 与利益相关方组织产品待办事项重定优先级会议，以最大化交付的商业价值。

B. Assess the current team capacity and negotiate achievable commitments for the next iterations. 评估当前团队产能，并就下一迭代可实现的任务承诺进行协商。

C. Maintain the baseline release schedule to preserve quality, stability, and project performance. 维持基准发布计划，以保障质量、稳定性和项目绩效。

D. Approve the accelerated velocity, prioritizing market advantage over project sustainability. 批准加速速度，将市场优势置于项目可持续性之上。

答案：A

解析：与利益相关方组织产品待办事项重定优先级会议，能够直接解决利益相关方之间的冲突，并将重点放在高价值交付上。 其余选项均错误： 评估当前团队产能并就可实现的承诺进行协商，是良好的敏捷实践，但无法解决利益相关方之间相互冲突的优先级。 维持基准发布计划可以保护质量，但忽视了紧迫的业务压力。 批准加速速度，将市场优势置于可持续性之上，违反约束（预算、可持续节奏），并危及质量。

单选题 127/180、An engineering firm is working on a government contract to deliver a highly complex project. Midway through project execution, a key stakeholder is replaced by a new government official with oversight authority. At the next governance review, the new stakeholder criticizes the project team for failing to engage the stakeholder in recent project decisions. What should the project manager do first?
一家工程公司正在执行一份政府合同，交付一个高度复杂的项目。项目执行进行到一半时，一位关键利益相关方被一位拥有监督权的新政府官员接替。在下一次治理审查中，这位新利益相关方批评项目团队未能让其参与近期的项目决策。项目经理首先应当怎么做?

A. Review the communications management plan carefully to confirm that it includes the new stakeholder and make adjustments if needed. 仔细审查沟通管理计划，确认其已包含这位新利益相关方，并在需要时做出调整。

B. Meet with the stakeholder to review all recent changes thoroughly and formally request their approval to validate past project decisions. 与这位利益相关方会面，全面审查近期所有变更，并正式请求其批准，以确认过往项目决策。

C. Update the stakeholder register and conduct tailored onboarding to integrate the stakeholder into project communications and decision-making. 更新利益相关方登记册，并进行量身定制的入职引导，使该利益相关方融入项目沟通与决策流程。

D. Identify potential compromises or project adjustments that could satisfy the stakeholder’s expectations without revisiting previous formal approvals. 识别可能满足该利益相关方期望的折中方案或项目调整，而无须重新审视先前的正式批准。

答案：C

解析：通过更新登记册，项目经理可确保所有相关利益相关方（包括本场景中的新利益相关方）在角色、优先级、影响力与期望方面均得到考虑。量身定制的入职引导可确保利益相关方无缝融入项目。 其余选项效果相对较弱： 更新沟通管理计划固然重要，但正式流程应从更新利益相关方登记册开始，随后再推动沟通计划的更新。 与利益相关方会面以获得其对过往决策的批准，为时过早。他们需要先得到妥善的入职引导，才能做出信息充分的决策。新利益相关方不应追溯批准已经做出的决策。 识别折中方案体现了灵活性与协作，但忽略了正式的参与流程，并有范围蔓延的风险。解决不满需要让该利益相关方在商定的流程内参与，而不是在此阶段不必要地重新审视项目决策。

单选题 128/180、A mid-sized city has approved a project to construct a new civic center. The project has a sufficient budget but a tight execution timeline. Because of its central location and prominence, many stakeholders will contribute requirement details and provide feedback. The project manager must define the scope for formal approval. What should the project manager do?
某中型城市已批准一个建造新市政中心的项目。项目预算充足，但执行时间表紧凑。由于其位

于市中心且备受瞩目，许多利益相关方将提供需求细节并反馈意见。项目经理必须定义范围以供正式批准。项目经理应当怎么做?

A. Create the project scope baseline with a clear work breakdown structure (WBS). 制定包含清晰工作分解结构（WBS）的项目范围基准。

B. Design an iterative approach that enables the project team to refine the project' s scope continuously. 设计一种迭代方法，使项目团队能够持续细化项目范围。

C. Refine product backlog to provide the team with a baseline for managing scope. 完善产品待办事项列表，为团队提供管理范围的基准。

D. Include a milestone for scope freeze in the project schedule to allow evaluation of the project's scope. 在项目进度计划中加入范围冻结里程碑，以便对项目范围进行评估。

答案：A

解析：在预测型环境中（如建筑项目），项目范围基准正式界定了经批准的项目边界、可交付成果和目标。清晰的工作分解结构（WBS）将范围分解为可管理的组成部分，从而支持对项目工作进行有效的规划、分配和控制。 其余选项均错误： 采用迭代方法并组织产品待办事项列表，是在敏捷环境中定义范围的适当方法，但不适用于此类项目：正式批准的范围是确保按时交付、材料与人工成本、遵守相关法规以及防止范围蔓延所必需的。 设置范围冻结里程碑针对的是控制或限制范围变更，而非最初定义范围。本题问的是项目经理应如何定义项目范围。

单选题 129/180、A marketing firm focused on long-term success is evaluating past project performance. The project sponsor wants to ensure that strategies shown to produce better outcomes are applied to the current project. The sponsor has asked the project manager to determine whether key stakeholders are making informed decisions and implementing effective change strategies. What should the project manager do?
一家以长期成功为目标的营销公司正在评估过往项目绩效。项目发起人希望确保已被证明能产生更好结果的策略应用于当前项目。发起人已要求项目经理判断关键利益相关方是否在做出明智决策并实施有效的变革策略。项目经理应当怎么做?

A. Conduct interviews and surveys for insight into stakeholders' behaviors to ensure they align with the company's strategic goals. 开展访谈和调查，深入了解利益相关方的行为，确保其与公司的战略目标保持一致。

B. Control project costs and leverage technology until stakeholders' observed behaviors align with the company's strategic goals. 控制项目成本并利用技术，直至所观察到的利益相关方行为与公司的战略目标保持一致。

C. Define strategic goals more clearly through the use of project milestones to improve communications with key stakeholders. 通过使用项目里程碑更清晰地定义战略目标，以改善与关键利益相关方的沟通。

D. Develop workgroups to assess past performance and identify strategies so key stakeholders can make informed decisions. 组建工作组评估过往绩效并识别策略，使关键利益相关方能够做出明智决策。

答案：A

解析：开展访谈和调查，深入了解利益相关方的行为，确保其与公司的战略目标保持一致，是实施更好变革策略的最直接方式。 其余选项均错误： 控制项目成本和利用技术是有用的工具，但并未专门针对利益相关方对变革策略的实施。 通过使用项目里程碑更清晰地定义战略目标，可以改善与公司关键利益相关方的沟通，但要应对变革策略，还需要更稳健的方法。 组建工作组有助于评估过往绩效，但不足以识别出能使关键利益相关方在未来应对变革时做出明智决策的策略。

单选题 130/180、During the development of the work breakdown structure (WBS), the project manager is asked by the sponsor to demonstrate how the defined scope will be directly tied to both the budget and the schedule. Several stakeholders argue that simply documenting the scope in the WBS dictionary or the scope baseline will be sufficient. What should the project manager do?
在制定工作分解结构（WBS）期间，发起人要求项目经理证明已定义的范围将如何与预算和进度计划直接挂钩。若干利益相关方认为，仅在 WBS 词典或范围基准中记录范围就足够了。项目经理应当怎么做?

A. Establish control accounts that integrate scope with budget and schedule. 建立控制账户，将范围与预算和进度计划整合起来。

B. Document the scope baseline, which includes the WBS and deliverables. 记录范围基准，其中包含 WBS 和可交付成果。

C. Expand the WBS dictionary to include detailed cost and schedule data. 扩展 WBS 词典，纳入详细的成本与进度数据。

D. Create planning packages for work that has not yet been fully defined. 为尚未完全定义的工作创建规划包。

答案：A

解析：控制账户是一个管理控制点，范围、预算、实际成本和进度计划的整合在此发生。控制账户可以纳入 WBS 和组织分解结构（OBS），充当两者之间的纽带，以对特定项目组成部分保持系统性控制。每个控制账户通常包含一个或多个工作包，每个工作包均与单一控制账户相关联。它提供了一种结构化方式来监控成本、进度计划和范围基准。 其余选项均错误： 范围基准定义范围，但不与成本和进度计划整合。 WBS 词典提供可交付成果的详细信息，但不提供范围、成本或进度计划的整合。 规划包涵盖未定义的工作，而非范围与预算的整合。

单选题 131/180、An agile project team encounters a technical issue that requires a design modification. During the daily coordination meeting, the scrum master explains to stakeholders why the modification is needed and emphasizes that the team should continue working toward stable velocity. The scrum master must handle the situation in alignment with agile practices and governance. What should the scrum master do next?
一个敏捷项目团队遇到需要设计修改的技术问题。在每日协调会议期间，敏捷教练向利益相关方解释为何需要该修改，并强调团队应继续朝着稳定的速度开展工作。敏捷教练必须按照敏捷实践和治理来处理该情况。敏捷教练下一步应当怎么做?

A. Review the product backlog items related to the change and request additional funding from stakeholders. 审查与该变更相关的产品待办事项列表项，并向利益相关方请求额外资金。

B. Assess the modification’s impact on backlog priorities, velocity, and deliverables before agreeing on next steps. 在商定后续步骤之前，评估该修改对待办事项列表优先级、速度和可交付成果的影响。

C. Facilitate a team discussion on the risks and benefits of implementing the modification now versus later. 主持团队讨论，评估现在实施该修改与以后实施的利弊。

D. Consult stakeholders on adding resources to the team to accelerate the implementation of the modification. 与利益相关方协商为团队增加资源，以加快该修改的实施。

答案：B

解析：敏捷教练应在决定待办事项列表变更或资源行动之前，通过开展影响分析来评估该修改的影响。这有助于做出明智决策，并符合敏捷原则——即透明度、适应性，以及在不无谓干扰团队速度或项目目标的前提下持续交付价值。一旦影响明确，敏捷教练即可更好地确定优先级、主持讨论或在需要时与利益相关方沟通。 其余选项均错误： 请求额外资金假定资金是直接解决方案，而未考虑设计修改的更广泛影响。资源与资金调整应仅在全面影响评估之后进行。未先评估影响就主持讨论，可能导致决策缺乏依据。 增加资源（或加快工作）是一项重大决策，可能会扰乱团队或导致注意力分散。在考虑资源调整之前，评估修改的范围及其可行性至关重要。

单选题 132/180、A product team developing a new mobile banking feature struggled in their last sprint. Several product backlog items were too complex, lacked acceptance criteria, and caused churn. Stakeholders complained that feedback was not incorporated consistently, and new team members felt lost due to missing documentation. In the retrospective, the product owner asks how to avoid these issues in future sprints. What should the project team do?
一个开发新手机银行功能的产品团队在上一个冲刺中遇到了困难。若干产品待办事项列表项过

于复杂、缺乏验收标准，并导致了返工。利益相关方抱怨反馈未能持续纳入，新团队成员也因文档缺失而感到无所适从。在回顾会上，产品负责人询问如何避免这些问题在未来冲刺中再次出现。项目团队应当怎么做?

A. Decompose the high-priority product backlog epics into tasks with the product owner to create items for the sprint backlog. 与产品负责人一起将高优先级的产品待办事项列表史诗分解为任务，以创建冲刺待办事项列表项。

B. Hold regular product backlog refinement sessions to create small, clear, testable items that are ready for sprint planning. 定期举行产品待办事项列表细化会议，创建小而清晰、可测试且可供冲刺规划使用的条目。

C. Add more descriptive detail to the near-term product backlog items to create readiness, even if acceptance criteria are incomplete. 为近期产品待办事项列表项添加更多描述性细节以使其就绪，即使验收标准不完整。

D. Instruct the product owner and the stakeholders to review the sprint backlog items to approve them against the quality standards. 指示产品负责人和利益相关方审查冲刺待办事项列表项，依据质量标准对其进行批准。

答案：B

解析：待办事项列表细化是一项协作性、持续进行的活动，在此过程中，产品待办事项列表项被分解为小而清晰、可测试、可供冲刺规划使用的用户故事。 其余选项均错误： 让产品负责人参与是合适的，但分解应发生在产品待办事项列表细化期间，而非用于创建冲刺待办事项列表项。 添加描述性细节属于渐进明细的一部分，但推迟验收标准会损害就绪状态；验收标准应在冲刺规划之前商定。 产品负责人和利益相关方提供输入，但依据质量标准审查冲刺待办事项列表项以供批准，错置了问责主体。团队拥有冲刺待办事项列表并负责质量。

单选题 133/180、A manufacturing company is revising one of its most popular products. The market is highly competitive, with competitors releasing updated versions quickly to capture customer interest. The sponsor worries that waiting until the entire product is complete before release will delay feedback and risk customer

dissatisfaction. The marketing team stresses that incremental customer exposure could improve satisfaction and strengthen brand awareness. The design team warns that feature dependencies might delay early delivery. What should the project manager do?
一家制造公司正在改版其最受欢迎的产品之一。市场竞争激烈，竞争对手纷纷快速发布更新版本以抢占客户关注。发起人担心等到整个产品完成后再发布会延迟反馈，并导致客户不满。营销团队强调，增量式的客户接触可以提升满意度并增强品牌认知度。设计团队则警告称，功能依赖关系可能会延迟早期交付。项目经理应当怎么做?

A. Deliver only essential product functions first, and then expand later updates with structured staged releases. 先只交付必要的产品功能，再通过结构化的分阶段发布来扩展后续更新。

B. Conduct structured customer focus groups before rollout to validate expectations, insights, and feedback. 在发布前开展结构化的客户焦点小组，以验证期望、洞察和反馈。

C. Prioritize revisions for the high-demand product features and release them incrementally for early feedback. 优先改版高需求的产品功能，并增量发布以尽早获取反馈。

D. Identify the major dependencies among product features before deciding on the incremental delivery approach. 在决定增量交付方法之前，识别产品功能之间的主要依赖关系。

答案：C

解析：项目经理应优先改版高需求的产品功能，并增量发布以尽早获取反馈。以增量方式先交付价值最高的功能，可以更早创造业务价值、更快获得客户反馈，并支持竞争定位。这正是发起人和营销团队所要求的。 其余选项均错误： 先只交付必要的产品功能、再扩展后续更新，属于按顺序进行的功能交付，更接近预测型/瀑布式思维。它未强调价值驱动的优先级排序，也未满足增量价值的要求。 在发布前开展结构化的客户焦点小组可以收集洞察，但并未发生增量交付。只有反馈而不发布产品增量，会延迟价值交付。 先识别产品功能之间的主要依赖关系是一种有用的规划工具，但本身并不交付客户价值。它是在确定增量价值交付策略之后的次要步骤。

单选题 134/180、A local radio station has been bought by a larger syndicate that will adjust daily operations. The parent company has hired a project manager to evaluate the impact of the acquisition. The project manager must identify actions to minimize disruption to daily operations. What should the project manager do?
一家本地广播电台被一家更大的集团收购，该集团将调整日常运营。母公司聘请了一名项目经理来评估此次收购的影响。项目经理必须识别能够最大限度减少对日常运营干扰的行动。项目经理应当怎么做?

A. Conduct a 360-degree assessment of the acquisition and share results via a feedback matrix. 对收购开展 360 度评估，并通过反馈矩阵分享结果。

B. Perform a program evaluation and review technique (PERT) assessment and a task breakdown. 执行计划评审技术（PERT）评估和任务分解。

C. Use the awareness, desire, knowledge, ability, and reinforcement (ADKAR) model. 使用意识、渴望、知识、能力和强化（ADKAR）模型。

D. Perform a change impact assessment (CIA) and then execute an impact matrix. 执行变更影响评估（CIA），然后编制影响矩阵。

答案：D

解析：项目经理应使用变更影响评估（CIA）来确定变更对项目范围、时间表和资源的影响，然后使用影响矩阵来确定所需采取的行动。 其余选项均错误： 360 度评估是从各个方向收集反馈，用于对个人进行人员评估和发展。反馈矩阵通过将反馈归类到结构化象限中来组织反馈。PERT 评估有助于规划、安排和协调复杂项目。任务分解用于将复杂项目分解为更易于管理的任务。这些工具均未专门针对组织变更和干扰因素。众多模型可用于成功的变更管理培训。ADKAR 模型由 Jeff Haitt 开发，侧重于个人在适应变更时所经历的五个连续步骤（意识、渴望、知识、能力、强化）。这些培训模型和 ADKAR 模型均未专门针对组织变更对项目的影响，也未确定所需采取的行动。

单选题 135/180、An agricultural equipment manufacturer has finalized production of a new tractor that is subject to government regulations. During inspection, the team

discovers several critical defects. The quality assurance manager warns that the defects violate regulatory standards. To avoid extra costs for rework, the finance manager wants to ship the tractor anyway, claiming fixes can be made during the warranty period. What should the project manager do next?
一家农用设备制造商已完成一款新型拖拉机的生产，该产品受政府法规约束。在检验期间，团队发现了若干严重缺陷。质量保证经理警告称，这些缺陷违反了监管标准。为避免返工带来的额外成本，财务经理仍希望将拖拉机发货，声称修复可以在保修期内进行。项目经理下一步应当怎么做?

A. Approve shipment to protect the schedule and cost, with the expectation that compliance standards will change. 批准发货以保护进度和成本，并预期合规标准将会改变。

B. Stop release until defects are rectified, ensuring compliance and meeting required quality standards. 在缺陷修复之前停止发布，确保合规并满足所需的质量标准。

C. Schedule a limited product release with unresolved defects, and plan fixes for later under warranty obligations. 安排带未解决缺陷的限量产品发布，并计划在保修义务下稍后修复。

D. Address all easily resolved defects and ensure that product shipments can be deployed on schedule. 解决所有易于修复的缺陷，确保产品能够按期发货部署。

答案：B

解析：项目经理应在产品发布之前处理质量和合规问题。此举可确保只交付满足质量和合规要求的产品。在缺陷纠正之前暂停发布，可保护利益相关方、维护项目完整性，并防止潜在的返工或声誉损害。 其余选项均错误： 不能为了满足发起人的要求而牺牲合规性。没有理由相信合规标准会改变。 部分发布忽视了严重缺陷，并会带来未来的责任。 未解决所有必要缺陷就发货，会损害质量保证和项目治理。

单选题 136/180、A project manager is designing guidelines for a new product development team. The project manager is new to this industry and is unfamiliar with the company's operational style. The project manager needs to align the project

management approach with the organizational culture. What factor should the project manager prioritize to achieve this goal?
一名项目经理正在为新产品的开发团队设计指南。该项目经理刚进入这个行业，不熟悉公司的运营风格。项目经理需要使项目管理方法适应组织文化。为实现这一目标，项目经理应优先考虑哪个因素?

A. The organization’ s reporting structure, which determines who is ultimately responsible for the project’ s success. 组织的汇报结构，它决定了最终对项目成功负责的人。

B. The organization’ s history of corporate sponsorships, which shows the image it wants to convey. 组织的企业赞助历史，它体现了组织想要传达的形象。

C. The organization’ s tolerance for uncertainty and change, which affects how flexible or rigid the schedule can afford to be. 组织对不确定性和变更的容忍度，它影响进度计划可以灵活或刚性的程度。

D. The organization’ s product development budget, which provides an idea of how highly the organization values this project. 组织的产品开发预算，它反映了组织对该项目的重视程度。

答案：C

解析：进度计划方法在很大程度上受组织对不确定性和变更的容忍度影响：从适应性文化接受灵活流动的进度计划，到风险规避文化要求详细、固定的进度计划。了解组织文化及其背后的行业规范，将帮助项目经理选择正确的方法。 其余选项均错误： 汇报结构是一个固定因素，不会受到项目管理方法的影响，尽管该结构中人员的相互联系方式会受到文化的影响。 企业赞助历史或许能体现组织的价值观，但作为外部环境因素，它不太可能帮助展示组织如何管理内部项目。 产品开发预算的规模反映了项目的规模和重要性。预算规模会影响所需的治理程度，但不会揭示处理该预算时可能有所助益的文化影响。

单选题 137/180、An internal auditor finds several gaps in the company's adherence to quality processes. The project sponsor argues the gaps are minor and should not

delay progress. The quality assurance manager insists that corrective actions must be implemented before continuing. The project management office warns that ignoring these findings could harm compliance certifications. What should the project manager do to ensure compliance?
一名内部审计师发现公司在质量流程遵循方面存在若干差距。项目发起人辩称这些差距很小，不应延误进度。质量保证经理坚持必须在继续之前实施纠正措施。项目管理办公室警告称，忽视这些发现可能会损害合规认证。为确保合规，项目经理应当怎么做?

A. Overlook minor gaps to keep the schedule intact, even if compliance certification may later be compromised. 忽视小的差距以保持进度不变，即使合规认证日后可能受到影响。

B. Postpone corrective actions until project closeout to reduce process disruption now, but raise risks later in the project life cycle. 将纠正措施推迟到项目收尾阶段，以减少当前流程干扰，但会在项目生命周期后期增加风险。

C. Arrange a meeting with project stakeholders to discuss the specific requirements for compliance certifications related to this project. 与项目利益相关方安排会议，讨论与本项目相关的合规认证的具体要求。

D. Implement corrective actions immediately to ensure adherence to quality standards before resuming project work. 立即实施纠正措施，确保在恢复项目工作之前遵循质量标准。

答案：D

解析：当发现质量问题时，项目经理应立即实施纠正措施。立即实施纠正措施可维护项目完整性、减少返工，并支持持续交付高质量成果。 其余选项均错误： 忽视差距不符合职业道德，并可能导致认证失败。 推迟纠正措施会增加隐藏缺陷的可能性。 让利益相关方知情很重要，但仅仅与利益相关方讨论合规问题并不能主动解决当前问题。

单选题 138/180、The project is progressing based on a strategic plan that includes stakeholder-aligned milestones. As execution continues, the team encounters

additional tasks and new dependencies that were not identified during planning. These issues are affecting progress, and the team is unclear about who holds responsibility for making decisions and taking action on these items. What should the project manager do?
项目正依据一项包含利益相关方一致认可的里程碑的战略计划推进。随着执行继续，团队遇到了规划期间未识别出的额外任务和新的依赖关系。这些问题正在影响进展，且团队不清楚谁负责就这些事项做出决策和采取行动。项目经理应当怎么做?

A. Apply the responsibility assignment matrix (RACI chart) to clarify ownership of tasks and decision points. 应用责任分配矩阵（RACI 图）来明确任务和决策点的归属。

B. Refer to the Gantt chart to confirm timeline constraints and keep work aligned with milestone targets. 参考甘特图确认时间表约束，使工作与里程碑目标保持一致。

C. Escalate the matter to project sponsors to determine who should take responsibility for the new items. 将此事上报给项目发起人，由其决定谁应负责这些新事项。

D. Review the work breakdown structure (WBS) to verify that all scope elements have been captured. 审查工作分解结构（WBS），核实所有范围要素均已涵盖。

答案：A

解析：RACI 图是明确每项任务的负责人、问责人、咨询人和告知人的适当工具。当角色不明确且执行期间出现新工作时，它尤其有用。 其余选项均错误： 甘特图显示时间表和顺序，但不明确角色或决策权限。 过早向发起人上报可能反映出团队领导不力，并绕过了旨在内部澄清的工具。 WBS 侧重于可交付成果和范围，而非任务归属或决策角色。

单选题 139/180、A renewable energy project is halfway through execution. The product owner alerts the project manager that external stakeholder expectations are shifting due to new market conditions. The product owner warns that if the project manager does not maintain alignment, the project might deliver outcomes that no longer meet stakeholder needs. What should the project manager do?
一个可再生能源项目正处于执行中途。产品负责人提醒项目经理，由于新的市场条件，外部利

益相关方的期望正在发生变化。产品负责人警告称，如果项目经理不能保持一致，项目交付的成果可能不再满足利益相关方的需求。项目经理应当怎么做?

A. Assign a team member to monitor stakeholder sentiment and provide monthly reports to the internal customer. 指派一名团队成员监控利益相关方情绪，并向内部客户提供月度报告。

B. Conduct a mid-project workshop with the project team to collaboratively prioritize and validate project goals and outcomes. 与项目团队开展一次项目中期研讨会，共同确定优先级并验证项目目标和成果。

C. Initiate discussions with stakeholders to gain an understanding of the new market conditions and their evolving expectations. 与利益相关方展开讨论，了解新的市场条件及其不断变化的期望。

D. Develop a change control process to freeze scope and prevent further expectation changes from being introduced. 制定变更控制流程，冻结范围并防止引入进一步的期望变更。

答案：C

解析：当利益相关方期望在项目执行期间因新的市场条件而发生变化时，项目经理必须迅速采取行动，重新评估并使项目目标与利益相关方需求重新对齐。这应包括举行利益相关方会议或访谈，以厘清这些变化如何影响其需求和优先级。 其余选项均错误： 监控情绪是有用的，但无法有效适应并保持一致。 与项目团队开展研讨会很有价值，但还不够。没有利益相关方的参与、反馈和沟通，就无法考察利益相关方期望的转变如何影响项目范围、成功标准和预期成果。 冻结范围只是回避变更，无法解决期望持续变化以及各方无法对齐的风险。

单选题 140/180、A project manager is analyzing the features and relationships of all components of the project management plan to determine their potential risks. The project manager needs to quantify the project' s financial risks to allocate an appropriate amount of contingency funding. What should the project manager do first?

一名项目经理正在分析项目管理计划所有组成部分的特征和关系，以确定其潜在风险。项目经理需要量化项目的财务风险，以便分配适当数额的应急资金。项目经理首先应当怎么做?

A. Conduct a root-cause analysis to identify and document the underlying causes of the project's financial risk exposure. 开展根本原因分析，识别并记录项目财务风险敞口的根本原因。

B. Perform a reserve analysis to evaluate the project’s risks and determine whether the reserve is sufficient to cover them. 执行储备分析，评估项目风险并确定储备是否足以覆盖这些风险。

C. Perform a sensitivity analysis to determine which risks have the highest potential impact on the budget. 执行敏感性分析，确定哪些风险对预算的潜在影响最大。

D. Create a probability and impact matrix to visualize the likelihood and financial impact of each identified risk. 创建概率和影响矩阵，以可视化呈现每项已识别风险的发生可能性和财务影响。

答案：B

解析：储备分析是一种评估项目风险与应急储备中持有的进度和预算数额对比情况的技术。其目的是确定储备资金对风险而言是否充足。 其余选项效果较差： 根本原因分析是一种识别项目财务风险基本根本原因的工具。当风险未被充分理解时，它有助于解决问题，但其目的并非确定应急资金的数额。 敏感性分析是一种确定哪些单个项目风险对预算的潜在影响最大的工具。它将项目结果的变动与定量风险分析模型要素的变动相关联，有助于制定策略，但不涉及应急资金。 概率和影响矩阵用于映射每项风险发生的概率以及一旦发生对项目目标的影响程度。矩阵呈现方式有助于厘清整个项目中威胁与机会之间的关系，但并未专门针对应急储备。

单选题 141/180、A project is operating on schedule under an approved set of assumptions. The project manager is informed of a major organizational restructuring. This change will not end the project but will constrain its funding and require a re-evaluation of its scope. What action should the project manager take first?

某项目在已批准的假设条件下按计划运行。项目经理获悉组织将进行重大重组。这一变更不会终止项目，但会限制项目资金，并要求重新评估项目范围。项目经理首先应当采取什么行动?

A. Update the communications management plan with a strategy for conveying this change to the stakeholders. 更新沟通管理计划，制定向利益相关方传达这一变更的策略。

B. Revise the risk management plan to record this unexpected change and provide a risk analysis to clarify its potential impact on the success of the project. 修订风险管理计划，记录这一意外变更，并提供风险分析，以阐明其对项目成功的潜在影响。

C. Review the organization’ s established methodologies and lessons learned and rewrite the project plan to ensure required updates follow established process governance. 审查组织既定的方法论与经验教训，重写项目计划，以确保所需更新遵循既定的流程治理。

D. Reduce the budget by the percentage required by the change and lengthen the schedule baseline as a solution. 按变更要求的比例削减预算，并延长进度基准作为解决方案。

答案：A

解析：首要任务是调整项目管理计划，缩小项目范围，以适应新受限的预算；随后应更新沟通管理计划，制定传递这一新信息的策略。 其余选项均错误： 风险管理计划描述的是如何处理潜在的未来风险，而非记录已经发生的事件。该计划可能需要进行更新，但此类更新应是对项目管理计划主体更新的补充；而且，对于已经发生的事件，无需进行风险分析。 由于该情形仅需对现有项目管理计划进行调整，而非创建全新计划，因此没有必要再次深入研究组织既定的方法论。 虽然必须处理由这一情况变化导致的预算削减，但延长进度基准并非自动得出的答案。利益相关方须共同讨论各项方案，并作为一个团队就解决方案达成一致。

单选题 142/180、A project is being initiated as part of a larger business program. The project manager must identify the components of the project to ensure that it delivers value-based outcomes. What should the project manager do?

某项目作为更大业务项目集的一部分启动。项目经理必须识别项目的组成部分，以确保其交付以价值为基础的成果。项目经理应当怎么做?

A. Rank the value components by cost variance and present the list to all stakeholders for review and approval. 按成本偏差对价值组成部分进行排序，并将清单提交给所有利益相关方审查和批准。

B. Optimize the workflows of all project components to maximize value by avoiding waste. 优化所有项目组成部分的工作流程，通过避免浪费来实现价值最大化。

C. Collaborate with stakeholders to understand business objectives and define the project’s value components. 与利益相关方协作，了解业务目标，并定义项目的价值组成部分。

D. Establish measurable metrics, such as return on investment, to evaluate the project’s success. 建立可衡量的指标（如投资回报率）来评估项目的成功。

答案：C

解析：由于该项目属于项目集的一部分，它需要与项目集的价值保持一致。项目经理应与利益相关方、发起人以及业务 / 项目集团队合作，共同定义收益、成果和价值组成部分（有形与无形）。 其余选项均错误： 编制项目组成部分中费用最高与最低的总清单可能是有用的做法，利益相关方或许希望在流程的某个阶段对其进行审查和批准。但是，在尚未对价值组成部分形成全面概览之前，仅深入审视成本无法呈现完整图景。 优化所有项目组成部分的工作流程是个好方案，项目经理也希望避免浪费、实现价值最大化。但是，必须先识别价值组成部分，才能使这一更聚焦的工作在正确的背景下开展。 可衡量的指标（如投资回报率）是评估项目成败的有效方式。但是，要使这些指标有意义，项目经理首先需要了解在更大项目集的背景下，项目的价值是如何定义的。

单选题 143/180、A chief technology officer (CTO) wants all project managers to adopt service leadership practices after attending a leadership conference. However, the CTO seems unclear about practical implementation and expects immediate results. The organization has diverse projects ranging from predictive infrastructure

builds to agile software development, each with different team dynamics and stakeholder expectations. Some senior project managers are skeptical about changing their established leadership approaches. What should the project manager do?
一位首席技术官（CTO）在参加领导力会议后，希望所有项目经理采纳服务型领导实践。然而，这位首席技术官似乎对实际落地并不清晰，却期望立竿见影。该组织拥有多样化的项目，从预测型基础设施建设项目到敏捷软件开发，每个项目都有不同的团队动态和利益相关方期望。一些资深项目经理对改变其既定的领导方式持怀疑态度。项目经理应当怎么做？

A. Propose gradual implementation with coaching support and adaptation to different project contexts. 提出渐进式实施，提供辅导支持，并针对不同项目背景加以调整。

B. Explain that service leadership requires cultural transformation and cannot be mandated through directives. 说明服务型领导需要文化转型，无法通过指令强制推行。

C. Suggest focusing solely on agile projects where servant leadership principles align with existing practices. 建议仅聚焦于敏捷项目，因为服务型领导原则与现有实践相契合。

D. Recommend formal training programs to ensure consistent understanding before attempting change. 在尝试变革之前，推荐正式的培训计划，以确保理解一致。

答案：A

解析：服务型领导本质上是一种文化转型，旨在赋能和发展人员，无法通过自上而下的指令有效强制推行。项目经理应认识到，真正的服务型领导需要自愿采纳与文化转变，而非基于服从的实施。渐进式实施弥合了期望与成果之间的差距，避免了可能难以消化吸收的突变，尤其对于持怀疑态度的资深项目经理而言。它使团队能够稳步过渡，而不扰乱既定的流程；辅导则确保针对不同方法论提供一致的支持。 其余选项均错误： 其余选项均无法独自完整或有效地应对该情境，但它们可以作为正确答案的辅助行动加以整合。 说明服务型领导需要文化转型、无法强制推行，这一做法聚焦于请求本身，而非应对该请求的方式。 仅聚焦于敏捷项目，将服务型领导局限于特定方法，而未认识到其普遍适用性。 培训计划是有用的，但它们并未解决文化转型的要求。培训可以作为渐进式实施过程和辅导活动的一部分。

单选题 144/180、A software development company is working on a new product. During an internal review, the client insists on adding new analytics features. The development team warns that this will delay core functionality already committed for release. The sponsor insists on including the features, but the project management office (PMO) reminds the product owner that governance requires formal scope control. Meanwhile, the client escalates their dissatisfaction to senior management. What should the product owner do?
一家软件开发公司正在开发一款新产品。在一次内部评审中，客户坚持新增分析功能。开发团队警告称，这将推迟已承诺发布的核心功能。发起人坚持纳入这些功能，但项目管理办公室（PMO）提醒产品负责人，治理要求进行正式的范围控制。与此同时，客户向高级管理层上报了他们的不满。产品负责人应当怎么做?

A. Accommodate the client's request, trusting that it will not create rework or jeopardize milestones. 满足客户的要求，相信这不会造成返工或危及里程碑。

B. Deny the request to maintain baseline discipline and meet with the client to minimize dissatisfaction and pressure. 拒绝该请求以维持基准纪律，并与客户会面以尽量减少不满和压力。

C. Lead an impact analysis with the team and initiate a formal change request balancing value, schedule, and cost. 带领团队进行影响分析，并启动正式的变更请求，平衡价值、进度和成本。

D. Add the features to the backlog informally, avoiding conflict now and resolving governance and audit issues later. 非正式地将这些功能添加到待办事项列表中，暂时避免冲突，日后处理治理和审计问题。

答案：C

解析：产品负责人应进行结构化影响分析，并启动正式的变更控制。 产品负责人应让团队参与评估新增分析功能将如何影响项目，包括时间表、成本、资源和风险。变更请求应通过适当的治理渠道提交，确保透明度、文档记录以及与 PMO 要求保持一致。这种方法平衡了范围、进度和成本这三重制约，确保变更在交付价值的同时不损害项目目标。 其余选项均错误： 仅凭善意无法为不受控制的范围增长提供正当理由。 在没有影响分析的情况下添加功能，可能

造成重大风险、返工或延误，危及项目成功，并无视 PMO 的治理要求。 严格拒绝会激化冲突，并且没有探究该变更是否可能增加合理价值或符合项目优先级。 隐藏的待办事项列表变更会破坏治理和透明度。

单选题 145/180、During a requirements review meeting, two stakeholders begin arguing over requirements. Each insists their priorities are more important, and the project manager is unable to guide the group to a consensus. What should the project manager do first to help resolve the disagreement?
在一次需求评审会议上，两名利益相关方开始就需求争论不休。双方都坚持自己的优先级更重要，项目经理无法引导小组达成共识。项目经理首先应当怎么做以帮助解决分歧?

A. Direct them to refer to the project scope statement to review the established project boundaries and constraints. 让他们参阅项目范围说明书，审查既定的项目边界和制约因素。

B. Use the requirements traceability matrix (RTM) as a shared reference point to review established priorities and scope. 使用需求跟踪矩阵（RTM）作为共同参考点，审查既定的优先级和范围。

C. Review the work breakdown structure (WBS) dictionary for detailed project business rules and deliverables. 审查工作分解结构（WBS）词典，了解详细的项目业务规则和可交付成果。

D. Instruct the stakeholders to review the communication management plan to ensure they are well-informed. 指示利益相关方审查沟通管理计划，以确保他们充分了解情况。

答案：B

解析：RTM 是一种用于跟踪需求从起源到最终可交付成果、并确保与范围保持一致的（的）工具。它确立优先级，将需求与业务目标关联起来，并确保可跟踪性。通过使用 RTM，项目经理可以为利益相关方提供一个共同的、客观的参考点，以评估其需求的优先级和一致性。
其余选项均错误： 范围说明书确立了边界和制约因素，但并不能解决需求优先级方面的冲突。

WBS 词典提供了可交付成果、工作包和规则的详细描述，但并不侧重于需求优先级或可跟踪性。 沟通管理计划有助于管理期望，但并未定义需求如何被验证或控制。

单选题 146/180、A project manager working on a project dependent on federal grant funding learns that funding will be reduced next year. Additionally, several significant regulatory changes are expected to become law later this year. The project manager is concerned that these changes could impact the project's completion. What should the project manager do?
一位项目经理正在负责一个依赖联邦拨款资金的项目，他获悉明年的资金将被削减。此外，几项重大监管变更预计将在今年晚些时候成为法律。项目经理担心这些变更可能影响项目的完成。项目经理应当怎么做?

A. Request scope adjustments in response to changing financial and legal circumstances. 针对不断变化的财务和法律状况请求范围调整。

B. Develop a strategy to develop components individually to avoid potential dependencies. 制定一项策略，单独开发各组成部分，以避免潜在的依赖关系。

C. Establish a regular cadence to assess project impact and make adjustments as changes arise. 建立定期节奏来评估项目影响，并在变更出现时做出调整。

D. Form a cross-functional team of financial and legal experts to address upcoming changes. 组建一支由财务和法律专家组成的跨职能团队，以应对即将到来的变更。

答案：C

解析：建立定期节奏来评估项目影响并按需调整，将使项目经理能够掌握变更动态并及时做出响应。这是一种主动而非被动的方法。定期评估确立了分析财务和监管变更的节奏和框架，支持决策，并确保项目在保持核心目标的同时有效适应不断变化的情况。 其余选项均错误： 在变更出现时做出调整是反应式的，是对变更的被动响应，而非主动监控和规划。 单独开发各组成部分而非规划可能的并行或同步工作，可能在一定程度上减少依赖关系，但效率低下，而且很可能延长项目时间表。 组建跨职能团队没有必要，也无助于达成项目可交付成果。虽然

很可能需要财务和法律方面的意见，但在整个项目期间都将他们纳入项目团队并不是对资源的有效利用。

单选题 147/180、Midway through a critical project phase, a senior team member privately tells the project manager they are struggling to work effectively with a newly assigned team member. The senior team member feels the new member’s approach is slowing progress and causing misunderstandings. They ask the project manager for advice on how to handle the situation without damaging team morale. What should the project manager do?
在一个关键项目阶段的中期，一名资深团队成员私下告诉项目经理，他们难以与新加入的团队成员有效协作。资深成员觉得新成员的工作方式拖慢了进度并造成误解。他们向项目经理寻求建议，询问如何处理这一状况而不损害团队士气。项目经理应当怎么做?

A. Review the new member’s performance and the responsibility assignment matrix to clarify roles and issues. 审查新成员的绩效和责任分配矩阵，以厘清角色和问题。

B. Encourage the senior member to discuss concerns directly with the new member during a team discussion. 鼓励资深成员在团队讨论中直接与新成员沟通问题。

C. Coach the senior member on applying conflict resolution techniques to address the situation. 辅导资深成员运用冲突解决技术来处理这一状况。

D. Meet with the new member to discuss the concerns and agree on steps to improve collaboration. 与新成员会面讨论这些关切，并商定改善协作的步骤。

答案：C

解析：提供辅导能让资深团队成员掌握直接、建设性地解决问题的技能和信心，同时维护团队士气。这一方法还能促进团队在处理冲突方面实现长期的自给自足。 其余选项均错误： 审查绩效和 RACI 可能识别出与角色相关的原因，但并不能直接解决人际冲突。 在小组场合讨论敏感问题可能激化紧张气氛并损害信任。 与新成员会面绕过了资深成员，可能造成团队成员在冲突解决上对项目经理产生依赖。

单选题 148/180、A national bicycle repair shop with local franchises has experienced a substantial increase in sales and rentals of electronic bicycles. The maintenance manager has noticed a corresponding increase in electronic bicycle repairs, particularly issues to the electrical systems. The organization has hired a project manager to assess the impact of these developments. What should the project manager do?
一家拥有本地特许经营门店的全国性自行车维修店，其电动自行车的销售和租赁量大幅增长。维护经理注意到电动自行车维修量相应增加，尤其是电气系统的问题。该组织聘请了一名项目经理来评估这些事态发展的影响。项目经理应当怎么做?

A. Use a political, economic, sociocultural, technological, legal, and environmental (PESTLE) analysis to evaluate external factors and propose scope adjustments systematically. 使用政治、经济、社会文化、技术、法律和环境（PESTLE）分析来评估外部因素，并系统地提出范围调整建议。

B. Expand the project plan to accommodate additional requirements resulting from changes in scope. 扩展项目计划，以容纳因范围变更而产生的额外需求。

C. Implement the six stages of the predictive or waterfall approach to define the changes in project scope. 采用预测型或瀑布方法的六个阶段来界定项目范围的变更。

D. Leverage the schedule performance index (SPI) as a measure of schedule efficiency, expressed as the ratio of earned value to planned value, to improve workflow. 利用进度绩效指数（SPI）作为进度效率的衡量指标（以挣值与计划价值之比表示），以改进工作流程。

答案：A

解析：项目经理应确定拟议范围调整的优先级，并使用 PESTLE 分析等工具。PESTLE 分析是一种战略规划工具，用于考察外部宏观环境中的政治、经济、社会文化、技术、法律和环境因素，识别组织面临的机会和威胁，以便根据外部商业环境的变化评估和确定对项目范围影响的优先级。 其余选项均错误： 扩展原项目计划以容纳额外需求（即范围蔓延）违背了标准项目管理实践；范围蔓延不应添加到项目计划中。 使用瀑布方法的六个阶段（需求、设计、实施、测试、部署和维护）来界定项目范围的变更，并不能评估这些变更对项目计划的影响。 SPI 可

用于衡量进度效率，以挣值与计划价值之比表示。尽管这些工具很有价值，但它们并不能直接评估和确定外部商业环境变化对项目范围影响的优先级。

单选题 149/180、A project manager for a new project is tasked with applying agile practices to improve team performance. The team has mixed experience with agile methodologies, and stakeholders expect quick adoption of new practices. Which approach should the project manager take?
一个新项目的项目经理受命应用敏捷实践来提升团队绩效。团队在敏捷方法论方面经验参差不齐，利益相关方期望快速采用新实践。项目经理应当采取哪种方法?

A. Assess the team's current agile maturity level and develop a targeted training plan based on identified gaps. 评估团队当前的敏捷成熟度水平，并根据识别出的差距制定有针对性的培训计划。

B. Request budget approval for comprehensive agile training covering ceremonies, tools, and collaborative practices. 申请预算批准，开展涵盖仪式、工具和协作实践的全面敏捷培训。

C. Implement gradual agile adoption through coaching sessions while introducing practices to minimize disruption. 通过辅导课程逐步推进敏捷采用，同时引入各项实践以减少干扰。

D. Organize team workshops to establish agile principles and create a shared understanding of new working methods. 组织团队研讨会，确立敏捷原则，并就新的工作方法建立共识。

答案：A

解析：有效的敏捷实施要求在制定培训策略之前先了解团队当前的能力。评估敏捷成熟度能够识别出具体的知识差距和经验水平，从而采取有针对性的干预措施，而非采用通用方法。这能确保培训投入解决实际需求，并加速成功采用。 其余选项均错误： 在不了解具体需要何种培训的情况下申请资源，将使项目预算面临不必要的开支风险。 辅导可能是正确的方法，但应

在评估团队准备程度之后进行。 研讨会需要量身定制以覆盖团队的需求，因此评估当前的敏捷知识水平是首先要做的事情。

单选题 150/180、A global consumer electronics company is launching a new wearable device. The project manager has engaged stakeholders and collected their input. During early planning, stakeholders disagree about their definition of quality. Some stakeholders emphasize durability, others user experience, and regulators stress safety standards. What should the project manager do?
一家全球消费电子产品公司正在推出一款新的可穿戴设备。项目经理已与利益相关方互动并收集了他们的意见。在早期规划阶段，利益相关方对质量的定义存在分歧。一些利益相关方强调耐用性，另一些强调用户体验，而监管机构则强调安全标准。项目经理应当怎么做?

A. Document quality requirements from stakeholder interviews and workshops for future prioritization and agreement. 记录利益相关方访谈和研讨会中的质量需求，以便日后确定优先级并达成一致。

B. Review the lessons learned repository to identify quality practices from past projects and adapt them as preliminary requirements. 审查经验教训库，识别以往项目中的质量实践，并将其作为初步需求加以调整。

C. Develop a risk register entry for each disputed quality expectation and plan a corresponding cost-effective response. 为每一项有争议的质量期望建立风险登记册条目，并规划相应的经济有效的应对措施。

D. Create a communications management plan that specifies how quality expectations and updates will be reported to stakeholders. 创建一份沟通管理计划，明确规定如何向利益相关方报告质量期望和更新。

答案：A

解析：记录利益相关方访谈和研讨会中的质量需求，以便日后确定优先级并达成一致，是正确的一步。这些需求随后将被确定优先级、达成一致，并纳入范围基准。 其余选项均错误： 审查经验教训库可以提供有用的背景信息，但并不能捕捉当前利益相关方的质量需求。 风险登

记册针对的是不确定性；有争议的质量期望必须作为需求加以澄清和记录，而非作为风险及其应对措施来对待。 沟通管理计划定义的是信息将如何共享，而非必须满足哪些质量需求。

单选题 151/180、A national park operates a general store that sells camping supplies. Budget cuts to the national park system have led to extended campground closures. The park service director must evaluate the organization’s inventory and sales demands and has asked the project manager to assess external environmental factors that could impact the organization. What should the project manager do?
一个国家公园经营着一家出售露营用品的综合商店。国家公园系统的预算削减导致露营地长期关闭。公园管理局主管必须评估该组织的库存和销售需求，并要求项目经理评估可能影响该组织的外部环境因素。项目经理应当怎么做?

A. Implement the sender, message, channel, receiver model of communication to seek feedback. 采用发送者、消息、渠道、接收者的沟通模型来寻求反馈。

B. Perform a political, economic, sociocultural, technological, legal, and environmental (PESTLE) analysis. 进行政治、经济、社会文化、技术、法律和环境（PESTLE）分析。

C. Issue a request for proposals (RFP) to evaluate vendor methodologies in an attempt to lower costs. 发布建议邀请书（RFP），以评估供应商方法论并试图降低成本。

D. Use a Monte Carlo simulation with random sampling to generate a range of outcomes. 使用蒙特卡洛模拟，通过随机抽样生成一系列可能的结果。

答案：B

解析：项目经理可以应用 PESTEL 分析，持续审查外部商业环境对项目范围和待办事项列表的影响。 其余选项均错误： 发送者、消息、渠道、接收者的沟通模型、RFP 和蒙特卡洛模拟均不能专门审查外部商业环境对项目范围或待办事项列表的影响。它们是有用的项目管理工具，但无法满足主管的要求。

单选题 152/180、A project manager is managing an important agile project. During the kick-off meeting, the project manager sets the policies and procedures to be followed throughout the project. Midway through the project, the project manager finds that some of the project team are failing to follow the established procedures. What should the project manager do ?
一位项目经理正在管理一个重要的敏捷项目。在启动会议上，项目经理制定了整个项目期间要遵循的政策和程序。项目进行到一半时，项目经理发现部分项目团队成员未能遵循既定程序。项目经理应当怎么做?

A. Escalate the issue to the legal department and require team members to formally acknowledge the policies and procedures in writing. 将该问题上报给法务部门，并要求团队成员书面正式确认政策和程序。

B. Request the sponsor' s intervention to replace non-compliant team members with others willing to follow the established procedures. 请求发起人干预，用愿意遵循既定程序的成员替换不合规的团队成员。

C. Facilitate a team discussion to revisit the agreed ground rules, clarify their relevance, and address any obstacles preventing adherence. 引导团队讨论，重新审视商定的基本规则，阐明其相关性，并解决阻碍遵守的任何障碍。

D. Introduce a performance-based reward system for consistent and sustained compliance with all the originally agreed practices. 引入基于绩效的奖励制度，以奖励对全部最初商定实践的一致、持续遵守。

答案：C

解析：在敏捷环境中，一致性通过协作、透明和持续改进得到强化。在开放的论坛中重新审视基本规则，可以让团队澄清期望、解决阻碍因素并重新承诺遵守协议，从而培养共同责任感。其余选项均错误： 上报法务部门过于正式，与敏捷的信任、协作和自我管理原则不符，还可能损害团队士气和信任。 替换团队成员应当是最后的手段。这会破坏团队凝聚力，并错失辅导和改进的机会。 虽然激励措施可以鼓励期望的行为，但可能削弱内在动机，而且仍然无法解决潜在问题，如期望不明确或流程低效。

单选题 153/180、A project manager is initiating a public-facing service upgrade with multiple regulatory touchpoints. The sponsor expresses concern about potential expectation gaps that may surface later in the project, potentially impacting delivery. The project manager needs the team to capture internal and external customer expectations to address this concern. What should the project manager direct the team to do first?
一位项目经理正在启动一项面向公众的服务升级，涉及多个监管触点。发起人对项目后期可能出现的期望差距表示担忧，这可能影响交付。项目经理需要团队捕捉内部和外部客户的期望，以解决这一担忧。项目经理应当首先指示团队做什么？

A. Develop a stakeholder register to classify stakeholders, and the RACI (responsible, accountable, consulted, informed) matrix to prioritize actions. 制定利益相关方登记册以对利益相关方进行分类，并制定 RACI（负责、问责、咨询、知情）矩阵以确定行动的优先级。

B. Collaborate with the project team to develop a comprehensive communications management plan to address stakeholder information requirements. 与项目团队协作，制定一份全面的沟通管理计划，以满足利益相关方的信息需求。

C. Build a stakeholder engagement assessment matrix to set the desired levels of engagement for all stakeholders. 构建利益相关方参与评估矩阵，为所有利益相关方设定期望的参与水平。

D. Facilitate a lessons learned review to identify typical stakeholder expectation gaps from previous projects. 开展经验教训审查，识别以往项目中典型的利益相关方期望差距。

答案：A

解析：创建利益相关方登记册条目并使用 RACI 矩阵对利益相关方进行分类，可以最大限度地实现早期优先级排序和裁剪。其他计划（如沟通管理计划和争取利益相关方参与计划）随后可依据这一裁剪结果来制定。 其余选项均错误： 沟通管理计划包含"如何"传递信息以满足期望，因此它需要利益相关方登记册中记录的利益相关方分析结果。 利益相关方参与评估矩阵的制定，需要先从利益相关方登记册中识别内部和外部利益相关方，并获取源自凸显模型分析的优先级和影响力背景。 经验教训有助于识别可能被忽视的人员以及通常被遗漏的期望，但它们需要以先使用凸显模型识别和分析的利益相关方为基础。

单选题 154/180、A project team has been assembled to develop new software for a financial technology company. Due to the competitive nature of this industry, the market can be particularly volatile, and new technological advancements are frequently revealed. The project manager needs to ensure the project remains relevant in such a dynamic market. What should the project team do?
一个项目团队已被组建，为一家金融科技公司开发新软件。由于该行业竞争激烈，市场可能尤其动荡，新的技术进步也层出不穷。项目经理需要确保项目在这样的动态市场中保持相关性。项目团队应当做什么?

A. Use a variety of user stories to ensure the project meets the most relevant customer expectations, even amid market volatility. 使用各种用户故事，确保项目满足最相关的客户期望，即使在市场动荡中也是如此。

B. Schedule adequate buffers and reserves in the project management plan to ensure the project team has time to react to any unforeseen hurdles. 在项目管理计划中安排足够的缓冲和储备，确保项目团队有时间应对任何不可预见的障碍。

C. Implement iterative feedback mechanisms to allow readjustments to real-time external inputs and ensure delivered value remains high. 实施迭代反馈机制，以便根据实时外部输入进行调整，并确保交付的价值始终保持高水平。

D. Organize a contingency reserve to cover the costs and time required to respond to any major environmental changes. 组织应急储备，以覆盖应对任何重大环境变化所需的成本和时间。

答案：C

解析：在金融科技等高度动态的行业中，项目必须灵活管理，以适应快速演变的外部因素。纳入迭代反馈机制可以针对实时外部输入进行范围调整，使项目团队能够持续优化和重新调整项目目标，以保持相关性并确保交付的价值始终保持高水平。 其余选项均不能保证灵活性，也无法确保项目团队能够快速适应不断变化的市场条件。 虽然在待办事项列表中准备各种用户故事可能有用，但没有任何项目团队能够预测项目过程中出现的每一项技术进步或市场波动。如果没有一个迭代方法来应对此类障碍，拥有大量多样化的输入将无助于适应不断变化的市场

条件。 在项目管理计划中安排缓冲和储备可以为项目团队提供更多应对实时外部输入的空间，但这本身并不能保证灵活性。如果项目团队不利用这段时间进行迭代并调整项目范围，项目的交付进度仍可能受到负面影响。 只有在项目团队正确评估了可能出现的风险和挑战，并制定了有效的计划来相应应对时，在项目预算中组织应急储备才会有用。意外情况通常不在应急储备的覆盖范围内，而且如果没有迭代反馈机制，就无法保证项目团队能够快速高效地应对新的输入。

单选题 155/180、The project manager is responsible for a major project that involves working with many vendors. A key project concern is ensuring the quality and timely delivery of products and services procured from vendors. What should the project manager do to ensure the delivery stays on schedule?
项目经理负责一个涉及与众多供应商合作的大型项目。项目的一个关键关切是确保从供应商处采购的产品和服务的质量与及时交付。为确保交付按进度进行，项目经理应当怎么做?

A. Raise an item in the risk register to capture potential impacts related to delays in the procurement of products and services, mitigating the risk of suboptimal quality. 在风险登记册中提出一个条目，以捕捉与产品和服务采购延迟相关的潜在影响，降低质量欠佳的风险。

B. Conduct regular procurement performance reviews with all vendors to ensure that products and services are delivered on time and in accordance with the contract. 与所有供应商定期进行采购绩效审查，确保产品和服务按时交付并符合合同规定。

C. Delegate the management of the procurement process and vendor management to the procurement department because they have the tools to deal with a large number of vendors. 将采购流程和供应商管理的职责委托给采购部门，因为他们拥有应对大量供应商的工具。

D. Review the vendor management plan with all selected vendors before the contract period begins to ensure compliance and confirm that they agree with the plan. 在合同期开始前，与所有选定供应商一起审查供应商管理计划，以确保合规并确认他们同意该计划。

答案：B

解析：通过定期进行采购绩效审查，项目经理可以主动识别并处理供应商绩效方面的任何潜在问题。这将有助于确保项目达成其采购目标，并确保产品按时交付且满足质量要求。 其余选项均错误： 更新风险登记册总体上是重要的，但它并不能直接回应质量和交付时间问题。 将工作委托给采购部门可以确保供应商遵守合同条款，但这不足以保证产品满足质量要求并按时交付。 随着工作的推进，仅审查供应商管理计划不足以识别和处理任何潜在问题。确保与供应商保持一致至关重要，但这应成为监控其绩效的综合流程的一部分。

单选题 156/180、A project is in its second month of execution and follows a hybrid delivery model. A key team member responsible for integrating two critical system components was unexpectedly reassigned by their functional manager. A replacement was assigned immediately, but the new team member lacks domain expertise and onboarding will take time. A key stakeholder, who is also the product sponsor, expresses concern about timeline slippage and questions the team's ability to deliver the next milestone. What should the project manager do to maintain delivery momentum and address the stakeholder's concern?
一个项目已进入执行的第二个月，采用混合交付模式。一名负责集成两个关键系统组件的关键团队成员被其职能经理意外重新调配。虽然立即指派了替代人员，但新团队成员缺乏领域专业知识，上手需要时间。一名同时也是产品发起人的关键利益相关方对进度延误表示担忧，并质疑团队交付下一个里程碑的能力。为保持交付势头并回应利益相关方的担忧，项目经理应当怎么做?

A. Request the functional manager to reassign the former team member for critical integration tasks. 请求职能经理重新调配原团队成员，负责关键集成任务。

B. Update the risk register and discuss the impact with the sponsor at the next scheduled checkpoint. 更新风险登记册，并在下一次预定的检查节点与发起人讨论影响。

C. Review the milestone plan, adjust assignments based on capacity, and align on mitigation actions. 审查里程碑计划，根据产能调整任务分配，并就缓解行动达成一致。

D. Escalate the concern to the PMO and seek additional resources for this project phase. 将这一担忧上报给项目管理办公室，并为该项目阶段寻求额外资源。

答案：C

解析：审查里程碑计划、根据团队实际产能重新调整任务分配，并与团队就缓解行动达成一致，体现了主动、适应性的规划。这一方法有助于保持交付势头，同时以透明、协作的方式直接回应利益相关方的担忧。 其余选项均错误： 重新调配原团队成员可能不可行，而且绕过了职能经理的权限。这也不能建立团队的长期韧性。 虽然更新风险登记册是必要的，但等待下一个预定的检查节点会延误行动，无法立即应对交付风险或利益相关方的担忧。 上报给项目管理办公室并寻求更多资源可能为时过早。这表明团队无法在未先尝试内部调整和缓解的情况下应对挑战。

单选题 157/180、During project execution, the project manager is considering how to identify the expectations of the project' s internal and external customers. What the stakeholders value and how they define success is important for the success of the project. The project manager needs to achieve a full understanding that can reliably guide the project. What should the project manager do?
在项目执行期间，项目经理正在考虑如何识别项目内部和外部客户的期望。利益相关方看重什么以及他们如何定义成功，对项目的成功至关重要。项目经理需要达成能够可靠指导项目的全面理解。项目经理应当怎么做?

A. Analyze the stakeholders' information, weighing their expectations against their involvement, influence, and potential impact. 分析利益相关方的信息，将他们的期望与其参与度、影响力和潜在影响进行权衡。

B. Survey the stakeholders, asking them to list their interests and concerns for the project, and document the responses for reference. 调查利益相关方，请他们列出对项目的兴趣和关切，并记录回复以供参考。

C. Invite all stakeholders to a kickoff meeting, offering everyone an equal opportunity to discuss their expectations with the team. 邀请所有利益相关方参加启动会议，为每个人提供平等的机会与团队讨论他们的期望。

D. Prioritize the expectations of external customers over internal stakeholders to ensure the most effective use of financial resources. 优先考虑外部客户的期望而非内部利益相关方，以确保最有效地利用财务资源。

答案：A

解析：项目经理和团队应通过多种方式与利益相关方互动，以发现并记录他们的期望。然而，下一步应分析收集到的信息，考虑每位利益相关方的相对重要性、权力和影响力。这一分析是厘清项目优先级的关键。 其余选项均错误： 调查可能是收集信息的有用工具。然而，仅凭调查无法提供足够的信息来形成真正有用的参考。 会议将是利益相关方讨论其期望的好机会，尤其是让他们就期望的差异相互交流。然而，要将这些输入转化为对项目有意义的指导，还需要进一步分析。 找到一种方法来权衡可能相互竞争的期望，是项目经理的一项关键任务。然而，仅凭财务影响力确定优先级可能不够充分，而且可能对项目的正确方向产生误导。项目经理在权衡利益相关方的期望时，应考虑所有因素。

单选题 158/180、A product manufacturer is developing a new product. The project sponsor proposes reducing the number of inspection steps due to budget pressure. The quality assurance manager warns that this could potentially increase the risk of defects. The client reaffirms that quality must be preserved. The finance controller emphasizes that savings are necessary for the project's financial viability. What should the project manager do?
一家产品制造商正在开发一款新产品。项目发起人因预算压力提议减少检查步骤的数量。质量保证经理警告称，这可能增加缺陷风险。客户重申必须保持质量。财务总监则强调，节省开支对于项目的财务可行性是必要的。项目经理应当怎么做?

A. Limit inspection steps to save money, with the understanding that defects will likely increase later. 减少检查步骤以节省资金，并理解缺陷很可能在后期增加。

B. Defer inspections until later phases, balancing short-term savings against higher defect risks. 将检查推迟到后续阶段，在短期节省与更高缺陷风险之间取得平衡。

C. Streamline inspection steps by identifying and eliminating redundancy rather than reducing them. 通过识别并消除冗余来精简检查步骤，而非减少检查步骤。

D. Retain full inspections to preserve quality, explaining the trade-offs clearly to the stakeholders. 保留全部检查以保持质量，并向利益相关方清晰说明相关权衡。

答案：D

解析：尽管面临成本压力，项目经理仍应保护质量。通过保留全部检查并清晰传达相关的权衡，利益相关方能够了解对进度、成本或资源的影响，同时保持对项目质量成果的信心。 其余选项均错误： 为节省资金而减少检查是不负责任的，会损害质量和合规性。 推迟检查不是主动的做法，会增加风险，并使项目暴露于隐蔽或累积的缺陷之中。 冗余流程（如重叠的测试或多个 QA 团队审查同一输出）有助于发现单一方法或单一个人可能遗漏的错误或缺陷。

单选题 159/180、A project team adopted agile practices to meet the business need to develop an application. One of the senior team members inconsistently attends the team meetings, including the daily standup meetings. This senior team member then requests other team members to provide status updates on his/her behalf during the stand up meetings. What should the project manager do to handle this situation?
一个项目团队采用了敏捷实践，以满足开发一款应用的业务需求。其中一名资深团队成员不定期参加团队会议，包括每日站会。这名资深团队成员还要求其他团队成员在站会期间代其提供状态更新。为处理这一情况，项目经理应当怎么做?

A. Request the removal of the senior team member due to the participation issues. 因参与问题请求将这名资深团队成员调离。

B. Remind the senior team member to adhere to the team's working agreement. 提醒这名资深团队成员遵守团队的工作协议。

C. Escalate the senior team member's participation to upper management. 将这名资深团队成员的参与问题上报给高层管理者。

D. Request the other team members to cover the tasks assigned to the senior team member. 请求其他团队成员接手分配给这名资深团队成员的任务。

答案：B

解析：项目经理应提醒这名资深团队成员遵守团队的工作协议，并确保其坚持遵守。 其余选项均错误： 由其他团队成员代其汇报也是不可持续的，并会影响团队动态。项目经理应首先尝试与这名资深团队成员解决这一情况。 请求调离是一种升级手段，只有在项目经理无法解决当前问题时才采用。

单选题 160/180、A project team is drafting the first version of their budget. The team members understand the need for adding a contingency reserve to cover budget overruns. However, the project manager wants to avoid using contingency funds. What should the project manager do?
一个项目团队正在起草预算的第一版。团队成员明白需要增加应急储备以覆盖预算超支。然而，项目经理希望避免使用应急资金。项目经理应当怎么做?

A. Set up the contingency reserve outside the initial project budget and manage the reserve separately. 将应急储备设置在初始项目预算之外，并单独管理该储备。

B. Manage the contingency reserve implicitly by making it part of the budget's cost basis. 将应急储备隐性地纳入预算的成本基础进行管理。

C. Reduce the contingency reserve amount as the project progresses and more information becomes available. 随着项目推进和可获得信息增多，逐步减少应急储备的金额。

D. Work to proactively anticipate threats that might damage the budget and affect the contingency reserve. 主动预测可能损害预算并影响应急储备的威胁。

答案：D

解析：采取主动立场预测和预防对预算的威胁，可以帮助项目团队避免不得不使用应急资金。虽然不可能控制每一个未知因素，但这一方法最有可能保持应急储备完好。 其余选项均错误：在某些情况下，将应急储备与初始项目预算分离可能是管理它的有用方式。然而，这种分离并不能建立防止需要使用它的保障措施。 将应急储备纳入预算的成本基础是一种常见做法，但这种管理储备的方式并不影响这些资金是否会被需要。 随着更多项目阶段完成而减少应急储备，会逐步释放资金，但这并不能防止意外问题。

单选题 161/180、A project manager is assigned to a project in a country where the company has no prior business experience. At the beginning of the project, the project manager realizes that there may be local regulatory requirements that the project team has no experience with. What should the project manager do next?
一名项目经理被指派到一个公司没有既往业务经验的国家开展项目。在项目开始时，项目经理意识到当地可能存在项目团队没有接触过的监管要求。项目经理接下来应当怎么做?

A. Assign sufficient budget in case such requirements must be met. 预留充足的预算，以备必须满足此类要求之需。

B. Consult with a subject matter expert (SME) on how to avoid such requirements. 咨询主题专家（SME），了解如何规避此类要求。

C. Engage a subject matter expert (SME) to check if the requirements are relevant. 聘请主题专家（SME）核查这些要求是否与项目相关。

D. Escalate concerns about the requirements to the project sponsor. 将对这些要求的担忧上报给项目发起人。

答案：C

解析：在陌生国家遇到不熟悉的监管要求时，咨询主题专家以评估其相关性，有助于避免不必要的成本和合规工作，同时确保实际要求得到妥善满足。这一方法能在做出战略决策前提供准确的信息。 其余选项均错误： 分配预算是在不了解要求、其影响以及它们是否与项目相关的情况下配置资源。 专注于规避要求，而非理解合规义务及其相关性，是不负责任的。 在此阶段将担忧上报给项目发起人并不有效，也可能没有必要。项目经理应在评估情况并获得专家评估以支持知情决策之后，再考虑上报。

单选题 162/180、At the midway point in a project's execution, the finance director announces a 15% budget cut across all aspects of the project. The project sponsor pressures the project manager to protect high-visibility deliverables, although the technical lead warns that quality could be compromised as a result of the cuts. The

finance team insists adjustments must be formally assessed before work continues. What should the project manager do?
在项目执行的中期，财务总监宣布对项目的所有方面削减 15%的预算。项目发起人向项目经理施压，要求保护高可见度的可交付成果，尽管技术负责人警告称削减可能导致质量受损。财务团队坚持认为，在继续工作之前，调整必须经过正式评估。项目经理应当怎么做?

A. Reduce the scope to meet the new budget without documenting the change. 缩减范围以满足新预算，但不记录这一变更。

B. Shift financial responsibility to the operations department to maintain the current scope. 将财务责任转移给运营部门，以维持当前范围。

C. Ask the sponsor to decide which deliverables can be removed without affecting the project. 请发起人决定哪些可交付成果可以在不影响项目的情况下移除。

D. Adjust the project baseline with stakeholder alignment and governance approval. 在利益相关方达成一致并获得治理审批后，调整项目基准。

答案：D

解析：项项目经理应当按照结构化流程重新确定基准，并遵从治理要求。与利益相关方保持一致，并获得治理审批，有助于维护透明度、落实责任和项目控制，同时保证项目目标具备现实性与可实现性。 其余选项均错误： 调整范围应通过协作的、有充分文档记录的流程进行审查和论证。否则，将造成不一致和范围蔓延。 非正式的成本转移会破坏透明。 项目发起人无法单独做出决定，因此项目经理必须促成这一分析。

单选题 163/180、After acquiring a competitor, a large conglomerate is enforcing enterprise project management standards across all corporate initiatives. A project team has been assigned to rebrand the acquired company’ s product line, but several stakeholders disagree about the rebranding direction. Their conflict is creating tension within the integration effort. The project sponsor is concerned that stakeholder resistance could undermine the successful cultural and operational alignment of the new organization. What should the project manager do?

在收购一家竞争对手后，一家大型企业集团正在所有公司举措中强制执行企业项目管理标准。一个项目团队已被指派负责重塑被收购公司产品线的品牌，但几名利益相关方对品牌重塑方向存在分歧。他们的冲突正在整合工作中制造紧张。项目发起人担心，利益相关方的抵制可能削弱新组织在文化和运营上的成功对齐。项目经理应当怎么做?

A. Develop a stakeholder engagement strategy that ensures alignment with the acquiring company’ s culture and integration objectives. 制定一项利益相关方参与策略，确保与收购方公司的文化和整合目标保持一致。

B. Continue executing according to the enterprise project management standards to maintain adherence to schedule and delivery commitments. 继续按照企业项目管理标准执行，以保持对进度和交付承诺的遵守。

C. Schedule a facilitated session with stakeholders to clarify the sources of disagreement and evaluate the impact on project execution. 安排一次引导式会议，与利益相关方厘清分歧的来源，并评估对项目执行的影响。

D. Meet with the sponsor to better understand the organizational integration concerns and request direction on handling stakeholder resistance. 与发起人会面，以更好地了解组织整合方面的关切，并就如何处理利益相关方抵制请求指示。

答案：A

解析：执行争取利益相关方参与计划，为让抵制性利益相关方与收购方公司的文化和整合目标保持一致，提供了一种主动、结构化的方法。 其余选项均错误： 继续按照标准执行，强调的是对新标准的合规和交付纪律，却忽视了利益相关方的抵制，而这是整合成功的一大风险。引导利益相关方会议作为一种策略是有帮助的，但项目经理应优先采用正式的参与策略，而非临时会议。 与发起人会面是对发起人的过度依赖，而非项目经理主动管理利益相关方参与。

单选题 164/180、A software development company is developing a new revision for an existing product. During system integration, two functional managers dispute ownership of a major interface. The requirements document is vague, and the work breakdown structure (WBS) lists the component under multiple packages. The client

complains about the delays and alleges poor accountability. The sponsor pressures the project manager to assign ownership to one of the functional managers, warning that the dispute could lead to audit issues. What should the project manager do?
一家软件开发公司正在为现有产品开发一个新版本。在系统集成期间，两名职能经理对一个主要接口的所有权产生争议。需求文档含糊不清，工作分解结构（WBS）将该组件列在多个工作包之下。客户抱怨延误并指责问责不力。发起人向项目经理施压，要求将所有权分配给其中一名职能经理，并警告该争议可能导致审计问题。项目经理应当怎么做?

A. Clarify ownership by updating the WBS dictionary and realigning responsibilities with stakeholder agreement. 通过更新 WBS 词典并在利益相关方一致的基础上重新调整职责，来厘清所有权。

B. Assign ownership to the team's functional manager with a stronger technical capacity to restore progress quickly. 将所有权分配给技术能力更强的团队职能经理，以迅速恢复进度。

C. Revise the requirements document and the WBS to clarify management roles and add a definition of ownership. 修订需求文档和 WBS，以厘清管理角色并增加所有权的定义。

D. Divide ownership responsibilities among the project team to reduce audit issues and increase accountability. 在项目团队中分摊所有权职责，以减少审计问题并增强问责。

答案：A

解析：项目经理需要使用范围工具（如 WBS 词典）迅速解决模糊之处。WBS 词典为每个工作包提供详细文档，包括谁负责其完成。职能经理、团队成员和利益相关方可以参考该词典，了解他们具体的角色和职责，减少混淆和重叠。 其余选项均错误： 仓促分配忽略了结构性模糊。 分配应基于项目需求，而非主观偏好或外部压力。 为澄清而修订文档绕过了项目经理的问责。 分摊所有权可能导致重复、返工和缺陷。当多人共享所有权时，问责会被稀释，因为可能不清楚谁负责确保质量标准的达成。

单选题 165/180、A hybrid project involving many stakeholders is underway. As requested by the project management office (PMO), the project status reports, as well

as other project documents, are being stored in a central repository. When reviewing the documents stored in the repository, the project manager discovered that documents were either not updated or were missing. What should the project manager do?
一个涉及众多利益相关方的混合项目正在进行中。按照项目管理办公室（PMO）的要求，项目状态报告以及其他项目文档均存储在中央存储库中。在审查存储库中的文档时，项目经理发现文档要么未更新，要么缺失。项目经理应当怎么做?

A. Discuss the situation with the project sponsor to reduce the level of documentation. 与项目发起人讨论这一情况，以减少文档量。

B. Work with the team leaders to update the required project reports. 与团队负责人合作，更新所需的项目报告。

C. Stop all project activities until the project documents are updated and uploaded 停止所有项目活动，直到项目文档更新并上传完毕。

D. Schedule a knowledge transfer session at the final stage of the project. 在项目的最后阶段安排一次知识移交会议。

答案：B

解析：解决文档缺失或质量不佳的第一步是纠正这一缺陷。然后，项目经理应与团队合作，确保遵循文档记录程序，并更新所需的项目报告。 其余选项均错误： 与发起人讨论问题是不正确的，因为纠正问题属于项目经理的职权范围。项目经理无需为处理该问题而停止所有其他项目活动。 项目文档应持续更新，知识应在整个项目期间移交，而非仅在项目最后阶段进行。

单选题 166/180、During a quality audit of a complex infrastructure project, the auditor identifies that risk review meetings lack proper attendance documentation, making it impossible to verify stakeholder engagement in critical risk decisions. The project team has developed and implemented corrective actions for the attendance documentation process, but stakeholder attendance remains inconsistent. What should the project manager do next?

在对一个复杂基础设施项目进行质量审计时，审计师发现风险审查会议缺乏适当的出席记录，导致无法核实利益相关方在关键风险决策中的参与情况。项目团队已经制定并实施了针对出席记录流程的纠正措施，但利益相关方的出席情况仍不一致。项目经理接下来应当怎么做?

A. Provide legal documentation requiring stakeholder participation in risk decision-making processes. 提供法律文档，要求利益相关方参与风险决策过程。

B. Coach stakeholders on the importance of accountability and traceability for effective risk management. 辅导利益相关方，使其认识到问责和可追溯性对有效风险管理的重要性。

C. Implement detailed measurement protocols to assess the effectiveness of stakeholder engagement. 实施详细的衡量协议，以评估利益相关方参与的有效性。

D. Support the auditor by requesting their recommendation and escalating the issue to the project sponsor. 支持审计师，请求其提出建议，并将该问题上报给项目发起人。

答案：B

解析：辅导利益相关方将有助于直接解决参与问题、建立意识并加强参与。这将有助于确保利益相关方充分参与风险管理流程、问责清晰，并避免今后出现类似问题。 其余选项均错误：在此阶段关注法律文档可能过度，且强调严格的法定行动，而非通过教育和辅导利益相关方来积极地解决问题。利益相关方可能不理解出席风险审查会议的重要性，因此项目经理应向他们阐明这一点。 实施详细的衡量协议强调的是流程指标，而非问责、可追溯性和利益相关方教育的根本需求。这也可能导致不必要且耗时的文档记录政策。 请求审计师提出建议对于解决利益相关方参与问题并无必要。只有在项目经理无法达成解决方案时才需要上报。项目经理应首先通过参与和辅导来尝试解决利益相关方的行为问题。

单选题 167/180、A project manager has received quotes from two vendors for the same parts. Vendor A has informed the project manager that they fulfilled a similar order two months ago at a price that was 2% under the original planned cost. Vendor B has a history of on-time delivery but has announced a price increase. How should the project manager evaluate this situation?

一名项目经理收到了两家供应商对同一部件的报价。供应商 A 告知项目经理，他们在两个月前以低于原始计划成本 2%的价格完成过一笔类似的订单。供应商 B 有按时交付的历史记录，但已宣布涨价。项目经理应如何评估这一情况?

A. Review the agreements and procurement documentation for Vendor B to force them to keep the original pricing. 审查供应商 B 的协议和采购文档，以迫使他们维持原价。

B. Evaluate previous contract clauses from Vendor B and decrease orders, prioritizing orders from Vendor A whenever possible. 评估供应商 B 此前的合同条款并减少订单，尽可能优先向供应商 A 下单。

C. Use the metrics from Vendor A to request better pricing from Vendor B, keeping both providers as a risk mitigation strategy. 利用供应商 A 的指标向供应商 B 争取更优惠的价格，并将两家供应商都保留作为风险缓解策略。

D. Review the work performance information of both vendors against their contracts to find the preferred supplier. 对照两家供应商的合同审查其工作绩效信息，以确定首选供应商。

答案：D

解析：要做出明智的供应商决策，项目经理应首先对照两家供应商的合同审查其工作绩效信息。这样可以进行数据驱动的质量、交付、成本和合规评估。仅凭价格选择供应商会忽视关键的绩效因素。 其余选项均错误： 如果定价条款允许调整，迫使供应商 B 维持原价是不现实的。 减少对供应商 B 的订单可能违反合同条款并损害供应商关系。 向供应商 B 争取更优惠的价格假设了可比性，且可能使谈判陷入紧张，却无法保证结果。

单选题 168/180、The agile team is midway through the current sprint. One team member is working on a user story required to deliver a critical functionality for the sprint goal. During daily coordination meetings, the team member has given vague updates, such as "still progressing," for several days in a row. No visible progress has been made, and the functionality is now at risk. Other team members are unaware of the exact blockers, and the product owner is becoming concerned about the sprint

outcome. What should the project manager do to address this situation and protect sprint goals?
敏捷团队正处于当前迭代的中期。一名团队成员正在处理一个用户故事，该故事对交付迭代目标所需的关键功能必不可少。在每日协调会议期间，这名团队成员连续数日给出含糊的更新，如"仍在推进中"。没有取得可见的进展，该功能现在面临风险。其他团队成员不清楚确切的阻碍因素，产品负责人开始对迭代成果感到担忧。为处理这一情况并保护迭代目标，项目经理应当怎么做?

A. Ask the team to collectively support the developer in completing the story before the sprint ends. 请团队集体支持该开发人员在迭代结束前完成这个故事。

B. Meet one-on-one with the team member to understand the issue and agree on a course of action. 与该团队成员一对一会面，了解问题并就行动方案达成一致。

C. Escalate the issue to the product owner and propose replacing the user story with a simpler one. 将该问题上报给产品负责人，并提议将用户故事替换为更简单的故事。

D. Immediately reassign the story to another team member to avoid missing the sprint commitment. 立即将该故事重新分配给另一名团队成员，以避免错过迭代承诺。

答案：B

解析：在敏捷环境中，项目经理（或敏捷教练）应尽早处理潜在的阻碍因素。私下的、支持性的对话有助于发现真正的问题并共同制定解决方案，同时维护信任和团队凝聚力。 其余选项均错误： 团队协作很重要，但在未首先了解阻碍因素的情况下盲目指派支持，可能无法解决根本原因。 在不首先调查根本原因的情况下将问题上报给产品负责人并替换故事，绕过了项目经理的仆人式领导职责，并可能影响项目的范围期望。 立即重新分配工作可能打击团队成员的积极性，并损害心理安全。这应在尝试了解情况之后作为最后的手段。

单选题 169/180、Shortly after a sprint kickoff, the project manager receives an email from a key stakeholder who raises a serious concern and insists on modifying one deliverable that is already in progress. What should the project manager do first?

在迭代启动后不久，项目经理收到一位关键利益相关方的电子邮件，对方提出了一个严重关切，并坚持要求修改一项已在进行的可交付成果。项目经理首先应当怎么做?

A. Address the request during the daily scrum and request suggestions from the team about the change. 在每日站会期间处理该请求，并就这一变更征求团队的建议。

B. Immediately modify the backlog and instruct the team to start working on the requested deliverable. 立即修改待办事项列表，并指示团队开始处理所请求的可交付成果。

C. Schedule a meeting with the stakeholder and product owner to discuss and evaluate the request. 安排与该利益相关方和产品负责人的会议，讨论并评估该请求。

D. Cancel the current sprint, hold a retrospective, and invite the stakeholder to discuss the change. 取消当前迭代，召开回顾会，并邀请该利益相关方讨论这一变更。

答案：C

解析：与该利益相关方和产品负责人会面，可以鼓励开放讨论，在做出变更之前清晰了解可行性、影响、优先级排序和一致性，从而减少干扰并促进协作。 其余选项均错误： 在每日站会上处理该请求并询问团队是为时过早且不恰当的，因为每日站会旨在进行内部团队协调，而非解决利益相关方的问题或优先级排序。 立即修改待办事项列表并指示团队绕过了适当的敏捷治理，可能导致不受控制的范围变更，并破坏迭代承诺。 取消当前迭代是极端举措，对迭代早期的一个单一关切而言，很少有此必要。取消迭代应仅用于严重的、影响整个项目的问题。

单选题 170/180、A consumer electronics company is executing a project to produce a new line of smart home sensors. During quality reviews, the quality assurance department reports that additional testing and environmentally friendly packaging will increase upfront costs but reduce warranty claims and environmental impact. The operations manager argues against adding these steps in order to stay on budget. With the product launch approaching, the project manager is under pressure to resolve the issue quickly. What should the project manager do?
一家消费电子公司正在执行一个项目，以生产一条新的智能家居传感器产品线。在质量审查期间，质量保证部门报告称，增加测试和环保包装将提高前期成本，但会减少保修索赔并降低环

境影响。运营经理反对增加这些步骤，以保持在预算之内。随着产品发布临近，项目经理面临迅速解决问题的压力。项目经理应当怎么做?

A. Facilitate a resolution workshop between quality assurance and operations departments to reach consensus on the chosen path forward. 促成质量保证部门和运营部门之间的解决方案研讨会，以就所选的前进路径达成共识。

B. Evaluate the cost of quality and sustainability tradeoffs and request a corresponding change to the quality management plan if warranted. 评估质量成本与可持续性的权衡，并在必要时请求对质量管理计划进行相应的变更。

C. Prioritize the long-term benefits recommended by the quality assurance manager and evaluate changes to the project management plan. 优先考虑质量保证经理推荐的长期收益，并评估对项目管理计划的变更。

D. Add both the quality assurance and the operations recommendations to the project management plan to meet the launch deadline efficiently. 将质量保证部门和运营部门的建议都加入项目管理计划，以高效地赶上发布期限。

答案：B

解析：项目经理应首先分析质量成本和可持续性权衡，然后，如果合理，通过整体变更控制请求对质量管理计划进行变更。这一选项既体现了评估原则，也体现了计划更新的治理要求。其余选项均错误： 尽管促成和冲突解决是有效的工具，但项目经理在此处的职责不是调解直至达成共识，而是评估权衡并应用整体变更控制。这一选项听起来像是协作，但未能解决治理问题。 优先考虑质量保证经理的建议并评估项目管理计划的变更，偏向于这一观点。它跳过了平衡的评估，且未明确遵循变更控制来更新计划。 为应对紧迫性而将两项建议都加入项目管理计划，在紧迫情况下看似高效，但省略了必要的评估，且未明确遵循变更控制来更新计划。

单选题 171/180、A project manager decided to award additional work to the current contractor to reduce procurement time during a bidding process. The other bidders complained that the process lacked transparency and fairness. What should the project manager have done to prevent this?

一名项目经理决定在招标过程中将额外工作授予现任承包商，以减少采购时间。其他投标人抱怨该流程缺乏透明和公平。为防止这种情况，项目经理本应怎么做?

A. Invited all potential bidders to a pre-bid meeting to clarify requirements and evaluation criteria. 邀请所有潜在投标人参加标前会议，以澄清要求和评估标准。

B. Awarded the contract to the incumbent contractor after informal talks to speed up the process. 在非正式会谈后将合同授予现任承包商，以加快流程。

C. Followed the company’s formal bidding and procurement process procedures strictly. 严格遵守公司的正式招标和采购流程程序。

D. Provided detailed feedback to all unsuccessful bidders after the contract was awarded. 在合同授予后向所有未中标的投标人提供详细反馈。

答案：C

解析：遵循既定的招标和采购程序，可确保流程公平、透明且一致地开展。这能保证所有潜在投标人拥有平等的竞争机会，并确保合同授予基于客观的、预先定义的标准。遵守这些程序符合采购管理的标准实践，可促进公平、利益相关方信任和法律合规。 其余选项均错误： 邀请所有潜在投标人参加标前会议有助于澄清要求，但并不能取代遵循正式招标程序以实现公平和透明的需要。 在非正式会谈后授予合同绕过了正式流程，并可能引发偏袒和不公平优势的质疑。 在合同授予后提供反馈是促进透明的良好实践，但它并不能防止实际招标和授予过程中的不公平或投诉。

单选题 172/180、A project’s financial plan is being developed. The financial planner has requested relevant documentation to help align specific deliverables and work packages with estimated costs. What information should the project manager provide?
一个项目的财务计划正在制定中。财务规划师已请求相关文档，以帮助将具体的可交付成果和工作包与估算成本对齐。项目经理应提供哪些信息?

A. The work breakdown structure (WBS). 工作分解结构（WBS）。

B. The resource breakdown structure (RBS). 资源分解结构（RBS）。

C. The organizational breakdown structure (OBS). 组织分解结构（OBS）。

D. The value breakdown structure (VBS). 价值分解结构（VBS）。

答案：A

解析：WBS 通过将具体的可交付成果和工作包与其估算成本对齐，成为预算编制的基础。将项目分解为更小、可管理的单元，有助于项目经理和财务规划师将资金精确分配到各个组成部分、有效跟踪支出并识别成本驱动因素。它在整合范围、进度和成本基准时也很有帮助，可确保所有项目管理组成部分之间的清晰对齐。 其余选项均错误： 虽然额外的文档和信息可能有所帮助，但它们本身无法直接满足这一需求。 RBS 是按类别和类型对资源的层级表示。RBS 与 WBS 结合使用，以规划、监控和控制工作。 OBS 是项目组织的层级表示，说明了项目活动与将执行这些活动的组织单位之间的关系。 VBS 侧重于分解项目的价值，而不仅仅是其工作或可交付成果。它将利益相关方的价值期望分解为价值条目，以确保所有项目活动都与交付利益相关方定义的价值直接对齐。

单选题 173/180、An adaptative project team is globally distributed and the team members speak different primary languages. Daily meetings are conducted virtually in a common language. The project manager is made aware that there are some communication issues. Differences in pronunciation, accent, and vocabulary make it extremely difficult for some members to understand each other. What should the project manager do to improve the daily meeting and avoid misunderstanding?
一个适应性项目团队分布在全球各地，团队成员说着不同的母语。每日会议以一种通用语言在线举行。项目经理获悉存在一些沟通问题。发音、口音和词汇的差异使部分成员极难相互理解。为改进每日会议并避免误解，项目经理应当怎么做?

A. Use the call to verbally summarize the work status as reported by the team members. 在通话中口头总结团队成员汇报的工作状态。

B. Use an electronic task board to give a visual representation of work status and progress. 使用电子任务板，以可视化方式呈现工作状态和进展。

C. Ask for a change in the project's budget to provide access to a translation service. 请求变更项目预算，以便获得翻译服务。

D. Ask all team members to report on work completed, upcoming work, and blockers. 要求所有团队成员汇报已完成的工作、即将开展的工作和阻碍因素。

答案：B

解析：任务板等可视化工具可作为信息辐射器，通过提供清晰、易获取、可翻译的更新来帮助团队克服语言障碍，而不依赖口头表达的精准性。这与敏捷的协作、可见性和持续改进的价值观保持一致。 其余选项均错误： 在通话中总结工作状态会增加对口头沟通的依赖，而口头沟通已因口音和词汇差异而存在问题。 增加翻译服务提出了一个成本高昂且复杂的解决方案，与敏捷偏好轻量、低成本工具的取向相悖。 要求团队成员汇报并未解决根本问题——它没有调整方法以消除因语言挑战造成的沟通差距。

多选题 174/180、A multinational enterprise is bringing a new product to market. As the project nears completion, the project manager is notified of a disagreement among end users regarding the functionality of a specific product feature. The project manager must obtain stakeholder approval in order to close the project. Which should the project manager do? (Choose 2)
一家跨国企业正在将新产品推向市场。随着项目接近完成，项目经理得知最终用户对某一特定产品功能的功能性存在分歧。项目经理必须获得利益相关方批准才能收尾项目。项目经理应当怎么做？（选择 2 项）

A. Request approval to close the project and resolve the issue in the next product iteration. 请求批准收尾项目，并在下一个产品迭代中解决该问题。

B. Meet with the team lead to determine if any issues regarding product features were discovered during testing. 与团队负责人会面，确定在测试期间是否发现了任何与产品功能相关的问题。

C. Meet with project stakeholders to review the project's agreed-upon acceptance criteria. 与项目利益相关方会面，审查项目商定的验收标准。

D. Review the definition of done (DoD) that was agreed upon and documented at the beginning of the project. 审查在项目开始时商定并记录的完成的定义（DoD）。

E. Review the project scope to understand the acceptance criteria established at the beginning of the project. 审查项目范围，以了解项目开始时建立的验收标准。

答案：CD

解析：项目经理需要了解项目的验收标准和 DoD，并与利益相关方分享这些信息，以获得批准并收尾项目。验收标准将概述可交付成果被接受之前必须满足的一组条件，可用于确认可交付成果的完整性。DoD 是一份核对单，列明可交付成果被视为可供客户使用所需满足的所有标准。这将有助于确定项目是否满足 DoD 要求，以及是否有任何遗漏或不完整之处。 其余选项效果较差：项目经理不应收尾项目。他们应等到下一个产品迭代再解决任何问题。如果客户满意度不够高，产品可能无法上线，直到进一步返工。 与团队负责人会面讨论测试期间发现的产品功能问题是有帮助的，但它无助于获得利益相关方批准以收尾项目。 项目收尾前不是审查项目范围以了解验收标准的时候。这应在项目开始时和每个项目阶段期间完成。目标是验证产出符合标准并适合收尾，而不仅仅是理解标准。

多选题 175/180、A large engineering firm is planning a project that will be subject to strict government regulations. The work will take place in an environmentally sensitive area and relies on a labor force that is susceptible to strikes. The project manager is aware that these and other uncertainties could threaten the project’ s success. Which two actions should the project manager adopt? (Choose 2)
一家大型工程公司正在规划一个将受严格政府法规约束的项目。工作将在环境敏感区域进行，并依赖一支容易发生罢工的劳动力队伍。项目经理意识到这些和其他不确定性可能威胁项目的成功。项目经理应采取哪两项行动？（选择 2 项）

A. Develop a requirements traceability matrix to ensure compliance with regulations. 制定需求跟踪矩阵，以确保符合法规。

B. Perform a program evaluation and review technique (PERT) analysis to estimate the project schedule. 执行计划评审技术（PERT）分析，以估算项目进度计划。

C. Engage key stakeholders to identify potential risks and document their concerns. 让关键利益相关方参与识别潜在风险，并记录他们的担忧。

D. Conduct a structured risk identification process and record risks in the risk register. 进行结构化的风险识别流程，并将风险记录在风险登记册中。

E. Escalate labor-related risks to senior management for review and resolution before the project begins. 在项目开始前将劳动相关风险上报给高级管理层审查和解决。

答案：CD

解析：利益相关方（劳工团体、监管机构、环境机构）为风险识别提供关键见解。正式的风险识别并记录在风险登记册中，是项目管理协会的标准做法。 其余选项均错误： 需求跟踪矩阵是为了将需求与来源联系起来而创建的表格。它用于范围和需求对齐，而非风险管理。 PERT是一种进度分析技术，通过乐观、悲观和最可能的持续时间的加权平均值来估算项目持续时间。它不能全面识别风险。 需求跟踪矩阵用于范围和需求对齐，而非风险管理。 过早上报特定风险绕过了结构化的风险管理流程；必须对风险进行评估和规划，而非转嫁出去。

多选题 176/180、A national restaurant chain is facing competition from a new startup with franchise locations across multiple cities. Project stakeholders have assigned a project manager to address complex industry issues and eliminate obstacles that could hinder market share growth. Which two actions should the project manager adopt? (Choose 2)
一家全国性连锁餐厅正面临一家新创企业的竞争，该新创企业在多个城市设有加盟门店。项目利益相关方已指派一位项目经理来处理复杂的行业问题，并消除可能阻碍市场份额增长的障碍。项目经理应采取哪两项行动？（选择 2 项）

A. Meet with the project team to identify the new market pressures and modify the project management plan accordingly. 与项目团队会面，识别新的市场压力并相应修改项目管理计划。

B. Perform a combined qualitative and quantitative risk analysis to evaluate potential risks. 进行定性与定量相结合的联合风险分析，以评估潜在风险。

C. Identify and document all impediments, risks, and blockers, and review the list periodically. 识别并记录所有障碍、风险和阻碍因素，并定期审查该清单。

D. Plan workshops that encourage team collaboration and explore new ideas to optimize the customer experience. 规划鼓励团队协作并探索新想法的工作坊，以优化客户体验。

E. Conduct daily coordination meetings to review progress and address challenges as they arise. 举行每日协调会，审查进展并处理出现的问题。

答案：CE

解析：项目经理应定期识别和记录障碍，使其对团队保持可见。频繁的监控和协调会议能够实现及时干预，支持主动式风险管理，并防止小问题升级为重大干扰。 其余选项均错误： 虽然修改计划很重要，但它侧重于更新项目计划，而非主动应对眼前的市场压力。仅仅通过会面调整计划并不能确保关键问题得到及时解决。 进行风险分析不能直接解决眼前的项目问题。虽然评估风险对规划很有价值，但它无法缓解当前市场压力或障碍的影响。 规划协作会议不能直接解决眼前的市场压力或关键项目问题。工作坊鼓励协作和探索新想法，可以带来创新并改善整体客户体验，但它们不能确保对紧迫问题采取及时行动。

多选题 177/180、A project is at the stage of procurement negotiations, with agreements being worked out in preparation for signing a contract. A procurement team member who has the authority to sign contracts is leading the negotiations, but that team member needs support from the project manager. Which two actions should the project manager perform to support the negotiations? (Choose 2)
一个项目正处于采购谈判阶段，正在拟定协议以准备签署合同。一名拥有合同签署权限的采购团队成员正在主导谈判，但该成员需要项目经理的支持。项目经理应执行哪两项行动来支持谈判？ （选择 2 项）

A. Report potential disputes as soon as possible and then escalate them to higher management for resolution. 尽快报告潜在争议，然后上报高层管理人员解决。

B. Maintain detailed records of all project activities, changes, and communications to use as reference for potential claims. 维护所有项目活动、变更和沟通的详细记录，作为潜在索赔的参考依据。

C. Instruct the procurement team to limit communication with the contractor to minimize misunderstandings that might lead to legal disputes. 指示采购团队限制与承包商的沟通，以最大程度减少可能导致法律纠纷的误解。

D. Obtain enough basic legal training in contract law and claims management to understand contract terms and help handle disputes. 获得足够的合同法与索赔管理方面的基础法律培训，以理解合同条款并协助处理争议。

E. Streamline the contract negotiation process by delaying the legal team's involvement until contract signing. 简化合同谈判流程，将法律团队的介入推迟到合同签署时。

答案：BD

解析：维护所有项目活动、变更和沟通的详细记录作为潜在索赔的参考依据，是为潜在索赔提供证据的关键。通过学习合同法术语和索赔管理的基础知识，项目经理可以获得在争议升级之前协助解决争议所需的理解。 其余选项均错误： 立即将争议上报高层管理人员解决会干扰谈判，并可能损害成功的可能性。项目经理工作中的一个关键方面是尽早识别潜在冲突并及时处理，以防止其升级。 指示采购团队限制与承包商的沟通以防止误解是一个错误。项目经理应当促进所有利益相关方之间开放、清晰的沟通，以帮助减少误解。 采购团队的法律知识不足以处理合同谈判。与组织的法律团队建立牢固的工作关系以获得指导和支持至关重要。

多选题 178/180、A manufacturing company is designing a new user interface for its internal engineers. The project manager developed a requirements traceability matrix to monitor progress and ensure that all requirements are tracked and met. The CEO has informed the project manager that one of the original design elements must be changed, and the change must be approved by all stakeholders. Which two actions should the project manager take to update the requirements traceability matrix? (Refer to the table) (Choose 2)

一家制造公司正在为其内部工程师设计新的用户界面。项目经理制定了需求跟踪矩阵，用于监控进展并确保所有需求均被跟踪和满足。CEO 已告知项目经理，其中一个原始设计元素必须更改，且该变更必须获得所有利益相关方的批准。项目经理应采取哪两项行动来更新需求跟踪矩阵？（参考表格）（选择 2 项）

需求可追溯性矩阵（Requirements Traceability Matrix）						
项目名称	ABC 制造公司					
描述	新用户界面					
ID	**功能**	**需求**	**来源**	**负责人**	**状态**	**优先级**
RQ-001	A1	收集用户需求	工程师	业务分析师	已完成	高
	A2	梳理工作流程需求	工程师	业务分析师	已完成	中
	A3	明确设计元素	首席执行官/相关方	团队负责人	已完成	高
	A4	验证设计概念	团队负责人	设计师	未开始	中
RQ-002	B1	构建界面原型	开发团队	开发人员	进行中	高
	B2	与内部工具集成	开发团队	开发人员	未开始	高
	B3	开展可用性测试	质量保证（QA）团队	QA 负责人	未开始	中
RQ-003	C1	安全审查	安全团队	安全负责人	未开始	高
	C2	性能基准测试	项目经理	工程师	未开始	中
	C3	系统兼容性检查	项目经理	工程师	未开始	中
RQ-004	D1	部署准备	项目经理	DevOps 工程师	未开始	中
RQ-005	E1	部署后审查	项目经理	PMO（项目管理办公室）	未开始	低

A. Change the priority of the "Validate design concept" row to "Low". 将 "验证设计概念" 行的优先级更改为 "低"。

B. Change the status of the "Specify design elements" to "In Progress". 将 "明确设计元素" 的状态更改为 "进行中"。

C. Change the assigned individuals for the "Specify design elements" row to "Stakeholders". 将 "明确设计元素" 行的负责人更改为 "利益相关方"。

D. Change the status of the “Validate design concept” row to "In Progress". 将 "验证设计概念" 行的状态更改为 "进行中"。

E. Remove the "Specify design elements" row since the original requirement is completed. 删除 "明确设计元素" 行，因为原始需求已完成。

答案：BC

解析：CEO 要求更改其中一个原始设计元素，这表明即使该项此前已被标记为 "已完成"，也必须重新处理以纳入所需修改。将其进展准确反映为 "进行中"，可确保这一新的待批准活动在矩阵中得到适当跟踪。 由于 CEO 强调变更的批准必须涉及所有利益相关方，为满足该要求而分配的责任应与这一指示保持一致。将其从 "团队负责人" 更改为 "利益相关方"，与最新表明的参与方式相符。 其余选项均错误： 更改 "验证设计概念" 的 "优先级" 或 "状态" 部分与

CEO 的指示或设计元素变更无关，缺乏合理依据。 发生变更时，已完成的需求不应从需求跟踪矩阵中移除。需求跟踪矩阵（RTM）提供历史可追溯性，应予以更新以反映变更、批准和当前状态。删除该需求将消除原始需求及已批准变更的记录。

多选题 179/180、A project manager has previously led an unsuccessful project. The sponsor is preparing for a similar project and wants to turn that failure into an opportunity for planning, learning, and skill development. What should the project manager do? (Choose 2)
一名项目经理此前领导过一个失败的项目。发起人正准备开展一个类似项目，希望将该失败转化为规划、学习和技能发展的机会。项目经理应当怎么做？（选择 2 项）

A. Incorporate the lessons learned into risk management discussions to help identify and mitigate potential risks. 将经验教训纳入风险管理讨论中，以帮助识别和减轻潜在风险。

B. Conduct lessons learned sessions that focus on identifying what went wrong and who was responsible. 开展经验教训会议，侧重于识别出了什么问题以及谁应负责。

C. Share experiences and lessons learned from the failed project to help improve individual and team performance. 分享失败项目的经验和经验教训，以帮助改善个人和团队绩效。

D. Facilitate a lessons learned workshop at the end of the project and require all team members to attend. 在项目结束时组织一次经验教训研讨会，并要求所有团队成员参加。

E. Develop lessons learned documents that are generic enough to be actionable and applicable to future projects. 编写通用性足够强、可操作且适用于未来项目的经验教训文档。

答案：AC

解析：项目经理应利用以往的经验教训充实风险登记册并用于风险规划。此外，分享知识可提升团队能力，防止重蹈覆辙。 利用经验教训强化风险管理流程，不仅有助于防止未来项目发生类似失败，还能促进组织学习和持续改进。这种主动方法将过往经验作为案例研究，用于评估和应对风险。 分享失败的经验和经验教训可在团队内部建立透明度和信任，营造一种开放的文化，使错误被视为学习机会而非追责来源。通过公开分享经验教训，团队成员可以识别技

能差距、调整策略并共同改进。 其余选项均错误： 开展侧重于识别出了什么问题以及谁应负责的经验教训会议是追责导向的。经验教训应关注流程而非追责。 虽然组织经验教训研讨会是一种有效做法，但本题的重点是研究上一个失败项目的经验教训以指导未来改进，而非简单地在项目结束时召开一次程序性会议。 编写通用性的经验教训文档缺乏识别项目失败具体原因所需的针对性。有效的经验教训应清晰、聚焦且相关，并附有量身定制的可操作见解，以防止在类似情形下再次发生。

多选题 180/180、During the development phase of a multinational company’ s new product, there is a change in administration in a country that supplies resources essential to the project. The project sponsor asks the project manager to identify how this event might affect product development. What should the project manager do? (Choose 2)
在一家跨国公司新产品的开发阶段，一个为项目供应关键资源的国家发生政府更迭。项目发起人要求项目经理识别这一事件可能对产品开发产生的影响。项目经理应当怎么做？（选择 2 项）

A. Monitor changes to the country's regulations, laws, and market conditions to anticipate potential impacts to the project. 监控该国的法规、法律和市场状况变化，以预判对项目的潜在影响。

B. Prepare a report to management showing the probability that project completion might be unaffected. 向管理层编制一份报告，说明项目完工可能不受影响的概率。

C. Revise the schedule with a later delivery date to accommodate the changes in workflows that will likely be required. 修订进度计划，将交付日期延后，以适应可能需要的工作流程变更。

D. Document the risk of the administration change, escalate the issue, and update the risk management plan. 记录政府更迭的风险，上报该问题，并更新风险管理计划。

E. Perform an impact analysis, develop a response strategy, and update the project management plan. 进行影响分析，制定应对策略，并更新项目管理计划。

答案：AE

解析：在跨国公司中，组织治理受到其运营所在国的法律、商业法规、行业标准和政策的影响。在管理一个经历行政或立法变更的项目时，必须考虑这些制约因素。项目经理还必须进行风险影响分析，以制定有效的应对策略，并将这些变更反映到项目管理计划中。 其余选项均错误：向高层管理者提供状态报告是恰当的一步，但若缺乏最新信息，该报告可能毫无用处。这一工作应在对变更后情况的影响有清晰认识之后进行。 修订进度计划并计划延后交付日期可能确有必要，但在所有因素明确之前，无法稳妥地做出这一决定。它不应作为第一步，因为修订所依据的假设条件可能是错误的。 政府更迭已经发生，不再被视为风险。如有必要，上报问题和更新风险管理计划是重要步骤。但是，更新后风险评估的准确性将依赖于从监控和评估外部环境变化中获得的洞察，因此这属于后续步骤。
